



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

PRESENTACION OFERTA TECNICA

REFERENCIA: JCE-CCC-CP-2025-0002

Cronograma



Constructora
SERCONSA






Constructora
SERCONSA

RNC 101-826344

PROCESO ICE-CCC- 2025-0002

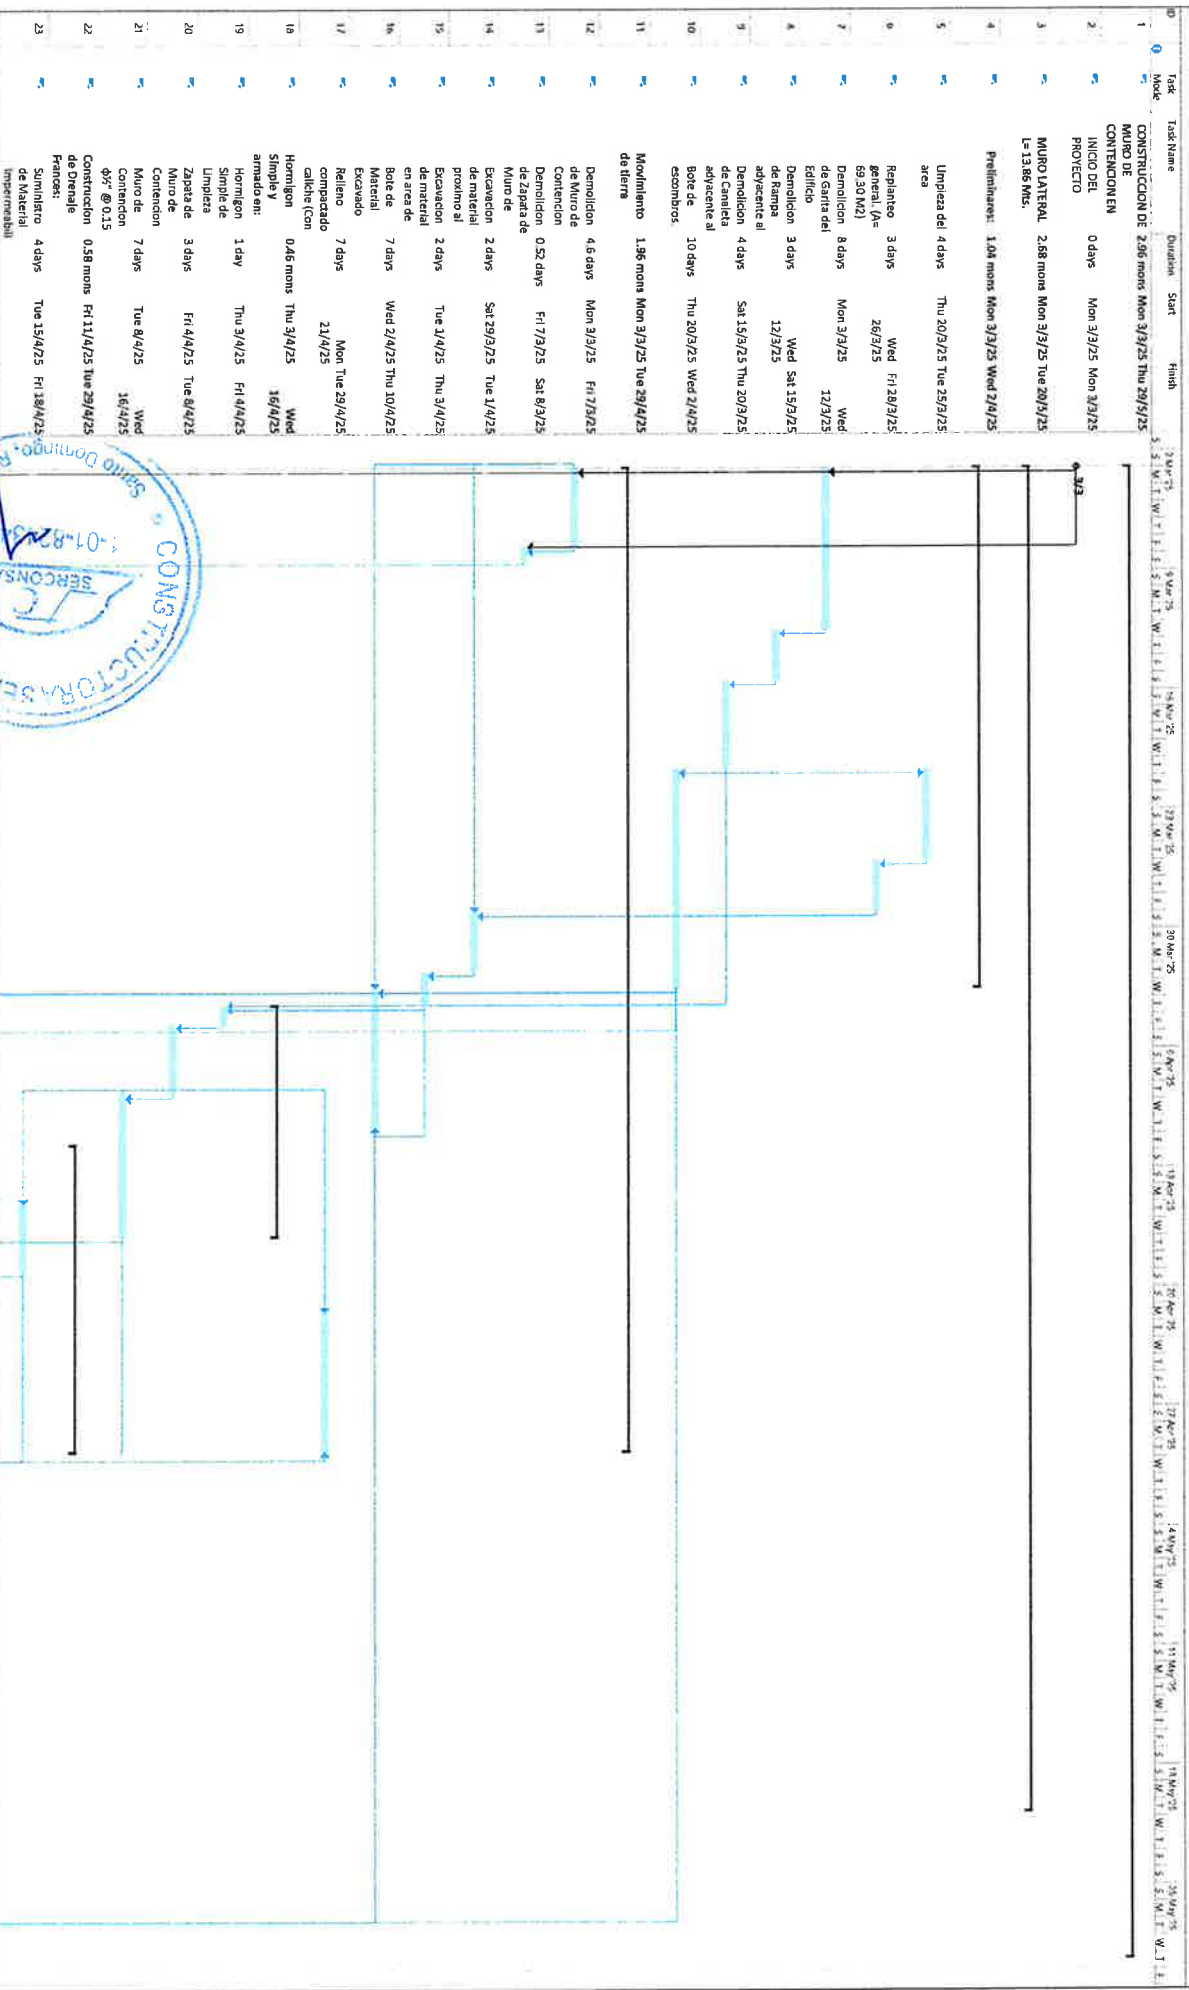




Construtora
SERCONSA

RNC 101-824344

PROCESO JCE-CCC-C. 2025-0002

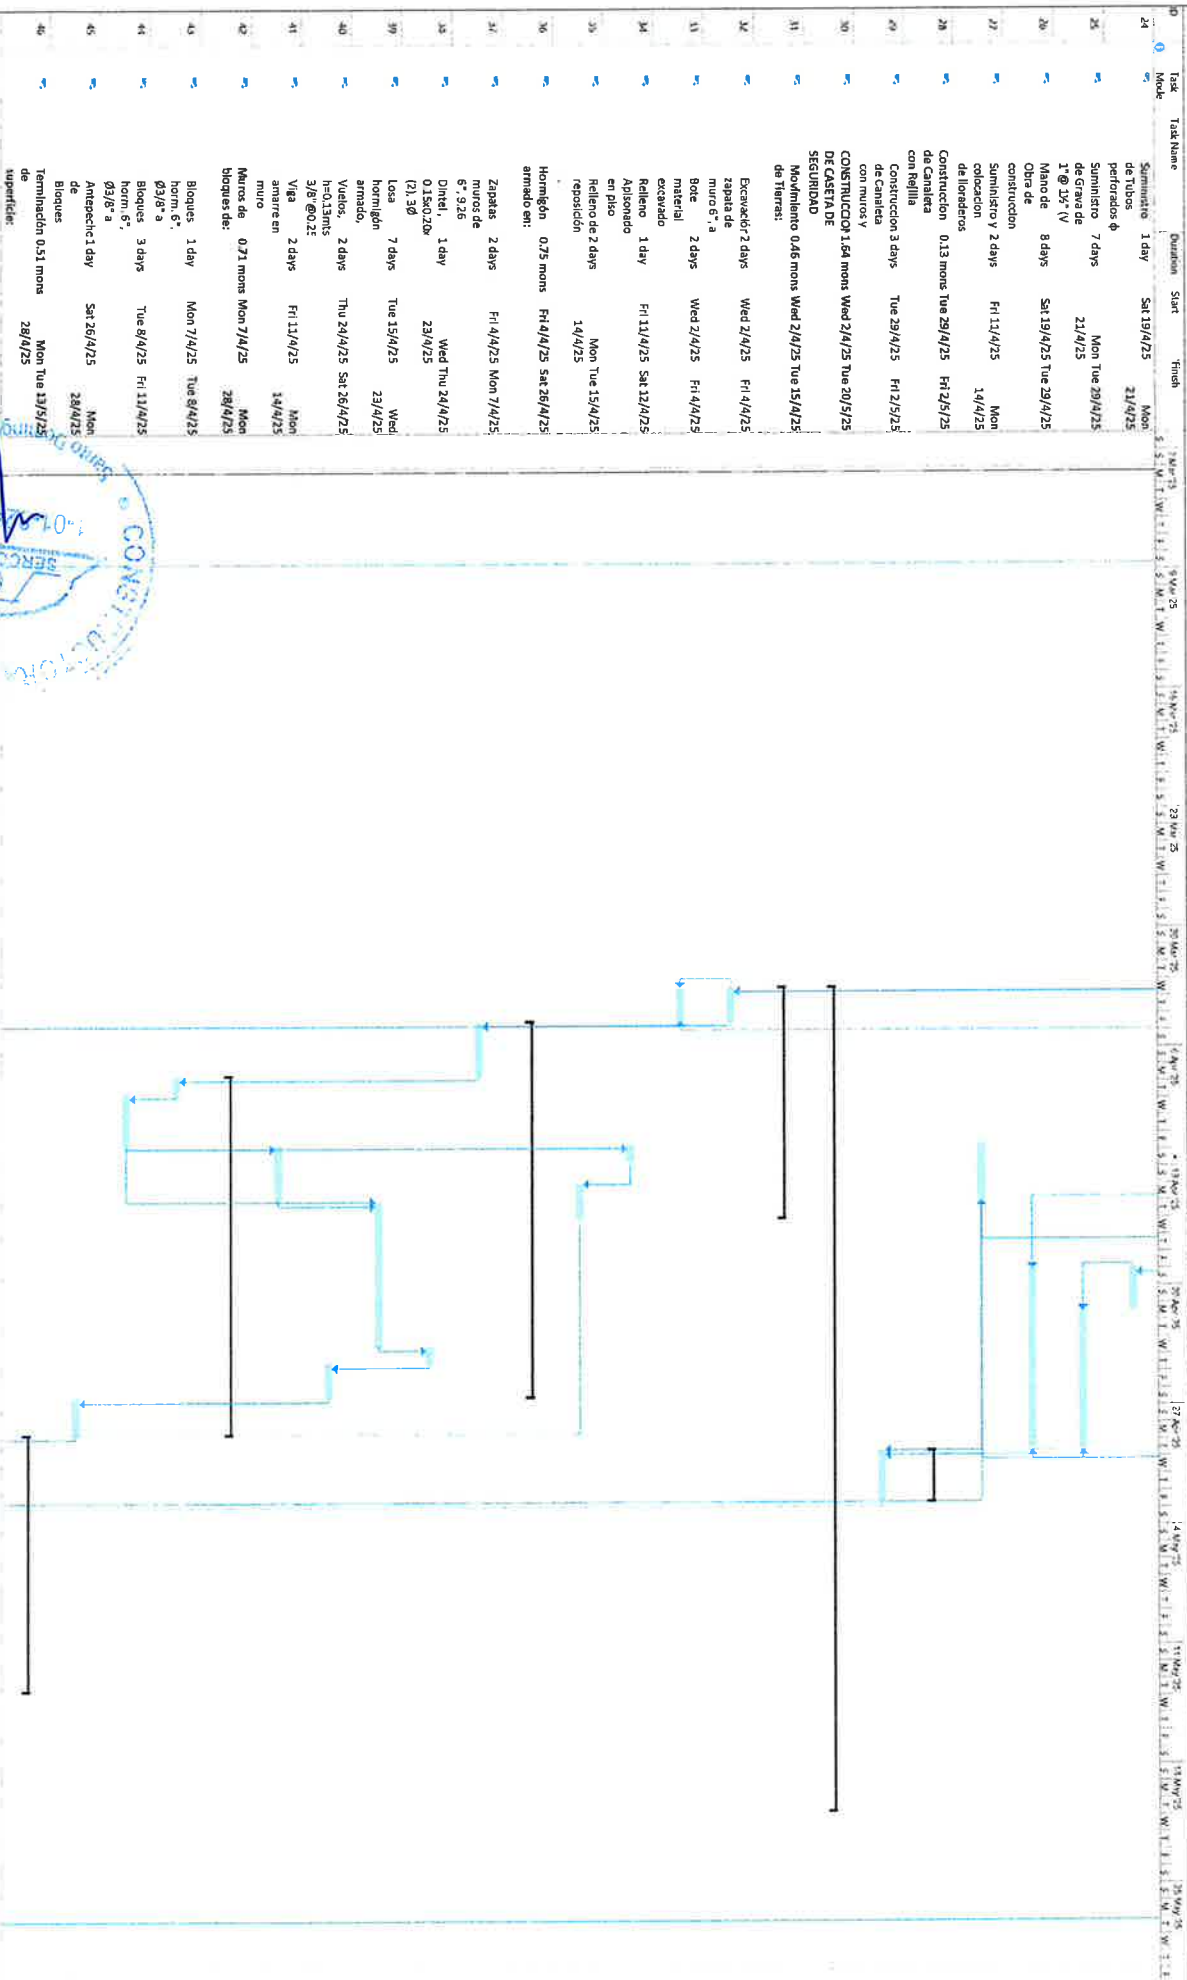




Constructora
SERCONSA

RNC 101-82454-8

PROCESO JCE-CCC-C-2025-0002

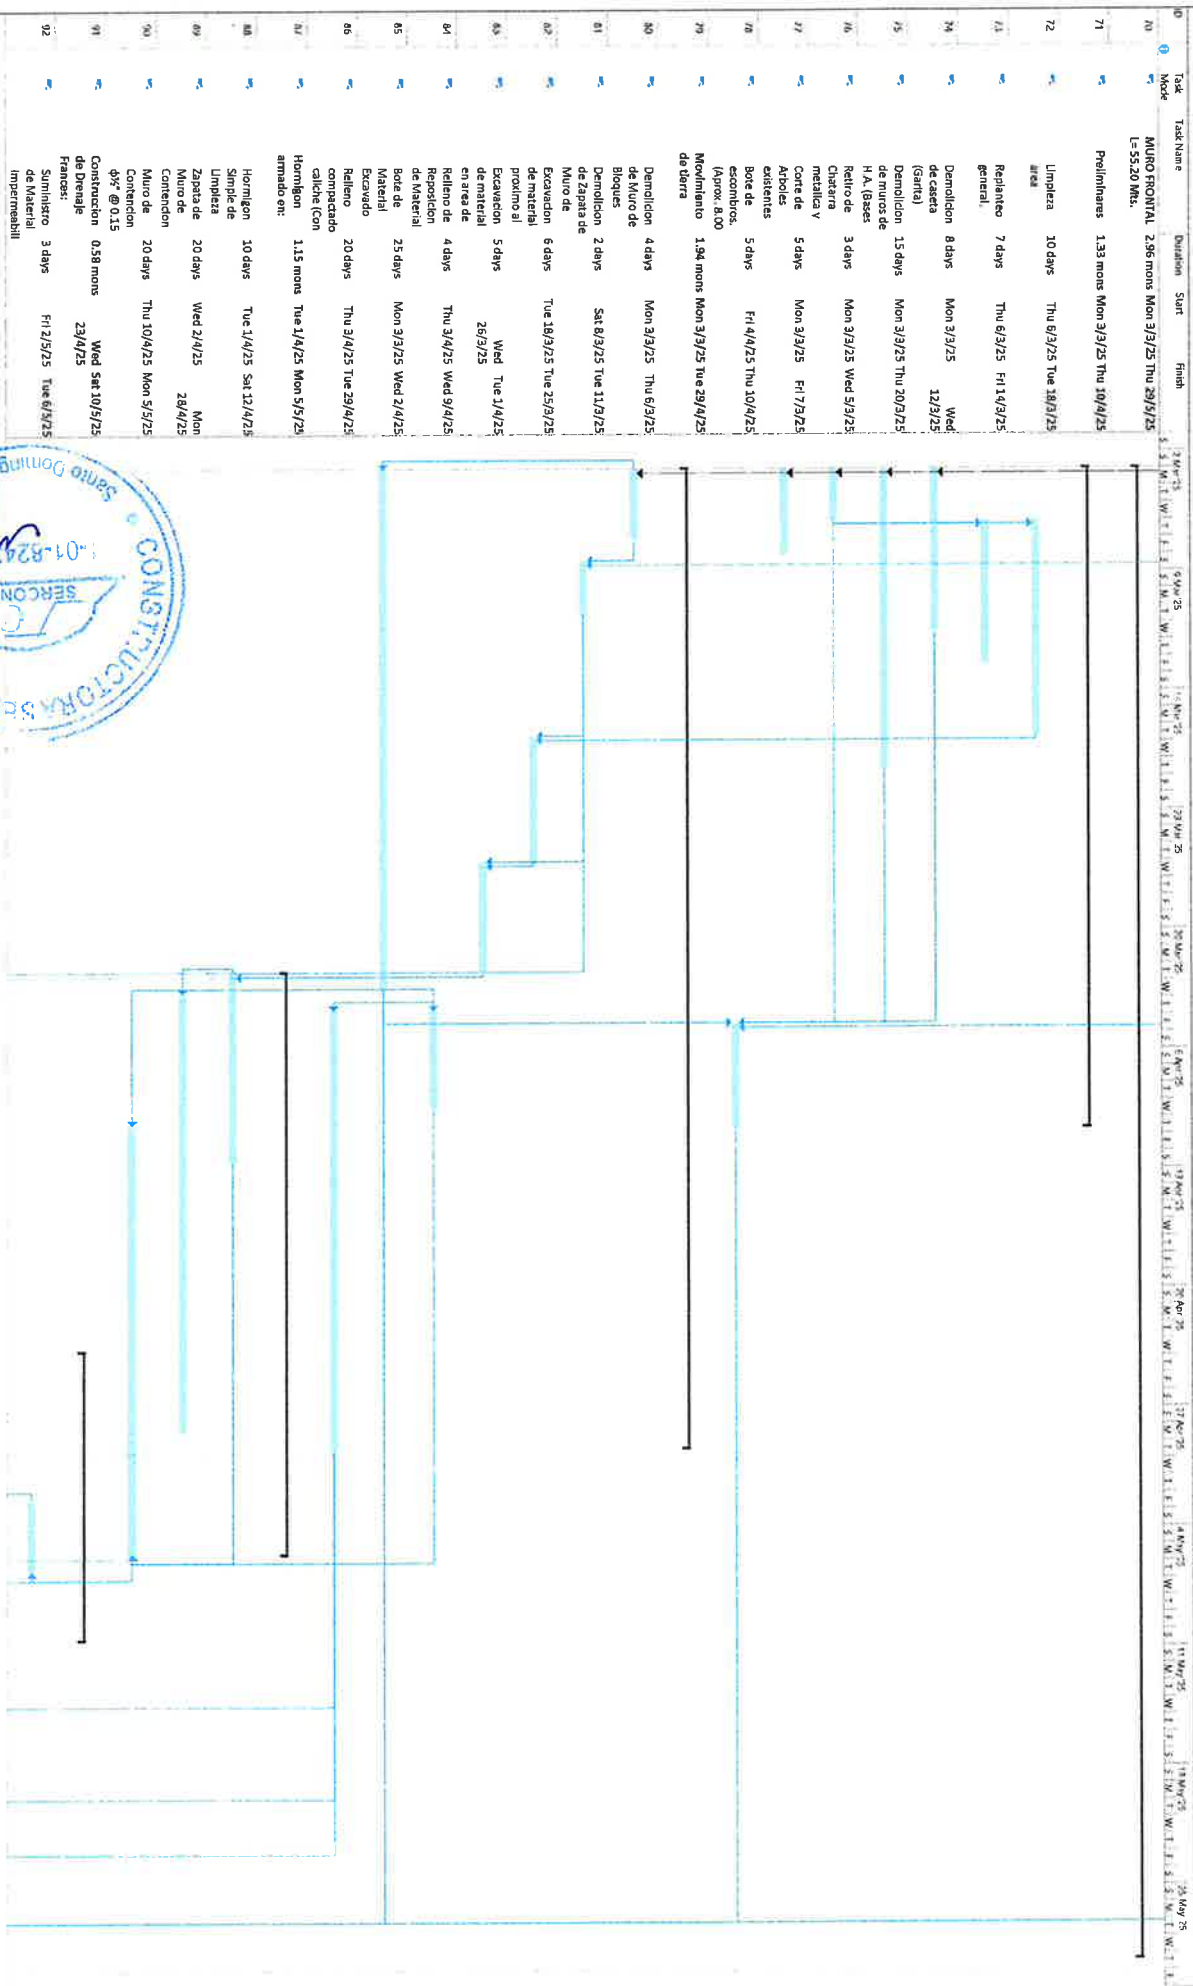

Nº	Actividad	Duración	Inicio	Fin
94	de Tubos perforados Ø	4 days	Mon 5/5/25	Fri 9/5/25
95	Suministro de Grana de 1" @ 15' IV	7 days	Fri 2/5/25	Sat 10/5/25
96	Obra de construcción	2 days	Wed 23/4/25	Fri 25/4/25
97	Suministro y colocación de lloseteros	1.96 mons	Tue 1/4/25	Thu 29/5/25
98	Adaptado del área de intervención	6 days	Tue 13/5/25	Tue 20/5/25
99	Demolicion de Acera	7 days	Tue 1/4/25	Wed 9/4/25
100	Frontal con construcción	1 day	Tue 13/5/25	Wed 14/5/25
101	Acera	4 days	Wed 9/4/25	Mon 14/4/25
102	Demolicion en area	3.99 days	Tue 29/4/25	Sat 3/5/25
103	Nuevos en Construcción de Contenidos	7.56 days	Sat 3/5/25	Tue 13/5/25
104	Nuevos en Diseño de Letra ICE en Veja Frontal	5 days	Tue 20/5/25	Tue 27/5/25
105	Construcción de area verde con Pintura Base Blanco 00 Popular	1 day	Tue 27/5/25	Wed 28/5/25
106	Pintura Acrylica exterior	1 day	Wed 28/5/25	Wed 29/5/25
107	ESTRUCTURAS METALICAS Y OTROS	0.63 mons	Tue 29/4/25	Fri 16/5/25
108	Construcción de Fitorion de Entrada	15 days	Tue 29/4/25	Fri 16/5/25
109	Verja metálica sobre muros	10 days	Tue 29/4/25	Sat 10/5/25
110	Reeducción y terminación	4 days	Tue 29/4/25	Sat 3/5/25
111	Iluminación y Salidas de Alimentación	1.29 mons	Tue 15/4/25	Thu 22/5/25
112	Suministro de Lámpara Led de Calle	3.5 days	Mon 19/5/25	Mon 22/5/25
113	Canalización de Salidas de Alimentación	7 days	Tue 15/4/25	Wed 23/4/25
114	Suministro e instalación de Tapon de	1 day	Tue 22/4/25	Wed 23/4/25





ID	Task Name	Duration	Start	Finish	3-Min	6-Min	9-Min	12-Min	15-Min	18-Min	21-Min	24-Min	27-Min	30-Min	33-Min	36-Min	39-Min	42-Min	45-Min	48-Min	51-Min	54-Min	57-Min	60-Min	63-Min	66-Min	69-Min	72-Min	75-Min	78-Min	81-Min	84-Min	87-Min	90-Min	93-Min	96-Min	99-Min	102-Min	105-Min	108-Min	111-Min	114-Min	117-Min	120-Min	123-Min	126-Min	129-Min	132-Min	135-Min	138-Min	141-Min	144-Min	147-Min	150-Min	153-Min	156-Min	159-Min	162-Min	165-Min	168-Min	171-Min	174-Min	177-Min	180-Min	183-Min	186-Min	189-Min	192-Min	195-Min	198-Min	201-Min	204-Min	207-Min	210-Min	213-Min	216-Min	219-Min	222-Min	225-Min	228-Min	231-Min	234-Min	237-Min	240-Min	243-Min	246-Min	249-Min	252-Min	255-Min	258-Min	261-Min	264-Min	267-Min	270-Min	273-Min	276-Min	279-Min	282-Min	285-Min	288-Min	291-Min	294-Min	297-Min	300-Min	303-Min	306-Min	309-Min	312-Min	315-Min	318-Min	321-Min	324-Min	327-Min	330-Min	333-Min	336-Min	339-Min	342-Min	345-Min	348-Min	351-Min	354-Min	357-Min	360-Min	363-Min	366-Min	369-Min	372-Min	375-Min	378-Min	381-Min	384-Min	387-Min	390-Min	393-Min	396-Min	399-Min	402-Min	405-Min	408-Min	411-Min	414-Min	417-Min	420-Min	423-Min	426-Min	429-Min	432-Min	435-Min	438-Min	441-Min	444-Min	447-Min	450-Min	453-Min	456-Min	459-Min	462-Min	465-Min	468-Min	471-Min	474-Min	477-Min	480-Min	483-Min	486-Min	489-Min	492-Min	495-Min	498-Min	501-Min	504-Min	507-Min	510-Min	513-Min	516-Min	519-Min	522-Min	525-Min	528-Min	531-Min	534-Min	537-Min	540-Min	543-Min	546-Min	549-Min	552-Min	555-Min	558-Min	561-Min	564-Min	567-Min	570-Min	573-Min	576-Min	579-Min	582-Min	585-Min	588-Min	591-Min	594-Min	597-Min	600-Min	603-Min	606-Min	609-Min	612-Min	615-Min	618-Min	621-Min	624-Min	627-Min	630-Min	633-Min	636-Min	639-Min	642-Min	645-Min	648-Min	651-Min	654-Min	657-Min	660-Min	663-Min	666-Min	669-Min	672-Min	675-Min	678-Min	681-Min	684-Min	687-Min	690-Min	693-Min	696-Min	699-Min	702-Min	705-Min	708-Min	711-Min	714-Min	717-Min	720-Min	723-Min	726-Min	729-Min	732-Min	735-Min	738-Min	741-Min	744-Min	747-Min	750-Min	753-Min	756-Min	759-Min	762-Min	765-Min	768-Min	771-Min	774-Min	777-Min	780-Min	783-Min	786-Min	789-Min	792-Min	795-Min	798-Min	801-Min	804-Min	807-Min	810-Min	813-Min	816-Min	819-Min	822-Min	825-Min	828-Min	831-Min	834-Min	837-Min	840-Min	843-Min	846-Min	849-Min	852-Min	855-Min	858-Min	861-Min	864-Min	867-Min	870-Min	873-Min	876-Min	879-Min	882-Min	885-Min	888-Min	891-Min	894-Min	897-Min	900-Min	903-Min	906-Min	909-Min	912-Min	915-Min	918-Min	921-Min	924-Min	927-Min	930-Min	933-Min	936-Min	939-Min	942-Min	945-Min	948-Min	951-Min	954-Min	957-Min	960-Min	963-Min	966-Min	969-Min	972-Min	975-Min	978-Min	981-Min	984-Min	987-Min	990-Min	993-Min	996-Min	999-Min	1002-Min	1005-Min	1008-Min	1011-Min	1014-Min	1017-Min	1020-Min	1023-Min	1026-Min	1029-Min	1032-Min	1035-Min	1038-Min	1041-Min	1044-Min	1047-Min	1050-Min	1053-Min	1056-Min	1059-Min	1062-Min	1065-Min	1068-Min	1071-Min	1074-Min	1077-Min	1080-Min	1083-Min	1086-Min	1089-Min	1092-Min	1095-Min	1098-Min	1101-Min	1104-Min	1107-Min	1110-Min	1113-Min	1116-Min	1119-Min	1122-Min	1125-Min	1128-Min	1131-Min	1134-Min	1137-Min	1140-Min	1143-Min	1146-Min	1149-Min	1152-Min	1155-Min	1158-Min	1161-Min	1164-Min	1167-Min	1170-Min	1173-Min	1176-Min	1179-Min	1182-Min	1185-Min	1188-Min	1191-Min	1194-Min	1197-Min	1200-Min	1203-Min	1206-Min	1209-Min	1212-Min	1215-Min	1218-Min	1221-Min	1224-Min	1227-Min	1230-Min	1233-Min	1236-Min	1239-Min	1242-Min	1245-Min	1248-Min	1251-Min	1254-Min	1257-Min	1260-Min	1263-Min	1266-Min	1269-Min	1272-Min	1275-Min	1278-Min	1281-Min	1284-Min	1287-Min	1290-Min	1293-Min	1296-Min	1299-Min	1302-Min	1305-Min	1308-Min	1311-Min	1314-Min	1317-Min	1320-Min	1323-Min	1326-Min	1329-Min	1332-Min	1335-Min	1338-Min	1341-Min	1344-Min	1347-Min	1350-Min	1353-Min	1356-Min	1359-Min	1362-Min	1365-Min	1368-Min	1371-Min	1374-Min	1377-Min	1380-Min	1383-Min	1386-Min	1389-Min	1392-Min	1395-Min	1398-Min	1401-Min	1404-Min	1407-Min	1410-Min	1413-Min	1416-Min	1419-Min	1422-Min	1425-Min	1428-Min	1431-Min	1434-Min	1437-Min	1440-Min	1443-Min	1446-Min	1449-Min	1452-Min	1455-Min	1458-Min	1461-Min	1464-Min	1467-Min	1470-Min	1473-Min	1476-Min	1479-Min	1482-Min	1485-Min	1488-Min	1491-Min	1494-Min	1497-Min	1500-Min	1503-Min	1506-Min	1509-Min	1512-Min	1515-Min	1518-Min	1521-Min	1524-Min	1527-Min	1530-Min	1533-Min	1536-Min	1539-Min	1542-Min	1545-Min	1548-Min	1551-Min	1554-Min	1557-Min	1560-Min	1563-Min	1566-Min	1569-Min	1572-Min	1575-Min	1578-Min	1581-Min	1584-Min	1587-Min	1590-Min	1593-Min	1596-Min	1599-Min	1602-Min	1605-Min	1608-Min	1611-Min	1614-Min	1617-Min	1620-Min	1623-Min	1626-Min	1629-Min	1632-Min	1635-Min	1638-Min	1641-Min	1644-Min	1647-Min	1650-Min	1653-Min	1656-Min	1659-Min	1662-Min	1665-Min	1668-Min	1671-Min	1674-Min	1677-Min	1680-Min	1683-Min	1686-Min	1689-Min	1692-Min	1695-Min	1698-Min	1701-Min	1704-Min	1707-Min	1710-Min	1713-Min	1716-Min	1719-Min	1722-Min	1725-Min	1728-Min	1731-Min	1734-Min	1737-Min	1740-Min	1743-Min	1746-Min	1749-Min	1752-Min	1755-Min	1758-Min	1761-Min	1764-Min	1767-Min	1770-Min	1773-Min	1776-Min	1779-Min	1782-Min	1785-Min	1788-Min	1791-Min	1794-Min	1797-Min	1800-Min	1803-Min	1806-Min	1809-Min	1812-Min	1815-Min	1818-Min	1821-Min	1824-Min	1827-Min	1830-Min	1833-Min	1836-Min	1839-Min	1842-Min	1845-Min	1848-Min	1851-Min	1854-Min	1857-Min	1860-Min	1863-Min	1866-Min	1869-Min	1872-Min	1875-Min	1878-Min	1881-Min	1884-Min	1887-Min	1890-Min	1893-Min	1896-Min	1899-Min	1902-Min	1905-Min	1908-Min	1911-Min	1914-Min	1917-Min	1920-Min	1923-Min	1926-Min	1929-Min	1932-Min	1935-Min	1938-Min	1941-Min	1944-Min	1947-Min	1950-Min	1953-Min	1956-Min	1959-Min	1962-Min	1965-Min	1968-Min	1971-Min	1974-Min	1977-Min	1980-Min	1983-Min	1986-Min	1989-Min	1992-Min	1995-Min	1998-Min	2001-Min	2004-Min	2007-Min	2010-Min	2013-Min	2016-Min	2019-Min	2022-Min	2025-Min	2028-Min	2031-Min	2034-Min	2037-Min	2040-Min	2043-Min	2046-Min	2049-Min	2052-Min	2055-Min	2058-Min	2061-Min	2064-Min	2067-Min	2070-Min	2073-Min	2076-Min	2079-Min	2082-Min	2085-Min	2088-Min	2091-Min	2094-Min	2097-Min	2100-Min	2103-Min	2106-Min	2109-Min	2112-Min	2115-Min	2118-Min	2121-Min	2124-Min	2127-Min	2130-Min	2133-Min	2136-Min	2139-Min	2142-Min	2145-Min	2148-Min	2151-Min	2154-Min	2157-Min	2160-Min	2163-Min	2166-Min	2169-Min	2172-Min	2175-Min	2178-Min	2181-Min	2184-Min	2187-Min	2190-Min	2193-Min	2196-Min	2199-Min	2202-Min	2205-Min	2208-Min	2211-Min	2214-Min	2217-Min	2220-Min	2223-Min	2226-Min	2229-Min	2232-Min	2235-Min	2238-Min	2241-Min	2244-Min	2247-Min	2250-Min	2253-Min	2256-Min	2259-Min	2262-Min	2265-Min	2268-Min	2271-Min	2274-Min	2277-Min	2280-Min	2283-Min	2286-Min	2289-Min	2292-Min	2295-Min	2298-Min	2301-Min	2304-Min	2307-Min	2310-Min	2313-Min	2316-Min	2319-Min	2322-Min	2325-Min	2328-Min	2331-Min	2334-Min	2337-Min	2340-Min	2343-Min	2346-Min	2349-Min	2352-Min	2355-Min	2358-Min	2361-Min	2364-Min	2367-Min	2370-Min	2373-Min	2376-Min	2379-Min	2382-Min	2385-Min	2388-Min	2391-Min	2394-Min	2397-Min	2400-Min	2403-Min	2406-Min	2409-Min	2412-Min	2415-Min	2418-Min	2421-Min	2424-Min	2427-Min	2430-Min	2433-Min	2436-Min	2439-Min	2442-Min	2445-Min	2448-Min	2451-Min	2454-Min	2457-Min	2460-Min	2463-Min	2466-Min	2469-Min	2472-Min	2475-Min	2478-Min	2481-Min	2484-Min	2487-Min	2490-Min	2493-Min	2496-Min	2499-Min	2502-Min	2505-Min	2508-Min	2511-Min	2514-Min	2517-Min	2520-Min	2523-Min	2526-Min	2529-Min	2532-Min	2535-Min	2538-Min	2541-Min	2544-Min	2547-Min	2550-Min	2553-Min	2556-Min	2559-Min	2562-Min	2565-Min	2568-Min	2571-Min	2574-Min	2577-Min	2580-Min	2583-Min	2586-Min	2589-Min	2592-Min	2595-Min	2598-Min	2601-Min	2604-Min	2607-Min	2610-Min	2613-Min	2616-Min	2619-Min	2622-Min	2625-Min	2628-Min	2631-Min	2634-Min	2637-Min	2640-Min	2643-Min	2646-Min	2649-Min	2652-Min	2655-Min	2658-Min	2661-Min	2664-Min	2667-Min	2670-Min	2673-Min	2676-Min	2679-Min	2682-Min	2685-Min	2688-Min	2691-Min	2694-Min	2697-Min	2700-Min	2703-Min	2706-Min	2709-Min	2712-Min	2715-Min	2718-Min	2721-Min	2724-Min	2727-Min	2730-Min	2733-Min	2736-Min	2739-Min	2742-Min	2745-Min	2748-Min	2751-Min	2754-Min	2757-Min	2760-Min	2763-Min	2766-Min	2769-Min	2772-Min	2775-Min	2778-Min	2781-Min	2784-Min	2787-Min	2790-Min	2793-Min	2796-Min	2799-Min	2802-Min	2805-Min	2808-Min	2811-Min	2814-Min	2817-Min	2820-Min	2823-Min	2826-Min	2829-Min	2832-Min	2835-Min	2838-Min	2841-Min	2844-Min	2847-Min	2850-Min	2853-Min	2856-Min	2859-Min	2862-Min	2865-Min	2868-Min	2871-Min	2874-Min	2877-Min	2880-Min	2883-Min	2886-Min	2889-Min	2892-Min	2895-Min	2898-Min	2901-Min	2904-Min	2907-Min	2910-Min	2913-Min	2916-Min	2919-Min	2922-Min	2925-Min	2928-Min	2931-Min	2934-Min	2937-Min	2940-Min	2943-Min	2946-Min	2949-Min	2952-Min	2955-Min	2958-Min	2961-Min	2964-Min	2967-Min	2970-Min	2973-Min	2976-Min	2979-Min	2982-Min	2985-Min	2988-Min	2991-Min	2994-Min	2997-Min	3000-Min
----	-----------	----------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

27/5



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
	Unassigned	3/3/2025	27/5/2025	0 hrs Work					
	INICIO DEL PROYECTO	3/3/2025	3/3/2025	0 hrs Work					
	FIN DEL PROYECTO	27/5/2025	27/5/2025	0 hrs Work					
1	COMPRESOR (DOS PISTOLAS)	3/3/2025	14/4/2025	406.08 hrs Work		304.08h	102h		
	Demolicion de Rampa adyacente al Muro	12/3/2025	15/3/2025	27 hrs Work		27h			
	Demolicion de Canaleta adyacente al Muro	15/3/2025	20/3/2025	36 hrs Work		36h			
	Demolicion de Muro de Contencion existente Con 3/3/2025	7/3/2025	7/3/2025	41.4 hrs Work		41.4h			
	Compresor								
	Demolicion de Zapata de Muro de Contencion	7/3/2025	8/3/2025	4.68 hrs Work		4.68h			
	existente con Compresor								
	Demolicion de muros de H.A. (Bases de Tanques	3/3/2025	20/3/2025	135 hrs Work		135h			
	de Combustible) existente								
	Demolicion de Zapata de Muro de Contencion	8/3/2025	11/3/2025	18 hrs Work		18h			
	existente con Equipo								
	Excavacion de material en area de zapata del	26/3/2025	1/4/2025	45 hrs Work		42h	3h		
	muro. (Con Equipo)								
	Demolicion de Acera Frontal con Malla	1/4/2025	9/4/2025	63 hrs Work		63h			
	Electrosoldada V= 59.91 x 2.30 x 0.12)M3								
	Demolicion de Contenes en area frontal L= 59.91	9/4/2025	14/4/2025	36 hrs Work		36h			
	M1								
2	OPERADOR	3/3/2025	22/5/2025	1,828.08 hrs Work		565.08h	1,038h	225h	
	Limpieza del area	20/3/2025	25/3/2025	36 hrs Work		36h			
	Demolicion de Rampa adyacente al Muro	12/3/2025	15/3/2025	27 hrs Work		27h			
	Demolicion de Canaleta adyacente al Muro	15/3/2025	20/3/2025	36 hrs Work		36h			
	Demolicion de Muro de Contencion existente Con 3/3/2025	7/3/2025	7/3/2025	41.4 hrs Work		41.4h			
	Compresor								
	Demolicion de Zapata de Muro de Contencion	7/3/2025	8/3/2025	4.68 hrs Work		4.68h			
	existente con Compresor								
	Excavacion de material proximo al muro. (Con	29/3/2025	1/4/2025	18 hrs Work		15h	3h		
	Equipo)								



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
	Excavacion de material en area de zapata del muro. (Con Equipo)	1/4/2025	3/4/2025	18 hrs\Work			18h		
	Relleno compactado caliche (Con Equipo) (Factor de Comp. = 1.30)	21/4/2025	29/4/2025	189 hrs\Work			189h		
	Suministro de Grava de 1" @ 1½" (V = 0.30 mts. X 21/4/2025 5.00 mts. X 43.27) + 15% de desp.		29/4/2025	63 hrs\Work			63h		
	Relleno Apisonado en piso (MACO). (Caliche)	11/4/2025	12/4/2025	9 hrs\Work			9h		
	Relleno de reposición .	14/4/2025	15/4/2025	18 hrs\Work			18h		
	Asfaltado del area de Intervencion para la Construcion del Muro E= 2" (Ver Planos)	8/5/2025	8/5/2025	18 hrs\Work				18h	
	Limpieza area	6/3/2025	18/3/2025	90 hrs\Work			90h		
	Demolicion de muros de H.A. (Bases de Tanques de Combustible) existente	3/3/2025	20/3/2025	135 hrs\Work			135h		
	Retiro de Chatarra metalica y Tanques de Combustibles de muros de H.A. existente	3/3/2025	5/3/2025	27 hrs\Work			27h		
	Demolicion de Muro de Bloques existente Con Equipo	3/3/2025	6/3/2025	36 hrs\Work			36h		
	Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente con Equipo	8/3/2025	11/3/2025	18 hrs\Work			18h		
	Excavacion de material proximo al muro. (Con Equipo)	18/3/2025	25/3/2025	54 hrs\Work			54h		
	Excavacion de material en area de zapata del muro. (Con Equipo)	26/3/2025	28/3/2025	45 hrs\Work			45h		
	Relleno de Reposicion de Material Excavado.	3/4/2025	9/4/2025	36 hrs\Work			36h		
	Relleno compactado caliche (Con Equipo) (Factor de Comp. = 1.30)	3/4/2025	22/4/2025	540 hrs\Work			540h		
	Suministro de Grava de 1" @ 1½" (V = 0.30 mts. X 5/5/2025 5.00 mts. X 55.20) + 15% de desp.		9/5/2025	36 hrs\Work				36h	



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVES LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
	Asfaltado del area de Intervencion para la Construcción del Muro y Area de Acceso Frontal E= 2" (ver planos)	13/5/2025	20/5/2025	108 hrs Work					108h
	Demolicion de Acera Frontal con Malla Electrosoldada V= 59.91 x 2.30 x 0.12)M3	1/4/2025	9/4/2025	126 hrs Work					126h
	Demolicion de Contenes en area frontal L= 59.91 9/4/2025		14/4/2025	36 hrs Work					36h
	MI								
	Alquiler por Dia de Grua Con Canasto para Instalacion de Lampara Led de Calle	14/5/2025	22/5/2025	63 hrs Work					63h
3	OBREROS								
	Demolicion de Garita del Edificio adyacente	3/3/2025	29/5/2025	5,868.81 hrs Work					1,338h 3,079.5h 1,451.3...
	Bote de escombros.	3/3/2025	12/3/2025	288 hrs Work					288h
	Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	20/3/2025	2/4/2025	180 hrs Work					156h 24h
	Relleno compactado caliche (Con Equipo) (Factor de Comp. = 1.30)	2/4/2025	10/4/2025	126 hrs Work					126h
	Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata.	21/4/2025	29/4/2025	252 hrs Work					252h
	Zapata de Muro de Contencion $\phi\frac{3}{4}$ " @ 0.15 A.D. cara inferior y $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 A.D. En cara superior.	3/4/2025	4/4/2025	9 hrs Work					9h
	Muro de Contencion $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 A.D. En cara izquierda y de $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 long. Y $\phi\frac{3}{4}$ " @ 0.15 transv. en cara derecha.	8/4/2025	8/4/2025	27 hrs Work					27h
	Suministro de Material Impermeabilizante en paredes y base del drenaje (Rollos de 1.00 m x 10 m)	8/4/2025	16/4/2025	63 hrs Work					63h
	Suministro de Tubos perforados ϕ 8"x19' de PVC SDR-26	15/4/2025	18/4/2025	72 hrs Work					72h
	Suministro de Grava de 1" @ 1 $\frac{1}{2}$ " (V = 0.30 mts. X 21/4/2025 5.00 mts. X 43.27) + 15% de desp.	19/4/2025	21/4/2025	9 hrs Work					9h
		29/4/2025	29/4/2025	126 hrs Work					126h



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACION DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
	Mano de Obra de construccion de Drenaje	19/4/2025	29/4/2025	72 hrs Work			72h		
	Suministro y colocacion de lloraderos en muro de 11/4/2025		14/4/2025	18 hrs Work			18h		
	Contencion con tubos $\phi 2"$ PVC SDR-26								
	Construccion de Canaleta con muros y piso	29/4/2025	2/5/2025	27 hrs Work			12h	15h	
	vaciados de H.S. con Rejilla compuesta de								
	angulares 2"x2" y Perfiles de 2"x1"								
	Excavación zapata de muro 6", a mano,	2/4/2025	4/4/2025	36 hrs Work			36h		
	(0.45x9.26x 0.80mts.).								
	Relleno Apisonado en piso (MACO). (Caliche)	11/4/2025	12/4/2025	18 hrs Work			18h		
	Relleno de reposición .	14/4/2025	15/4/2025	36 hrs Work			36h		
	Zapatas muros de 6", 9.26 x0.45 x 0.25, $3\phi 3/8"$, 4/4/2025		7/4/2025	18 hrs Work			18h		
	$\phi 3/8$ a 0.25mts.								
	Dintel, 0.15x0.20x1.40 (2), $3\phi 1/2"$ $2\phi 3/8"$,	23/4/2025	24/4/2025	9 hrs Work			9h		
	$\phi 3/8"$ a 0.20mts.								
	Losa hormigón armado, h=0.13mts.	15/4/2025	23/4/2025	63 hrs Work			63h		
	$3/8"@0.25m$ AD								
	Vuelos, h=0.13mts. $3/8"@0.25m$ AD	24/4/2025	26/4/2025	18 hrs Work			18h		
	Viga amarre en muro 15x20 4 $\phi 3/8"$ est.	11/4/2025	14/4/2025	18 hrs Work			18h		
	$3/8"@0.20m$ 1:2:4 Ligado a Mano								
	Bloques horm. 6", $\phi 3/8"$ a 0.80mts. B.N.P.	7/4/2025	8/4/2025	9 hrs Work			9h		
	Bloques horm. 6", $\phi 3/8"$ a 0.80mts., S.N.P.	8/4/2025	11/4/2025	27 hrs Work			27h		
	Antepecho de Bloques horm. 6" (2 Lineas)	26/4/2025	28/4/2025	9 hrs Work			9h		
	Fragüache.	28/4/2025	28/4/2025	0.63 hrs Work			0.63h		
	Empañete maestrado exterior.	28/4/2025	29/4/2025	10.8 hrs Work			10.8h		
	Empañete maestrado interior.	29/4/2025	12/5/2025	93.42 hrs Work			9.57h	83.85h	
	Cantos	9/5/2025	12/5/2025	15.66 hrs Work				15.66h	
	Mochetas	12/5/2025	13/5/2025	5.85 hrs Work				5.85h	
	Porcelanato 0.30 x 0.30mts. de alto tráfico.	13/5/2025	14/5/2025	4.5 hrs Work				4.5h	
	Zócalos	14/5/2025	14/5/2025	4.5 hrs Work				4.5h	



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACION DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
	Acrilica base blanca (blanco 00 popular económ.).	15/5/2025	15/5/2025	4.5 hrs	Work				4.5h
	Pintura semiglass pared interior.	15/5/2025	15/5/2025	2.25 hrs	Work				2.25h
	Acrilica pared exterior	15/5/2025	16/5/2025	2.25 hrs	Work				2.25h
	Inodoro Blanco de Servicio + Salidas	14/5/2025	14/5/2025	2.25 hrs	Work				2.25h
	Lavamanos Blanco de Servicio + Salidas	14/5/2025	15/5/2025	2.25 hrs	Work				2.25h
	Asfaltado del area de Intervencion para la Construcion del Muro E= 2" (Ver Planos)	8/5/2025	12/5/2025	270 hrs	Work				270h
	Rampa de Acceso Adyacente al Muro (Ver Planos)	2/5/2025	7/5/2025	36 hrs	Work				36h
	Demolicion de caseta (Garita) existente	3/3/2025	12/3/2025	288 hrs	Work	288h			
	Corte de Arboles existentes	3/3/2025	7/3/2025	180 hrs	Work	180h			
	Bote de escombros. (Aprox. 8.00 camiones de 15.00 M3)	4/4/2025	10/4/2025	90 hrs	Work		90h		
	Relleno de Reposicion de Material Excavado.	3/4/2025	9/4/2025	72 hrs	Work		72h		
	Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	3/3/2025	2/4/2025	450 hrs	Work	426h	24h		
	Relleno compactado caliche (Con Equipo) (Factor de Comp. = 1.30)	3/4/2025	29/4/2025	720 hrs	Work		720h		
	Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata.	1/4/2025	12/4/2025	90 hrs	Work		90h		
	Zapata de Muro de Contencion $\phi\frac{3}{4}"$ @ 0.15 A.D. 2/4/2025	2/4/2025	28/4/2025	360 hrs	Work		360h		
	cara inferior y $\phi\frac{1}{2}"$ @ 0.15 A.D en cara superior	10/4/2025	5/5/2025	540 hrs	Work		454.5h		
	Muro de Contencion $\phi\frac{1}{2}"$ @ 0.15 A.D. En cara izquierda y de $\phi\frac{1}{2}"$ @ 0.15 long. Y $\phi\frac{3}{4}"$ @ 0.15 transv. en cara derecha.	2/5/2025	6/5/2025	54 hrs	Work			54h	
	Suministro de Material Impermeabilizante en paredes y base del drenaje (Rollos de 1.00 m x 10 m)	2/5/2025	6/5/2025	54 hrs	Work				



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
	Suministro de Tubos perforados ϕ 8"x19' de PVC-SDR-26	5/5/2025	6/5/2025	9 hrsWork					9h
	Suministro de Grava de 1" @ 1½" (V = 0.30 mts. X5/5/2025 5.00 mts. X 55.20) + 15% de desp.	5/5/2025	9/5/2025	72 hrsWork					72h
	Mano de Obra de contruccion de Drenaje (perforado de tubos, colocacion de tubos, colocacion de material impermeable, colocacion de grava , etc.)	2/5/2025	10/5/2025	63 hrsWork					63h
	Suministro y colocacion de lloraderos en muro de 23/4/2025 contencion con tubos ϕ 2" PVC SDR-26 (l= 0.60 Mts. c/u) (11.00 tubos ϕ 2"x19' de PVC SDR-26)	23/4/2025	25/4/2025	18 hrsWork			18h		
	Asfaltado del area de intervencion para la Construccion del Muro y Area de Acceso Frontal E= 2" (ver planos)	13/5/2025	20/5/2025	540 hrsWork				540h	
	Construccion Acera Frontal con Malla Electrosoldada V= 55.20 x 2.30 x 0.12)M3	13/5/2025	14/5/2025	9 hrsWork				9h	
	Construccion de Contenes Nuevos en area frontal L= 59.91 Ml	29/4/2025	3/5/2025	35.91 hrsWork			16.5h	19.41h	
	Construccion de Contenes Nuevos en area perimetral del area verde L= 113.37 Ml	3/5/2025	13/5/2025	68.04 hrsWork				68.04h	
	Construccion de area verde con siembra de grama A= 145.74 m²	20/5/2025	27/5/2025	45 hrsWork				45h	
	Pintura Base (Blanco 00 Popular Economica)	27/5/2025	28/5/2025	9 hrsWork				9h	
	Pintura Acrilica exterior, mostaza y marrón	28/5/2025	29/5/2025	9 hrsWork				9h	
	Readecuacion y terminacion de Columnas	29/4/2025	3/5/2025	36 hrsWork			16.5h	19.5h	
	soporte de puerta de Bloques de 8" con Capiteles								



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
	Canalización en Tubería PVC SDR-26 de 2" Soterrada desde Panel de Lámparas Led de Calle Hacia Registro. Incluye Registro Metálico Pintado 8"x8"x4" N3R y Alambre #10 AWG THHN Para Potencial, Neutro y Tierra Para la Alimentación de los 4 Circuitos de Ilumin	15/4/2025	23/4/2025	126 hrs Work			126h		
4	RETROEXCAVADOR Limpieza del área Excavación de material próximo al muro. (Con Equipo) Excavación de material en área de zapata del muro. (Con Equipo) Limpieza área Demolicion de Muro de Bloques existente Con Equipo Excavacion de material proximo al muro. (Con Equipo) Excavacion de material en area de zapata del muro. (Con Equipo) Excavacion de material en area de zapata del muro. (Con Equipo) Demolicion de Acera Frontal con Malla Electrosoldada V= 59.91 x 2.30 x 0.12)M3	3/3/2025 20/3/2025 29/3/2025 1/4/2025 6/3/2025 3/3/2025 18/3/2025 25/3/2025 26/3/2025 1/4/2025 1/4/2025 1/4/2025 14/5/2025 3/4/2025	9/4/2025 25/3/2025 1/4/2025 3/4/2025 18/3/2025 6/3/2025 25/3/2025 1/4/2025 1/4/2025 9/4/2025 9/4/2025 14/5/2025 4/4/2025	360 hrs Work 36 hrs Work 18 hrs Work 18 hrs Work 90 hrs Work 36 hrs Work 54 hrs Work 45 hrs Work 63 hrs Work 1,598.31 hrs Work 9 hrs Work		273h 36h 15h 18h 90h 36h 54h 42h 63h 1,240.5h 9h	87h 3h 3h 18h 3h 3h 3h 3h 3h 357.81h		
5	ALBAÑIL Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata. Zapata de Muro de Contencion $\phi\frac{3}{4}$" @ 0.15 A.D. 4/4/2025 cara inferior y $\phi\frac{1}{2}$" @ 0.15 A.D en cara superior. Muro de Contencion $\phi\frac{1}{2}$" @ 0.15 A.D. En cara Izquierda y de $\phi\frac{1}{2}$" @ 0.15 long. Y $\phi\frac{3}{4}$" @ 0.15 transv. en cara derecha.	8/4/2025 16/4/2025	16/4/2025	63 hrs Work			63h		




CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
1	Construccion de Cancheta con muros y piso vaciados de H.S. con Rejilla compuesta de angulares 2"x2" y Perfiles de 2"x1"	29/4/2025	2/5/2025	27 hrsWork			12h	15h	
	Zapatas muros de 6", 9.26 x0.45 x 0.25, 3Ø 3/8", 4/4/2025		7/4/2025	18 hrsWork			18h		
	Ø3/8 a 0.25mts.								
	Dintel, 0.15x0.20x1.40 (2), 3Ø 1/2" 2Ø 3/8",	23/4/2025	24/4/2025	9 hrsWork			9h		
	Ø3/8" a 0.20mts.								
	Losa hormigón armado, h=0.13mts.	15/4/2025	23/4/2025	63 hrsWork			63h		
	3/8"@0.25m AD								
	Vuelos, h=0.13mts. 3/8"@0.25m AD	24/4/2025	26/4/2025	18 hrsWork			18h		
	Viga amarre en muro 15x20 4 Ø 3/8" est.	11/4/2025	14/4/2025	18 hrsWork			18h		
	3/8"@0.20m 1:2:4 Ligado a Mano								
	Bloques horm. 6", Ø3/8" a 0.80mts. B.N.P.	7/4/2025	8/4/2025	9 hrsWork			9h		
	Bloques horm. 6", Ø3/8" a 0.80mts., S.N.P.	8/4/2025	11/4/2025	27 hrsWork			27h		
	Antepecho de Bloques horm. 6" (2 Lineas)	26/4/2025	28/4/2025	9 hrsWork			9h		
	Fragüache.	28/4/2025	28/4/2025	0.63 hrsWork			0.63h		
	Empañete maestrado exterior.	28/4/2025	29/4/2025	10.8 hrsWork			10.8h		
	Empañete maestrado interior.	29/4/2025	12/5/2025	93.42 hrsWork			9.57h	83.85h	
	Cantos	9/5/2025	12/5/2025	15.66 hrsWork				15.66h	
	Mochetas	12/5/2025	13/5/2025	5.85 hrsWork				5.85h	
	Rampa de Acceso Adyacente al Muro (Ver Planos)	2/5/2025	7/5/2025	36 hrsWork				36h	
	Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata.	1/4/2025	12/4/2025	90 hrsWork			90h		
	Zapata de Muro de Contencion φ¾" @ 0.15 A.D. 2/4/2025		28/4/2025	360 hrsWork			360h		
	cara inferior y φ½" @ 0.15 A.D en cara superior								
	Muro de Contencion φ½" @ 0.15 A.D. En cara	10/4/2025	5/5/2025	540 hrsWork			454.5h	85.5h	
	izquierda y de φ½" @ 0.15 long. Y φ¾" @ 0.15								
	transv. en cara derecha.								



CONSTRUCTORA SERCONSA
NIVELACION DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
	Construccion Acera Frontal con Malla	13/5/2025	14/5/2025	9 hrs\Work					9h
	Electrosoldada V= 55.20 x 2.30 x 0.12)M3								
	Construccion de Contenes Nuevos en area frontal L= 59.91 MI	29/4/2025	3/5/2025	35.91 hrs\Work			16.5h	19.41h	
	Construccion de Contenes Nuevos en area perimetral del area verde L= 113.37 MI	3/5/2025	13/5/2025	68.04 hrs\Work				68.04h	
	Readecuacion y terminacion de Columnas soporte de puerta de Bloques de 8" con Capiteles	29/4/2025	3/5/2025	36 hrs\Work			16.5h	19.5h	
	CARPINTERO								
6	Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata.	1/4/2025	14/5/2025	1,390.95 hrs\Work			1,158h	232.95h	
	Zapata de Muro de Contencion $\phi\frac{3}{4}$ " @ 0.15 A.D. 4/4/2025	3/4/2025	4/4/2025	9 hrs\Work			9h		
	carra inferior y $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 A.D en cara superior.								
	Muro de Contencion $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 A.D. En cara izquierda y de $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 long. Y $\phi\frac{3}{4}$ " @ 0.15 transv. en cara derecha.	8/4/2025	16/4/2025	63 hrs\Work			63h		
	Construccion de Canaleta con muros y piso vaciados de H.S. con Rejilla compuesta de angulares 2"x2" y Perfiles de 2"x1"	29/4/2025	2/5/2025	27 hrs\Work			12h	15h	
	Zapatas muros de 6" , 9.26 x0.45 x 0.25, $3\phi\ 3/8$ ", 4/4/2025		7/4/2025	18 hrs\Work			18h		
	$\phi 3/8$ a 0.25mts.								
	Dintel, 0.15x0.20x1.40 (2), $3\phi\ 1/2$ " $2\phi\ 3/8$ ", $\phi 3/8$ " a 0.20mts.	23/4/2025	24/4/2025	9 hrs\Work			9h		
	Losa hormigón armado, h=0.13mts.	15/4/2025	23/4/2025	63 hrs\Work			63h		
	$3/8$ "@0.25m AD								
	Vuelos, h=0.13mts. $3/8$ "@0.25m AD	24/4/2025	26/4/2025	18 hrs\Work			18h		
	Viga amarre en muro 15x20 4 $\phi\ 3/8$ " est. $3/8$ "@0.20m 1:2:4 Ligado a Mano	11/4/2025	14/4/2025	18 hrs\Work			18h		



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACION DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
1	Rampa de Acceso Adyacente al Muro (Ver Planos)	2/5/2025	7/5/2025	36 hrs Work					36h
	Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata.	1/4/2025	12/4/2025	90 hrs Work			90h		
	Zapata de Muro de Contencion $\phi\frac{3}{4}"$ @ 0.15 A.D. 2/4/2025		28/4/2025	360 hrs Work			360h		
	cara inferior y $\phi\frac{1}{2}"$ @ 0.15 A.D. en cara superior								
	Muro de Contencion $\phi\frac{1}{2}"$ @ 0.15 A.D. En cara izquierda y de $\phi\frac{1}{2}"$ @ 0.15 long. Y $\phi\frac{3}{4}"$ @ 0.15 transv. en cara derecha.	10/4/2025	5/5/2025	540 hrs Work			454.5h	85.5h	
	Construccion Acera Frontal con Malla Electrosoldada V= 55.20 x 2.30 x 0.12)M3	13/5/2025	14/5/2025	9 hrs Work				9h	
	Construccion de Contenes Nuevos en area frontal L= 59.91 Ml	29/4/2025	3/5/2025	35.91 hrs Work			16.5h	19.41h	
	Construccion de Contenes Nuevos en area perimetral del area verde L= 113.37 Ml	3/5/2025	13/5/2025	68.04 hrs Work				68.04h	
7	PLOMERO								
	Suministro de Tubos perforados ϕ 8"X19' de PVC-SDR-26	11/4/2025	15/5/2025	193.5 hrs Work			117h	76.5h	
	Mano de Obra de construccion de Drenaje Suministro y colocacion de lloraderos en muro de 11/4/2025	19/4/2025	21/4/2025	9 hrs Work			9h		
	contencion con tubos ϕ 2" PVC SDR-26			72 hrs Work			72h		
	Inodoro Blanco de Servicio + Salidas	14/5/2025	14/5/2025	18 hrs Work			18h		
	Lavamanos Blanco de Servicio + Salidas	14/5/2025	14/5/2025	2.25 hrs Work				2.25h	
	Suministro de Tubos perforados ϕ 8"X19' de PVC-SDR-26	5/5/2025	6/5/2025	9 hrs Work				2.25h	
	Mano de Obra de contruccion de Drenaje (perforado de tubos, colocacion de tubos, colocacion de material impermeable, colocacion de grava, etc.)	2/5/2025	10/5/2025	63 hrs Work				63h	



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
	Suministro y colocación de lloraderos en muro de 23/4/2025		25/4/2025	18 hrs Work			18h		
	contención con tubos $\phi 2"$ PVC SDR-26 (L= 0.60 Mts. c/u) (11.00 tubos $\phi 2"$ x19' de PVC SDR-26)								
8	TRABAJADORES CALIF	3/3/2025	22/5/2025	828 hrs Work		27h	168h	633h	
	Suministro de Material Impermeabilizante en paredes y base del drenaje (Rollos de 1.00 m x 10 m)	15/4/2025	18/4/2025	90 hrs Work			90h		
	Construcción de Canaleta con muros y piso vaciados de H.S. con Rejilla compuesta de angulares 2"x2" y Perfiles de 2"x1"	29/4/2025	2/5/2025	27 hrs Work			12h	15h	
	Puerta polimetal blanca (0.80 x 2.10)	14/5/2025	15/5/2025	9 hrs Work				9h	
	Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal 14/5/2025	14/5/2025	16/5/2025	18 hrs Work				18h	
	claro.(0.80 x 1.00)								
	Rejas (incluye pintura).	16/5/2025	20/5/2025	27 hrs Work				27h	
	Malla ciclónica de 6 pies de altura Cal. 9 con alambre Tipo Trinchera.	12/5/2025	16/5/2025	36 hrs Work				36h	
	Retiro de Chatarra metálica y Tanques de Combustibles de muros de H.A. existente	3/3/2025	5/3/2025	27 hrs Work		27h			
	Suministro de Material Impermeabilizante en paredes y base del drenaje (Rollos de 1.00 m x 10 m)	2/5/2025	6/5/2025	81 hrs Work				81h	
	Construcción de Porton de Entrada (Ancho= 7.52 29/4/2025		16/5/2025	270 hrs Work			33h	237h	
	mts. Y L= 2.50 mts. con planchuelas de 1½" x ¼" x 20' de 1.6 mms., barras cuadradas de ¾" x 20', barras cuadradas de ½" x 20', parales de perfiles 3" x 3" con capiteles y tola de 4' x 8' x 3/16" (incluye pi								



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACION DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
1	Verja metelica sobre muros frontal y lateral derecho. Con planchuelas de 1½" x ½" x 20' de 1.6 mms. , barras cuadradas de ¾" x 20', barras cuadradas de ½" x 20', parales de perfiles 3" x 3" con capiteles. Columnas de H.A. 0.20 mts. X 0.20 mts. 4φ½", est.	29/4/2025	10/5/2025	180 hrs	Work			33h	147h
	Suministro de Lampara Led de Calle 60W, Con Fotocelda Integrada, 120V, 5000K, IP65.	19/5/2025	22/5/2025	31.5 hrs	Work				31.5h
	Postes para Luminarias de hierro de 4"x4" de 2.25 mms. De espesor con con tubos de 1½" para soporte de lamparas con pernos y planchuelas y pedestal de H.A.	14/5/2025	19/5/2025	31.5 hrs	Work				31.5h
9	CAMION VOLTEO	3/3/2025	20/5/2025	1,098 hrs	Work				324h
	Bote de escombros.	20/3/2025	2/4/2025	90 hrs	Work		504h 78h	270h 12h	
	Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	2/4/2025	10/4/2025	126 hrs	Work			126h	
	Bote material excavado + 30% abultamiento.	2/4/2025	4/4/2025	18 hrs	Work			18h	
	Asfaltado del area de Intervencion para la Construccion del Muro E= 2" (Ver Planos)	8/5/2025	12/5/2025	108 hrs	Work				108h
	Bote de escombros. (Aprox. 8.00 camiones de 15.00 M3)	4/4/2025	10/4/2025	90 hrs	Work			90h	
	Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	3/3/2025	2/4/2025	450 hrs	Work		426h	24h	
	Asfaltado del area de Intervencion para la Construccion del Muro y Area de Acceso Frontal E= 2" (ver planos)	13/5/2025	20/5/2025	216 hrs	Work				216h
10	CONDUCTOR	3/3/2025	20/5/2025	1,116 hrs	Work		504h	270h	342h
	Bote de escombros.	20/3/2025	2/4/2025	90 hrs	Work		78h	12h	
	Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	2/4/2025	10/4/2025	126 hrs	Work			126h	



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
	Bote material excavado + 30% abutamiento.	2/4/2025	4/4/2025		18 hrs Work				
	Asfaltado del area de Intervencion para la Construcion del Muro E= 2" (Ver Planos)	8/5/2025	8/5/2025		18 hrs Work		18h		18h
	Bote de escombros. (Aprox. 8.00 camiones de 15.00 M3)	4/4/2025	10/4/2025		90 hrs Work		90h		
	Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	3/3/2025	2/4/2025		450 hrs Work		426h	24h	
	Asfaltado del area de Intervencion para la Construcion del Muro y Area de Acceso Frontal E= 2" (ver planos)	13/5/2025	20/5/2025		324 hrs Work				324h
11	TOPOGRAFO								
	Replanteo general. (A= 69.30 M2)	6/3/2025	28/3/2025		90 hrs Work		90h		
	Replanteo general.	26/3/2025	28/3/2025		27 hrs Work		27h		
12	EQ. DE TOPOGRAFIA								
	Replanteo general. (A= 69.30 M2)	6/3/2025	28/3/2025		63 hrs Work		63h		
	Replanteo general.	26/3/2025	28/3/2025		90 hrs Work		90h		
		6/3/2025	28/3/2025		27 hrs Work		27h		
		26/3/2025	28/3/2025		63 hrs Work		63h		
13	RODILLO COMPACTADOR								
	Relleno compactado caliche (Con Equipo) (Factor de Comp. = 1.30)	3/4/2025	20/5/2025		324 hrs Work		243h		81h
		21/4/2025	29/4/2025		63 hrs Work		63h		
	Asfaltado del area de Intervencion para la Construcion del Muro E= 2" (Ver Planos)	8/5/2025	12/5/2025		27 hrs Work				27h
	Relleno compactado caliche (Con Equipo) (Factor de Comp. = 1.30)	3/4/2025	16/4/2025		180 hrs Work		180h		
	Asfaltado del area de Intervencion para la Construcion del Muro y Area de Acceso Frontal E= 2" (ver planos)	13/5/2025	20/5/2025		54 hrs Work				54h
14	CAMION CISTERNA								
	Asfaltado del area de Intervencion para la Construcion del Muro E= 2" (Ver Planos)	8/5/2025	20/5/2025		81 hrs Work				81h
		8/5/2025	12/5/2025		27 hrs Work				27h



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.


ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
15	Asfaltado del area de Intervencion para la Construcion del Muro y Area de Acceso Frontal E= 2" (ver planos) ING. RESIDENTE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.	13/5/2025	20/5/2025	54 hrsWork					54h
16	VARILLERO Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata. Zapata de Muro de Contencion $\phi\frac{3}{8}$ " @ 0.15 A.D. 4/4/2025 cara inferior y $\phi\frac{3}{8}$ " @ 0.15 A.D en cara superior. Muro de Contencion $\phi\frac{3}{8}$ " @ 0.15 A.D. En cara izquierda y de $\phi\frac{3}{8}$ " @ 0.15 long. Y $\phi\frac{3}{8}$ " @ 0.15 transv. en cara derecha. Zapatas muros de 6", 9.26 x0.45 x 0.25, 3Ø 3/8", 4/4/2025 Ø3/8 a 0.25mts. Dintel, 0.15x0.20x1.40 (2), 3Ø 1/2" 2Ø 3/8", Ø3/8" a 0.20mts. Losa hormigón armado, h=0.13mts. 3/8"@0.25m AD Vuelos, h=0.13mts. 3/8"@0.25m AD Viga amarre en muro 15x20 4 φ 3/8" est. 3/8"@0.20m 1:2:4 Ligado a Mano Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata. Zapata de Muro de Contencion $\phi\frac{3}{8}$ " @ 0.15 A.D. 2/4/2025 cara inferior y $\phi\frac{3}{8}$ " @ 0.15 A.D en cara superior Muro de Contencion $\phi\frac{3}{8}$ " @ 0.15 A.D. En cara izquierda y de $\phi\frac{3}{8}$ " @ 0.15 long. Y $\phi\frac{3}{8}$ " @ 0.15 transv. en cara derecha.	3/3/2025 3/3/2025 1/4/2025 3/4/2025 1/4/2025 3/4/2025 4/4/2025 8/4/2025 8/4/2025 16/4/2025 23/4/2025 23/4/2025 15/4/2025 24/4/2025 11/4/2025 1/4/2025 12/4/2025 28/4/2025 10/4/2025 5/5/2025	29/5/2025 29/5/2025 5/5/2025 4/4/2025 5/5/2025 4/4/2025 4/4/2025 8/4/2025 8/4/2025 16/4/2025 24/4/2025 23/4/2025 15/4/2025 26/4/2025 14/4/2025 12/4/2025 28/4/2025 5/5/2025	639.45 hrsWork 639.45 hrsWork 1,215 hrsWork 9 hrsWork 27 hrsWork 63 hrsWork 18 hrsWork 9 hrsWork 63 hrsWork 18 hrsWork 18 hrsWork 18 hrsWork 90 hrsWork 360 hrsWork 540 hrsWork		213h 213h 1,129.5h 9h 27h 63h 18h 9h 63h 18h 18h 18h 90h 360h 454.5h	222h 222h 85.5h 9h 27h 63h 18h 9h 63h 18h 18h 18h 90h 360h 85.5h		



NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details
1					M1
					M2
					M3
					M4

17	PISERO	13/5/2025	14/5/2025	9 hrs Work	9h
	Porcelanato 0.30 x 0.30mts. de alto tráfico.	13/5/2025	14/5/2025	4.5 hrs Work	4.5h
	Zócalos	14/5/2025	14/5/2025	4.5 hrs Work	4.5h
18	AV. CALIFICADOS	3/3/2025	20/5/2025	738 hrs Work	27h
	Suministro de Material Impermeabilizante en	15/4/2025	18/4/2025	90 hrs Work	156h
	paredes y base del drenaje (Rollos de 1.00 m x				90h
	10 m)				
	Puerta polimetral blanca (0.80 x 2.10)	14/5/2025	15/5/2025	9 hrs Work	9h
	Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal	14/5/2025	16/5/2025	18 hrs Work	18h
	claro.(0.80 x 1.00)				
	Rejas (incluye pintura).	16/5/2025	20/5/2025	27 hrs Work	27h
	Malla ciclónica de 6 pies de altura Cal. 9 con	12/5/2025	16/5/2025	36 hrs Work	36h
	alambre Tipo Trinchera.				
	Retiro de Chatarra metálica y Tanques de	3/3/2025	5/3/2025	27 hrs Work	27h
	Combustibles de muros de H.A. existente				
	Suministro de Material Impermeabilizante en	2/5/2025	6/5/2025	81 hrs Work	81h
	paredes y base del drenaje (Rollos de 1.00 m x				
	10 m)				
	Construccion de Porton de Entrada (Ancho= 7.52	29/4/2025	16/5/2025	270 hrs Work	33h
	mts. Y L= 2.50 mts. con planchuelas de 1½" x ¾"				237h
	x 20' de 1.6 mms. , barras cuadradas de ⅝" x 20' ,				
	barras cuadradas de ½" x 20' , pares de perfiles				
	3" x 3" con capiteles y tola de 4' x 8' x 3/16" (				
	Incluye pi				
	Verja metálica sobre muros frontal y lateral	29/4/2025	10/5/2025	180 hrs Work	33h
	derecho. Con planchuelas de 1½" x ¾" x 20' de				147h
	1.6 mms. , barras cuadradas de ⅝" x 20' , barras				
	cuadradas de ½" x 20' , pares de perfiles 3" x 3"				
	con capiteles. Columnas de H.A. 0.20 mts. X 0.20				
	mts. 4φ½" , est.				



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
19	PINTOR	15/5/2025	29/5/2025		54 hrs Work				54h
	Rejas (incluye pintura).	16/5/2025	20/5/2025		27 hrs Work				27h
	Acrílica base blanca (blanco 00 popular económ.).	15/5/2025	15/5/2025		4.5 hrs Work				4.5h
	Pintura semigloss pared interior.	15/5/2025	15/5/2025		2.25 hrs Work				2.25h
	Acrílica pared exterior	15/5/2025	16/5/2025		2.25 hrs Work				2.25h
	Pintura Base (Blanco 00 Popular Economica)	27/5/2025	28/5/2025		9 hrs Work				9h
	Pintura Acrílica exterior, mostaza y marrón	28/5/2025	29/5/2025		9 hrs Work				9h
20	MINICARGADOR	21/4/2025	9/5/2025		99 hrs Work				63h
	Suministro de Grava de 1" @ 1½" (V = 0.30 mts. X 21/4/2025		29/4/2025		63 hrs Work			63h	36h
	5.00 mts. X 43.27) + 15% de desp.								
	Suministro de Grava de 1" @ 1½" (V = 0.30 mts. X 5/5/2025		9/5/2025		36 hrs Work				36h
	5.00 mts. X 55.20) + 15% de desp.								
21	CAMION DISTRIBUIDOR	8/5/2025	20/5/2025		81 hrs Work				81h
	Asfaltado del area de intervencion para la	8/5/2025	12/5/2025		27 hrs Work				27h
	Construccion del Muro E= 2" (Ver Planos)								
	Asfaltado del area de intervencion para la	13/5/2025	20/5/2025		54 hrs Work				54h
	Construccion del Muro y Area de Acceso Frontal E= 2" (ver planos)								
22	COMPACTADOR MANUAL	3/4/2025	29/4/2025		549 hrs Work			549h	
	Relleno compactado caliche (Con Equipo) (	21/4/2025	29/4/2025		126 hrs Work			126h	
	Factor de Comp. = 1.30)								
	Relleno Apisonado en piso (MACO). (Caliche)	11/4/2025	12/4/2025		9 hrs Work			9h	
	Relleno de reposición.	14/4/2025	15/4/2025		18 hrs Work			18h	
	Relleno de Reposición de Material Excavado.	3/4/2025	9/4/2025		36 hrs Work			36h	
	Relleno compactado caliche (Con Equipo) (	3/4/2025	29/4/2025		360 hrs Work			360h	
	Factor de Comp. = 1.30)								
23	GRUA	3/3/2025	22/5/2025		90 hrs Work			27h	63h
	Retiro de Chatarra metalica y Tanques de	3/3/2025	5/3/2025		27 hrs Work			27h	
	Combustibles de muros de H.A. existente								

CONSTRUCTORA SERCONSA
NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
	Alquiler por Dia de Grúa Con Canasto para Instalación de Lampara Led de Calle	14/5/2025	22/5/2025	63 hrs Work					63h
24	JARDINERO	20/5/2025	27/5/2025	45 hrs Work					45h
	Construccion de area verde con siembra de grama A= 145.74 m ²	20/5/2025	27/5/2025	45 hrs Work					45h
25	SERV. SUBCONTRATADO	20/5/2025	27/5/2025	Work					
	Diseño de Letra JCE en Verja frontal	20/5/2025	27/5/2025	Work					
26	ELECTRICISTA	15/4/2025	22/5/2025	351 hrs Work			135h		216h
	Suministro de Lampara Led de Calle 60W, Con Fotocelda Integrada, 120V, 5000K, IP65.	19/5/2025	22/5/2025	31.5 hrs Work					31.5h
	Canalización de Salidas de Alimentación Desde Tapon de Registro Roscado de 4" en PVC Hacia Lamparas Led de Calle en Tubería PVC de 3/4", Registro Metalico 2"x4" con Ko. de 3/4" y Alambre #10 AWG THHN (Negro o Rojo para el Potencial, Blanco para Neutro y V	15/4/2025	23/4/2025	63 hrs Work			63h		
	Suministro e Instalación de Tapon de Registro Roscado en PVC de 4". Canalización en Tubería en PVC de 2", 1 1/2" y 1" SDR-26 Desde Registro Metalico Pintado 6"x6"x4" N3R. Alambre #10 AWG THHN Potencial, Neutro y Tierra Para la Alimentación de los 4 Circu	22/4/2025	23/4/2025	9 hrs Work			9h		
	Mano de Obra Instalación de Lampara Led de calle	14/5/2025	22/5/2025	63 hrs Work					63h
	Mano de Obra Instalación Salidas de Alimentación desde Tapon de Registro Roscado en PVC Hacia Lampara Led de Calle	14/5/2025	22/5/2025	63 hrs Work					63h
	Mano de Obra Instalación Salidas de Alimentación desde Registro Metalico 6"x6"x4" Hacia Tapon de Registro Roscado en PVC	21/5/2025	22/5/2025	9 hrs Work					9h



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
1	Postes para luminarias de hierro de 4"x4" de 2.25 mms. De espesor con con tubos de 1½" para soporte de lamparas con pernos y planchuelas y pedestal de H.A.	14/5/2025	19/5/2025	31.5 hrsWork				31.5h	
	Suministro e Instalacion de Panel de Distribucion 8-16 Circuitos, 1F, 125A, 120/240V, Nema 3R Tipo de disyuntor: THQL. Para Alimentacion de Lamparas Led de Calle, Compuesto por: Breaker 20A-----4Uds Canalizacion en tuberia EMT 1 1/2" Visto Desde P	19/5/2025	20/5/2025	9 hrsWork				9h	
	Canalizacion en Tuberia PVC SDR-26 de 2" Soterrada desde Panel de Lamparas Led de Calle Hacia Registro. Incluye Registro Metalico Pintado 8"x8"x4" N3R y Alambre #10 AWG THHN Para Potencial, Neutro y Tierra Para la Alimentacion de los 4 Circuitos de Ilumin	15/4/2025	23/4/2025	63 hrsWork				63h	
	Mano de obra Instalacion Sistema electrico de Potencia	19/5/2025	20/5/2025	9 hrsWork				9h	
27	AV. DE ELECTRICIDAD	15/4/2025	22/5/2025	342 hrsWork				135h	207h
	Suministro de Lampara Led de Calle 60W, Con Fotocelda Integrada, 120V, 5000K, IP65.	19/5/2025	22/5/2025	31.5 hrsWork				31.5h	
	Canalizacion de Salidas de Alimentacion Desde Tapon de Registro Roscado de 4" en PVC Hacia Lamparas Led de Calle en Tuberia PVC de 3/4", Registro Metalico 2"x4" con Ko. de 3/4" y Alambre #10 AWG THHN (Negro o Rojo para el Potencial, Blanco para Neutro y V	15/4/2025	23/4/2025	63 hrsWork				63h	



CONSTRUCTORA SERCONSA

NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
1	Suministro e Instalacion de Tapon de Registro Roscado en PVC de 4". Canalizacion en Tuberia en PVC de 2" , 1 1/2" y 1" SDR-26 Desde Registro Metalico Pintado 6"x6"x4" N3R. Alambre #10 AWG THHN Potencial, Neutro y Tierra Para la Alimentacion de los 4 Circu	22/4/2025	23/4/2025	9 hrs Work				9h	
	Mano de Obra Instalacion de Lampara Led de calle	14/5/2025	22/5/2025	63 hrs Work				63h	
	Alimentacion desde Tapon de Registro Roscado en PVC Hacia Lampara Led de Calle	14/5/2025	22/5/2025	63 hrs Work				63h	
	Mano de Obra Instalacion Salidas de Alimentacion desde Registro Metalico 6"x6"x4"	21/5/2025	22/5/2025	9 hrs Work				9h	
	Hacia Tapon de Registro Roscado en PVC Postes para Luminarias de hierro de 4"x4" de 2.25 mms. De espesor con con tubos de 1 1/2" para soporte de lamparas con pernos y planchuelas y pedestal de H.A.	14/5/2025	19/5/2025	31.5 hrs Work				31.5h	
	Suministro e Instalacion de Panel de Distribucion 8-16 Circuitos, 1F, 125A, 120/240V, Nema 3R Tipo de disyuntor: THQL. Para Alimentacion de Lamparas Led de Calle, Compuesto por: Breaker 20A-----4Uds Canalizacion en tuberia EMT 1 1/2" Visto Desde P	19/5/2025	20/5/2025	9 hrs Work				9h	
	Canalizacion en Tuberia PVC SDR-26 de 2" Soterrada desde Panel de Lamparas Led de Calle Hacia Registro. Incluye Registro Metalico Pintado 8"x8"x4" N3R y Alambre #10 AWG THHN Para Potencial, Neutro y Tierra Para la Alimentacion de los 4 Circuitos de Ilumin	15/4/2025	23/4/2025	63 hrs Work				63h	



CONSTRUCTORA SERCONSA NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NAVE LAS COLINAS.

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4
28	DIRECTOR DE OBRA	3/3/2025	29/5/2025	639.45 hrs Work		213h	222h	204.45h	
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NAVE LAS COLINAS.	3/3/2025	29/5/2025	639.45 hrs Work		213h	222h	204.45h	
29	CAPATAZ	3/3/2025	29/5/2025	1,218.15 hrs Work		426h	444h	348.15h	
	MURO LATERAL L= 13.86 Mts.	3/3/2025	20/5/2025	578.7 hrs Work		213h	222h	143.7h	
	MURO FRONTAL L= 55.20 Mts.	3/3/2025	29/5/2025	639.45 hrs Work		213h	222h	204.45h	
	ENC. DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	3/3/2025	29/5/2025	639.45 hrs Work		213h	222h	204.45h	
30	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NAVE LAS COLINAS.	3/3/2025	29/5/2025	639.45 hrs Work		213h	222h	204.45h	



CALENDARIO DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLINAS.

March 2025

[illegible]

CONSTRUCTORA SERCONSA

CALENDARIO DE EJECUCION

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NAVE LAS COLINAS.

Overflow Tasks

ID	Name	Start	Finish
77	Corte de Arboles existentes	3/3/2025	7/3/2025
76	Retiro de Chatarra metalica y Tanques de Combustibles de muros de H.A. existente	3/3/2025	5/3/2025
75	Demolicion de muros de H.A. (Bases de Tanques de Combustible) existente	3/3/2025	20/3/2025
74	Demolicion de caseta (Garita) existente	3/3/2025	12/3/2025
80	Demolicion de Muro de Bloques existente Con Equipo	3/3/2025	6/3/2025
81	Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente con Equipo	8/3/2025	11/3/2025
85	Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	3/3/2025	2/4/2025
7	Demolicion de Garita del Edificio adyacente	3/3/2025	12/3/2025
12	Demolicion de Muro de Contencion existente Con Compresor	3/3/2025	7/3/2025
13	Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente con Compresor	7/3/2025	8/3/2025
2	INICIO DEL PROYECTO	3/3/2025	3/3/2025
8	Demolicion de Rampa adyacente al Muro	12/3/2025	15/3/2025
9	Demolicion de Canaleta adyacente al Muro	15/3/2025	20/3/2025
82	Excavacion de material proximo al muro. (Con Equipo)	18/3/2025	25/3/2025
10	Bote de escombros.	20/3/2025	2/4/2025
5	Limpieza del area	20/3/2025	25/3/2025
6	Replanteo general. (A= 69.30 M2)	26/3/2025	28/3/2025
14	Excavacion de material proximo al muro. (Con Equipo)	29/3/2025	1/4/2025



CONSTRUCTORA SERCONSA CALENDARIO DE EJECUCION

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NAVE LAS COLINAS.

April 2025

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
		1	2	3	4	5
Excavacion de material en area de zapata del muro. (C		Demolicion de Acera Frontal con Malla Electrosoldada V= 59.91 x 2.30 x 0.12)M3; 7 days				
		Bote de escombros. (Aprox. 8.00				
6	7	8	9	10	11	12
Demolicion de Acera Frontal con Malla Electrosoldada V= 59.91 x 2.30 x 0.12)M3; 5 days		Demolicion de Contenes en area frontal L= 59.91 MI; 4 days				
		Bote de escombros. (Aprox. 8.00				
13	14	15	16	17	18	19
Demolicion de Contenes en area frontal L=		Canalizacion de Salidas de Alimentacion Desde Tapon de Registro Roscado de 4" en PVC Hacia Lamparas Led de				
		Canalizacion en Tuberia PVC SDR-26 de 2" Soterrada desde Panel de Lamparas Led de Calle Hacia Registro. Incl				
20	21	22	23	24	25	26
Canalizacion de Salidas de Alimentacion Desde Tapon de Registro Roscado (		Suministro e Instalac				
		Canalizacion en Tuberia PVC SDR-26 de 2" Soterrada desde Panel de Lampai				
27	28	29	30			
		Construccion de Contenes Nuevos en area frontal L= 59.91 MI; 3.99 days				

