



1. DIAGRAMA DE GANTT IDENTIFICANDO LA RUTA CRÍTICA



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	→	OBRA: NAVE PARAISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL	42.92 días	mar 8/8/23	lun 6/11/23	
2	→	PRELIMINARES	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
3	→	TRABAJOS PRELIMINARES	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
4	→	Limpieza del Area	2 días	mar 8/8/23	jue 10/8/23	
5	→	Desmantelar y sustituir plancha acanalada translucida techo (Policarbonato)	2 días	mar 8/8/23	jue 10/8/23	4CC
6	→	ESTRUCTURA METALICA NAVE	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
7	→	Cierre posterior en Peines de Naves en Aluzinc (28 mt2 c/u)	2 días	lun 2/10/23	mié 4/10/23	5CC
8	→	Estructura para Soporte Equipos de Aires Acondicionados (en cables de acero para sostener unidades evaporadoras)	3 días	lun 2/10/23	vie 6/10/23	8CC
9	→	Restauracion y mantenimiento de vigas y columnas metalicas	2 días	vie 6/10/23	mié 11/10/23	9
10	→	Pintura Anti oxido para estructura	4 días	vie 13/10/23	lun 23/10/23	10CC
11	→	MURO DE CIERRE AREA DE LOGISTICA	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
12	→	MOVIMIENTO DE TIERRA	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
13	→	Demolicion con Compresor Piso Hormigon Armado Existente para excavacion	0.92 días	lun 14/8/23	mar 15/8/23	5CC
14	→	Excavacion Zapata muros de 6' caliche	1.33 días	mar 15/8/23	jue 17/8/23	16
15	→	Excavacion Zapata de Columnas	1.33 días	lun 28/8/23	mié 30/8/23	17CC
16	→	Relleno Compactado de reposicion	0.67 días	mié 30/8/23	jue 31/8/23	18
17	→	Bote de materiales	0.67 días	mié 30/8/23	jue 31/8/23	19CC
18	→	HORMIGON ARMADO EN:	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
19	→	Zapata de muros 6''	2 días	jue 17/8/23	mar 22/8/23	17
20	→	Zapata Columnas	1.33 días	mar 22/8/23	jue 24/8/23	23CC
21	→	Columnas Amarre	1.33 días	jue 24/8/23	lun 28/8/23	24


CONSTRUÑOVE
 RNC: 1-31-97386-8
 Av. Winston Churchill 1104,
 Bayamo Morales, Santo Domingo
 Tel.: 829-649-1101

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
26	→	Viga de Amarre	1.33 días	mar 19/9/23	lun 25/9/23	29CC
27	→	Dinteles	1.33 días	mié 20/9/23	mar 26/9/23	30
28	→	MUROS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
29	→	muros de 6' B.N.P	2.67 días	mar 22/8/23	lun 28/8/23	23
30	→	muros de 6' S.N.P	3.33 días	lun 28/8/23	lun 4/9/23	29
31	→	TERMINACION DE SUPERFICIE (MUROS)	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
32	→	Fraguache en Vigas y Columnas	1.33 días	lun 4/9/23	mié 6/9/23	30
33	→	Violinado en bloques Interior	1.33 días	mié 6/9/23	vie 8/9/23	32
34	→	Resane	0.67 días	lun 4/9/23	mar 5/9/23	30
35	→	Mochetas	1.33 días	lun 11/9/23	mié 13/9/23	33CC
36	→	Cantos	1.33 días	jue 14/9/23	lun 18/9/23	35
37	→	PISOS				
38	→	Reposicion piso pulido area de muro nuevo	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
39	→		1.33 días	lun 9/10/23	mié 25/10/23	36
40	→					
41	→	DEPOSITO Y AREAS DE PRODUCCION	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
42	→	MUROS LIGEROS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
43	→	Divisiones en Sheetrock	1.33 días	lun 28/8/23	jue 31/8/23	5CC
44	→	Cierre de ventanas Caladas en durock a una cara	1.33 días	mié 13/9/23	jue 14/9/23	43CC
45	→	PUERTAS Y VENTANAS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
46	→	Suministro e Instalacion de Puertas de Polimetal Everdoor blanca	0.67 días	mié 13/9/23	mié 13/9/23	44CC
47	→	Suministro e Instalacion de Puertas comerciales en cristal doble (2.00x2.10 Mt2)	0.67 días	jue 14/9/23	jue 14/9/23	46
48	→	Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en Planos) (37.67 4 dias M2)	37.67 4 dias	jue 5/10/23	mar 17/10/23	43
49	→	Suministro e Instalacion de Puertas Enrollables (2 Ud de 4.30 x 4.00) con motor incluido	1.33 días	jue 14/9/23	vie 15/9/23	47CC
50	→	Suministro e Instalacion de Puertas Enrollables (2 Ud de 2.70 x 4.00)	1.33 días	jue 14/9/23	vie 15/9/23	49CC
51	→	PISOS				
52	→	Colocacion de Pisos (Porcelanato) 50*50	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
53	→	Localos en Piso	6.67 días	vie 1/9/23	jue 14/9/23	
54	→		2 días	vie 20/10/23	lun 30/10/23	53CC+0.67 dias

CC

Tel.: 829-649-1101

CONSTRUNOVE

RNC: 131-97886-8

Av. Winston Churchill 1104, 43

Evaristo Morales, Santo Domingo

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
55	→	PLAFOND EN TECHOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
56	→	Plafond pvc 2x2	3.33 días	mié 18/10/23	jue 2/11/23	43CC
57	→	PINTURA	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
58	→	Pintura Acrilica	2.67 días	jue 14/9/23	mar 19/9/23	46
59	→	Pintura Interior Semigloss	2.67 días	jue 19/10/23	mié 25/10/23	58CC
60	→					
61	→	AREA ADMINISTRATIVA	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
62	→					
63	→	MUROS LIGEROS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
64	→	Divisiones en Sheetrock	4 días	jue 7/9/23	lun 18/9/23	43
65	→	PUERTAS Y VENTANAS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
66	→	Puertas Polimetal Everdoor blanca	0.67 días	mar 19/9/23	mar 19/9/23	64
67	→	Puertas comercial en cristal doble	1.33 días	mar 19/9/23	mié 20/9/23	66CC
68	→	Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en Planos) (25.03 P2)	1.33 días	mié 20/9/23	jue 21/9/23	58
69	→					
70	→	PISOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
71	→	Colocacion de Pisos (Porcelanato) 50*50	4.67 días	lun 25/9/23	mar 3/10/23	64
72	→	Zocalos en Piso	2 días	lun 16/10/23	jue 26/10/23	71CC+0.67 días
73	→	PLAFOND EN TECHOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
74	→	Plafond PVC 2x2	2.67 días	mar 26/9/23	vie 29/9/23	64
75	→	PINTURA	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
76	→	Pintura Acrilica	2.67 días	mar 3/10/23	vie 6/10/23	74
77	→	Pintura Interior Semigloss	2.67 días	jue 12/10/23	mié 18/10/23	76CC
78	→					
79	→	AREA OBSERVATORIO PARTIDOS POLITICOS MEZANINE	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
80	→					
81	→	REFUERZO ESTRUCTURAL MEZANINE	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
82	→	Desmonte de Escalera metalica	0.67 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
83	→	Cambio de Direccion de Escalera y Construccion de Descanso	0.67 días	mié 9/8/23	mié 9/8/23	


CONSTRUNOVE
RNC-131-07386-8
 Av. Winston Churchill 1104,
 Evarito Morales, Santo Domingo

Tel.: 829-649-1101

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
84	→	Refuerzo de Mezanine Existente con Columnas Tipo H (W10X15), Vigas Tipo H(W8X15) y Perfiles Metalicos Tipo H(W8x15). Incluye Placas de fijacion PL15¾X20X1, Pernos ½A307X10" de Anclajes, materiales Varios, Uso de Grua y Mano de Obra(Incluye: soldadura, dis	5.33 días	jue 10/8/23	lun 21/8/23	83CC+0.67 días
85	→	Pañete en Nave	4 días	mar 8/8/23	mar 15/8/23	82CC
86	→					
87	→					
88	→	PLATAFORMA PARA PISO	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	82CC
89	→	Desmonte madera Plywood 1/2	2 días	jue 17/8/23	lun 21/8/23	82CC
90	→	Instalacion Madera Plywood 3/4	2 días	mar 22/8/23	jue 24/8/23	89CC+0.67 días
91	→	MUROS LIGEROS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	90CC
92	→	Divisiones en Sheetrock	2.67 días	1/9/23	jue 21/9/23	90CC
93	→	PISOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	92
94	→	Colocacion de Pisos laminado	3.33 días	22/9/23	jue 28/9/23	94CC+0.67 días
95	→	Zocalos en Piso	1.33 días	26/10/23	vie 27/10/23	92
96	→	PLAFOND EN TECHOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	92
97	→	Plafond Mineral Fisurado 2x2	4.67 días	23/10/23	mar 31/10/23	92
98	→	PINTURA	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	92
99	→	Pintura Acrilica Base	1.33 días	13/10/23	vie 20/10/23	92
100	→	Pintura Exterior (Según muestra)	0.67 días	11/10/23	mié 11/10/23	92
101	→	Pintura Interior Semiglos (Según muestra)	1.33 días	9/10/23	mar 10/10/23	92
102	→	PUERTAS Y VENTANAS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	94CC+1.33 días
103	→	Puertas comercial en cristal	0.67 días	26/9/23	mar 26/9/23	103CC
104	→	Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en Planos) (25.03 P2)	4 días	mar 26/9/23	mar 3/10/23	
105	→	AREA BAÑOS NUEVOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
106	→	MOVIMIENTO DE TIERRA	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
107	→	Demolicion con Compresor Piso Hormigon Para Zapata de Muro	1.33 días	mar 29/8/23	jue 31/8/23	
108	→	Excavacion Zapata muros de 6'	0.67 días	31/8/23	vie 1/9/23	
109	→	Excavacion Zapata de Columnas	0.67 días	1/9/23	lun 4/9/23	
110	→					



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
111	→	Relleno Compactado de reposicion	0.67	di.lun 4/9/23	mar 5/9/23	110
112	→	Bote de materiales	0.67	di.lun 4/9/23	mar 5/9/23	111CC
113	→	HORMIGON ARMADO EN:	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
114	→	Zapata de muros 6''	1.33	di.vie 1/9/23	mar 5/9/23	109
115	→	Zapata Columnas	0.67	di.mar 5/9/23	mié 6/9/23	114CC
116	→	Columnas Amarre	0.67	di.mié 6/9/23	jue 7/9/23	115
117	→	Viga de Amarre	0.67	di.jue 7/9/23	vie 8/9/23	114
118	→	Dinteles	0.67	di.mié 13/9/23	jue 14/9/23	117CC
119	→	Losa de techo	2 días	jue 14/9/23	mar 19/9/23	118
120	→	MUROS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
121	→	muros de 6' B.N.P	2 días	mié 13/9/23	mar 26/9/23	114
122	→	muros de 6' S.N.P	1.83	di.mar 26/9/23	jue 26/10/23	121
123	→	TERMINACION DE SUPERFICIE (MUROS)	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
124	→	Fraguache en Vigasy Columnas	0.67	di.mié 20/9/23	jue 21/9/23	116
125	→	Pañete exterior de baños	1.33	di.jue 28/9/23	mié 4/10/23	124
126	→	Resane	0.67	di.lun 30/10/23	mié 1/11/23	125CC
127	→	Mochetas	1.33	di.vie 29/9/23	mar 10/10/23	125CC
128	→	Cantos	1.33	di.lun 2/10/23	mar 17/10/23	127CC+0.67 días
129	→	PISOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
130	→	Reposicion piso pulido area de muro nuevo	0.67	di.mar 10/10/23	mié 11/10/23	127
131	→	PISOS Y REVESTIMIENTOS EN BAÑOS NUEVOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
132	→	Porcelanato en Piso de Baños Nuevos	2 días	mar 3/10/23	vie 6/10/23	128CC+0.67 días
133	→	Ceramica Alto Transito en Piso Exterior	0.67	di.lun 9/10/23	lun 9/10/23	132CC
134	→	PISOS HORMIGON	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
135	→	Hormigon en Rampas Impedidos Fisicos	0.67	di.lun 18/9/23	mar 19/9/23	117
136	→	REVESTIMIENTO DE PARED	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
137	→	Ceramica en Pared de Baños Nuevos 40x25	2.67	di.mié 4/10/23	mar 17/10/23	135
138	→	TOPES PARA LAVAMANOS EMPOTRABLE	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
139	→	Tope de granito baño hombres	0.67	di.mié 4/10/23	mié 4/10/23	135CC
140	→	Tope de granito baños mujeres	0.67	di.mié 4/10/23	mié 4/10/23	135CC
141	→	PUERTAS Y VENTANAS INDUSTRIALES	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
142	→	Ventanas Corredoras (Aluminio y Cristal Claro)	1.33	di.mar 17/10/23	jue 19/10/23	
143	→	Puertas Polimetal Everdoor	0.67	di.mar 17/10/23	mié 18/10/23	
144	→	DIVISIONES PVC EN BAÑOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
145	→	Puertas en Baños 0.70 x 1.60 m2	0.67	di,mar 17/10/23	mié 18/10/23	143CC
146	→	Divisiones en Baños	4.67	di,jue 5/10/23	vie 13/10/23	139
147	→	INSTALACION SANITARIA	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
148	→	Excavacion Drenaje	0.67	di,mié 20/9/23	mié 20/9/23	109
149	→	Tuberias y Piezas de Drenaje Sanitario y de Agua Potable	0.92	jue 21/9/23	vie 22/9/23	148
			días			
150	→	Ventilacion	0.92	di,jue 28/9/23	vie 29/9/23	149
151	→	Camara de Inspeccion	0.92	di,mié 4/10/23	lun 23/10/23	148CC
152	→	Desague de Piso	0.67	di,vie 22/9/23	lun 25/9/23	149
153	→	Correccion en Desague de Techo y Canaletas	1.83	di,lun 25/9/23	jue 28/9/23	152
154	→	Pozo Filtrante (1 Tubo DE 12*19')	0.92	di,lun 9/10/23	mar 10/10/23	151CC
155	→	Cisterna 4,000 Gls. Tierra.	3.67	di,vie 22/9/23	mié 25/10/23	149CC
156	→	Bomba de 2 HP. (Mayer)	0.67	di,vie 22/9/23	vie 22/9/23	155CC
157	→	Tanque Hidroneumatico 60 GLS	0.67	di,vie 22/9/23	vie 22/9/23	156CC
158	→	Camara Septica	1.33	di,jue 5/10/23	lun 9/10/23	151CC+0.67 días
159	→	Lavamanos Blanco Empotrable	0.67	di,lun 2/10/23	lun 2/10/23	149CC
160	→	Lavamanos Blanco de Pedestal	0.67	di,mar 3/10/23	mar 3/10/23	159CC
161	→	Inodoros	0.67	di,mié 4/10/23	mié 4/10/23	160CC
162	→	Orinales Falda Completa,Blco. con Fluxometro Temporizado	0.67	jue 5/10/23	jue 5/10/23	161CC
			días			
163	→	Dosificador Jabon Liq. De Primera Calidad	0.67	di,jue 5/10/23	jue 5/10/23	162CC
164	→	Dispensador Papel para inodoros	0.67	di,jue 5/10/23	jue 5/10/23	163CC
165	→	Porta Servilletas para lavamanos	0.67	di,jue 5/10/23	jue 5/10/23	164CC
166	→	Secamanos de Primera Calidad	0.67	di,jue 5/10/23	jue 5/10/23	165CC
167	→	Barra de Seguridad Inox. 0.60 CMS.	0.67	di,jue 5/10/23	jue 5/10/23	166CC
168	→	M/O de Plomeria	0.67	di,vie 6/10/23	vie 6/10/23	
169	→					
170	→	AREA BAÑOS EXISTENTE	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
171	→	TRABAJOS VARIOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
172	→	Desmonte de aparatos sanitarios	0.67	di,mar 22/8/23	mar 22/8/23	
173	→	Revision sistema sanitarios	0.67	di,mar 5/9/23	mar 5/9/23	
174	→	Bote de materiales	0.67	di,mar 22/8/23	mar 22/8/23	
175	→	PISOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
176	→	Ceramica de Piso alto Transito en Baños Existente	1.33	di,mié 23/8/23	jue 24/8/23	172



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
177	→	PISOS HORMIGON	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
178	→	Hormigon en Rampas Impedidos Fisicos	0.67 días	mié 23/8/23	mié 23/8/23	174
179	→	REVESTIMIENTO DE PARED	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
180	→	Ceramica en Pared de Baños Existentes 40x25 Blanca	1.33 días	vie 25/8/23	lun 28/8/23	176CC
181	→	PINTURA	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
182	→	Pintura Acrilica	1.33 días	mar 29/8/23	mié 30/8/23	180
183	→	Pintura Interior Semiglos (Según muestra)	1.33 días	lun 4/9/23	mar 5/9/23	182CC
184	→	TOPES PARA LAVAMANOS EMPOTRABLE	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
185	→	Tope de granito baño hombres	0.67 días	vie 25/8/23	vie 25/8/23	180CC
186	→	Tope de granito baños mujeres	0.67 días	vie 25/8/23	vie 25/8/23	185CC
187	→	PUERTAS Y VENTANAS INDUSTRIALES	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
188	→	Ventanas Correderas (Aluminio y Cristal Claro)	0.67 días	vie 25/8/23	vie 25/8/23	186CC
189	→	Puertas Polimetal Everdoor	0.67 días	vie 25/8/23	vie 25/8/23	188CC
190	→	DIVISIONES PVC EN BAÑOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
191	→	Puertas en Baños 0.70 x 1.60 m2	0.67 días	vie 25/8/23	vie 25/8/23	189CC
192	→	Divisiones en Baños	0.67 días	vie 25/8/23	vie 25/8/23	191CC
193	→	INSTALACION SANITARIA	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
194	→	Excavacion Drenaje	1.33 días	mié 23/8/23	jue 24/8/23	172
195	→	Tuberias y Piezas de Drenaje Sanitario y de Agua Potable	0.67 días	lun 28/8/23	lun 28/8/23	172
196	→	Desague de Piso	0.67 días	mié 30/8/23	mié 30/8/23	172
197	→	Bomba de 2 HP. (Mayer)	0.67 días	jue 31/8/23	jue 31/8/23	172
198	→	Tanque Hidroneumatico 60 GLS	0.67 días	mié 23/8/23	mié 23/8/23	172
199	→	Camara Septica	1.33 días	jue 24/8/23	vie 25/8/23	198
200	→	Lavamanos Blanco Empotrable	0.67 días	mié 6/9/23	mié 6/9/23	198
201	→	Lavamanos Blanco de Pedestal	0.67 días	jue 7/9/23	jue 7/9/23	198
202	→	Inodoros	1.33 días	vie 1/9/23	lun 4/9/23	198
203	→	Orinales Falda Completa,Blco. con Fluxometro Temporizado	0.67 días	vie 8/9/23	vie 8/9/23	198
204	→	Dosificador Jabon Liquido	0.67 días	jue 24/8/23	jue 24/8/23	198
205	→	Dispensador Papel para inodoros	0.67 días	jue 24/8/23	jue 24/8/23	198
206	→	Porta Servilletas para lavamanos	0.67 días	jue 24/8/23	jue 24/8/23	198
207	→	Secamanos de Primera Calidad	0.67 días	jue 24/8/23	jue 24/8/23	198
208	→	Barra de Seguridad Inox. 0.60 CMS.	0.67 días	jue 24/8/23	jue 24/8/23	198



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
209	→	M/O de Plomeria	0.67 días	mar 29/8/23	mar 29/8/23	198
210	→	MICELANEOS	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
211	→	LIMPIEZA FINAL	0.67 días	vie 3/11/23	vie 3/11/23	202CC
212	→					
213	→					
214	→	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ELECTROMECANICAS NAVE PARAISO (AREA DE ADMINISTRACION Y AREA INSTALACION ILUMINACION, TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE RED, SALIDA CETINAL	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
215	→					
216	→	Lamparas led 2x2 tipo Plafond, 40 Watts,6500K, Luz Blanca, 2 días duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltsios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, incluye conductor de goma 14/2 AWG,	2 días	mar 26/9/23	jue 28/9/23	74CC
217	→	Luminaria led de pared (aplique), 6 watts,5500K.duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltsios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, incluye conductor de goma 14/2 AWG,	0.67 días	mar 24/10/23	mar 24/10/23	216CC
218	→	Lampara Ojo de buey 12 Watts,duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltsios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, incluye conductor de goma 14/2 AWG, montaje en Pared, tuberia Emt desde altura techo hasta inicio Al	0.67 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	216CC
219	→	Interruptor 3W,20A, 120V, Polarizado con punto de Tierra, en tuberia EMT, USA, UL.	0.67 días	lun 23/10/23	lun 23/10/23	
220	→	Interruptor sencillo,20A, 120V.Polarizado con punto de Tierra, en tuberia EMT, USA, UL.	2 días	lun 2/10/23	mié 4/10/23	
221	→	Tomacorriente 20A, 120V. Polarizado con punto de Tierra, en tuberia EMT, USA, UL.	5.33 días	mié 25/10/23	vie 3/11/23	
222	→	Puntos de Red (solo canalizacion), en tuberia de 3/4" EMT, USA, UL.	5.33 días	jue 5/10/23	lun 16/10/23	



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
223	→	Suministro e instalacion Tuberias de adecuacion Lamparas de Plafond, tuberias EMT de 1/2" UL, USA	0.67 días	mar 17/10/23	mar 17/10/23	220
224	→	Suninistro e Instalacion de Tuberia para canalizacion , Alimentacion Circuitos Tomacorriente.en tuberias EMT de 1/2" UL, US.	0.67 días	mié 18/10/23	mié 18/10/23	220
225	→	Suninistro e Instalacion de canalizacion , Alimentacion principal puntos de Red. En Escalera 300mmX 100 mm X 3048mm, Registros 4X4 Metalico ULS, USA, Registro Metalico 2x4, USA, UL.	0.67 días	jue 19/10/23	jue 19/10/23	220
226	→					
227	→	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE NAVE PARAISO LINEA DE PRODUCCION, VALLJAS, PRODUCCION PAQUETES BOLETAS, PRODUCCION EMPAQUES	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
228	→	Suministro e Instalacion de Lamparas en tecnologia Led, Circular tipo Campana, 100 Watts, duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, incluye conductor de goma 14/2 AWG, Suje	2 días	mar 19/9/23	jue 21/9/23	239
229	→	Suministro e insatlacion de dos Tomacorriente, 120Voltios, 20 Amperes, Polarizado, en caja cuadrada para dos tomas, con tapa, identificacion de circuito con etiqueta.Tuberia EMT 3/4"	2 días	lun 25/9/23	mié 27/9/23	228CC
230	→	Interruptror triple, 20A, 120V, En tuberia EMT de 3/4" USA, UL.	0.67 días	jue 28/9/23	jue 28/9/23	229
231	→	Interruptror doble, 20A, 120V, En tuberia EMT de 3/4" USA, UL.	0.67 días	vie 29/9/23	vie 29/9/23	230CC
232	→	Interruptror sencillo,20A, 120V, En tuberia EMT de 3/4" USA, UL.	0.67 días	lun 2/10/23	lun 2/10/23	231CC
233	→	Suministro e Instalacion de Canalizacion Rejillas 50mmX 20mm X 3048mm, Accesorio de curva y empalme, todos elementos y rejillas, certification USA, UL.	0.67 días	mar 3/10/23	mar 3/10/23	232CC



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
234	→	Suministro e Instalacion Canalizacion para circuitos de instalaciones electricas Rejillas 30mmX 20mm X 3048mm. Accesorio de curva y empalme, todos elementos y rejillas, certificación USA, UL.	1.33 días	mié 4/10/23	jue 5/10/23	233
235	→	Suministro e instalacion de Canalizacion para circuitos de instalaciones cableado estructurado 30mmX 20mm X 3048mm	2.67 días	lun 9/10/23	jue 12/10/23	234CC
236	→	Suministro e Instalacion de puntos de Red de datos cableado estructurado, tuberia EMT de 3/4" Caja 2x4 Metalica UL, USA, KO 3/4" Sondeada desde Punto hasta Rejilla de cableado, solo canalizacion.	1.33 días	lun 16/10/23	mar 17/10/23	235CC
237	→					
238	→	SISTEMA DE POTENCIA, NAVE PARAISO LINEA DE PRODUCCION, VALIJAS, PRODUCCION PAQUETES BOLETAS, PRODUCCION EMPAQUES	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
239	→	Alimentacion de electrica de potencia panel POA 3 Conductores # 4 THHN Fase 1 Conductor # 6 THHN Neutro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado	0.67 días	lun 18/9/23	lun 18/9/23	50
240	→	Alimentacion de electrica de potencia panel PL1 3 Conductores # 2 THHN Fase 1 Conductor # 4 THHN Neutro 1 Conductor # 6 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado	0.67 días	lun 25/9/23	lun 25/9/23	50
241	→	Alimentacion de electrica de potencia panel PL2 3 Conductores # 2 THHN Fase 1 Conductor # 4 THHN Neutro 1 Conductor # 6 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado	0.67 días	mar 26/9/23	mar 26/9/23	



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
242	→	Alimentación de eléctrica de potencia panel PAAR 3 Conductores # 4 THHN Fase 1 Conductor # 6 THHN Neutro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado	0.67 días	mié 27/9/23	mié 27/9/23	50
243	→	Alimentación de eléctrica de potencia panel POA 3 Conductores # 4 THHN Fase 1 Conductor # 6 THHN Neutro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado	0.67 días	vie 29/9/23	vie 29/9/23	50
244	→	Dispositivos de potencia Panel board y Panel de Distribucion Panel Board Barra 400 Amperes, 3 Polos, en Cobre Main breaker 400 Amperes 3(tres) Breakers 100 amperes 3 Polos 2(dos) Breakers 80 Amperes 3 Polos 1(uno) Breaker 80 Amperes 3 Polos Dos Espacios D	0.67 días	lun 2/10/23	lun 2/10/23	50
245	→	Alimentación de eléctrica de potencia panel board Oficinas administrativas y depositos de materiales. 6 Conductores # 3/0 THHN Fase 3 Conductor # 1/0 THHN Neutro 3 Conductor # 2 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura	0.67 días	mar 19/9/23	mar 19/9/23	50
246	→	Sistema de tierra para aterrizaje Columnas existentes, Rejillas y dispositivos de potencia	0.67 días	mié 20/9/23	mié 20/9/23	245
247	→					
248	→	Partidas Presupuestarias Electromecanicas (Area de operaciones)	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
249	→	CLIMATIZACION	0 días	mar 8/8/23	mar 8/8/23	
250	→	Suministro e instalacion de unidad de acondicionador de aire de tipo manejadora de 5 ton inverter eficiencia minima 18 en áreas administrativas, incluye acondicionador de aire tipo manejadora de tiro vertical con sepeitin de cobre, soporteria a estructu	3.33 días	mar 19/9/23	mié 27/9/23	


Tel.: 829-649-1101




CONSTRUNOVE
RNC: 1-31-97386-8
Av. Winston Churchill 1104,
Evarito Morales, Santo Domingo

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
251	→	Suministro e instalacion de unidad de acondicionador de aire 3.33 de tipo power cassette de 2 ton inverter eficiencia minima 18 dias en areas administrativas, incluye acondicionador de aire tipo power cassette de tiro vertical con serpentin de cobre, soporteria a est	3.33	vie 27/10/23	jue 2/11/23	250
252	→	Suministro e instalacion de unidad de acondicionador de aire 0.92 de tipo power cassette de 1.5 ton inverter eficiencia minima 18 dias en areas administrativas, incluye acondicionador de aire tipo power cassette de tiro vertical con serpentin de cobre, soporteria a e	0.92	vie 3/11/23	lun 6/11/23	250
253	→	Pies de tubenira de cobre rigidad de 5/8 y 3/8, con insulacion 1.33 en vascocel, incluye piezas de acople, soldadura, soporteria, mano de obra y todo lo nesesario para su instalacion.	1.33	jue 28/9/23	vie 29/9/23	250
254	→	Pies de tubenira de cobre rigidad de 7/8 y 3/8, con insulacion 2 dias en vascocel, incluye piezas de acople, soldadura, soporteria, mano de obra y todo lo nesesario para su instalacion.	2 dias	jue 5/10/23	lun 9/10/23	250
255	→	Suministro e instalacion de base de para unidades consadoras	0.67 dias	mar 10/10/23	mar 10/10/23	250
256	→	Ducto en Poliuretano, similar a P3, incluye soportes gancho garfiados, acoples, cemento para poliuretano, ductape y todo lo necesario para su funcionamiento.	6.67 dias	lun 2/10/23	mar 24/10/23	250
257	→	Suministro e instalacion de Regilla de suministro 12X12	1.33	mié 4/10/23	mié 25/10/23	250
258	→	Suministro e instalacion de Regilla de retorno 22X22	0.67	jue 12/10/23	jue 12/10/23	250
259	→	Suministro e instalacion de regilla cuadriculada para BisPass de retornos	1.33 dias	mar 3/10/23	jue 26/10/23	250
260	→	Base para condensadores	0.67 dias	jue 28/9/23	jue 28/9/23	250



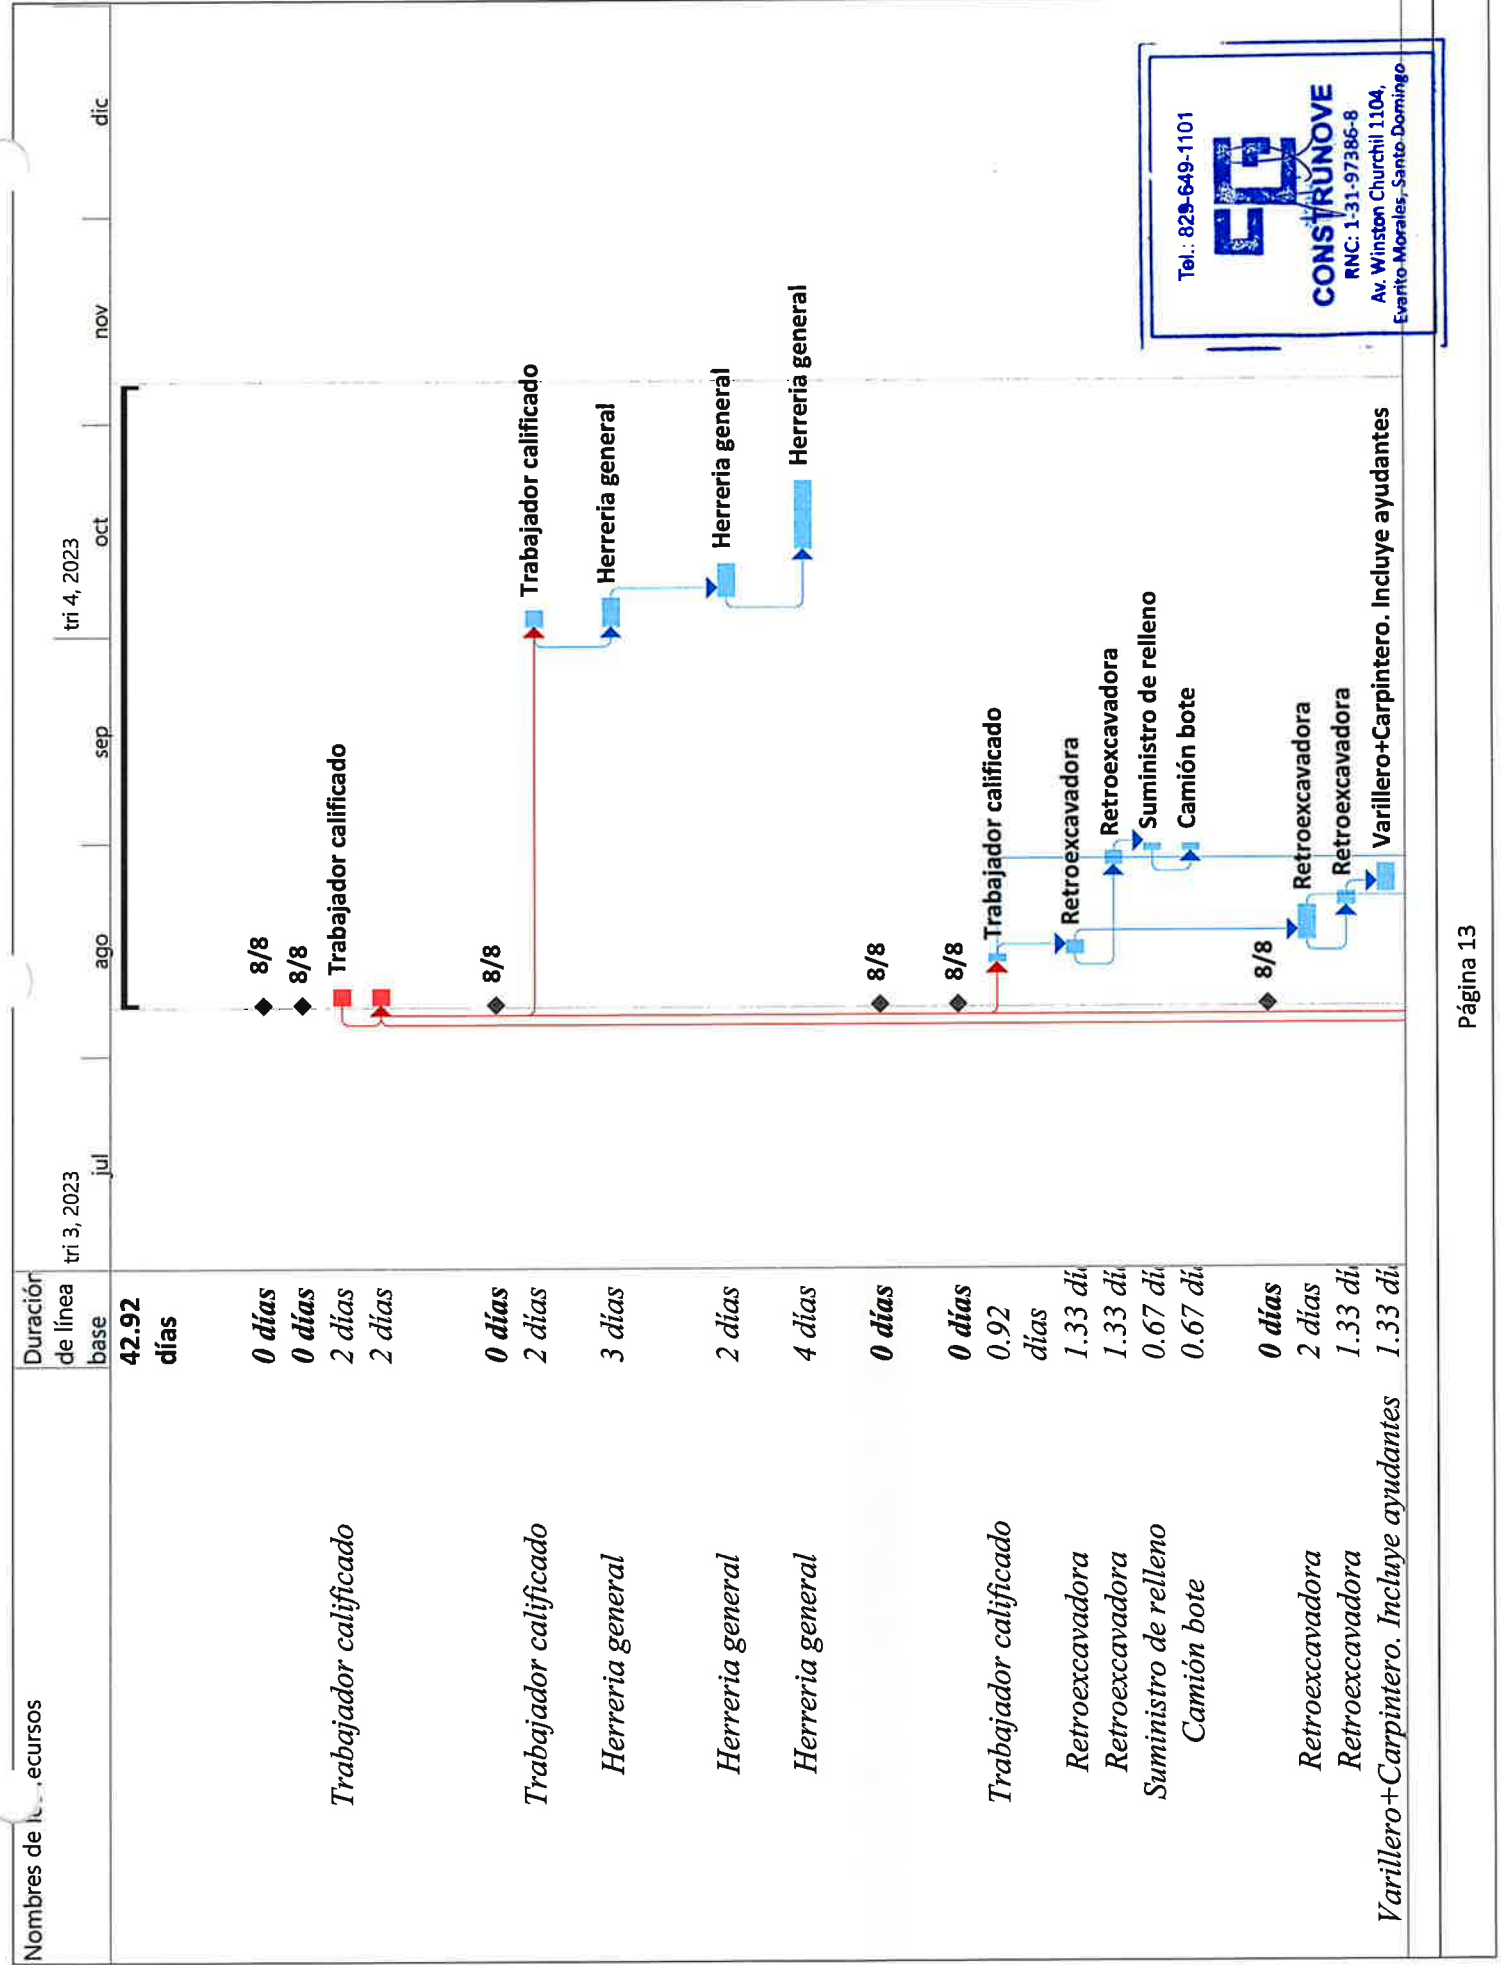



CONSTRUNOVE
 RNC: 1-31-97386-8
 Av. Winston Churchill 1104,
 Everito Morales, Santo Domingo
 Tel.: 829-649-1101

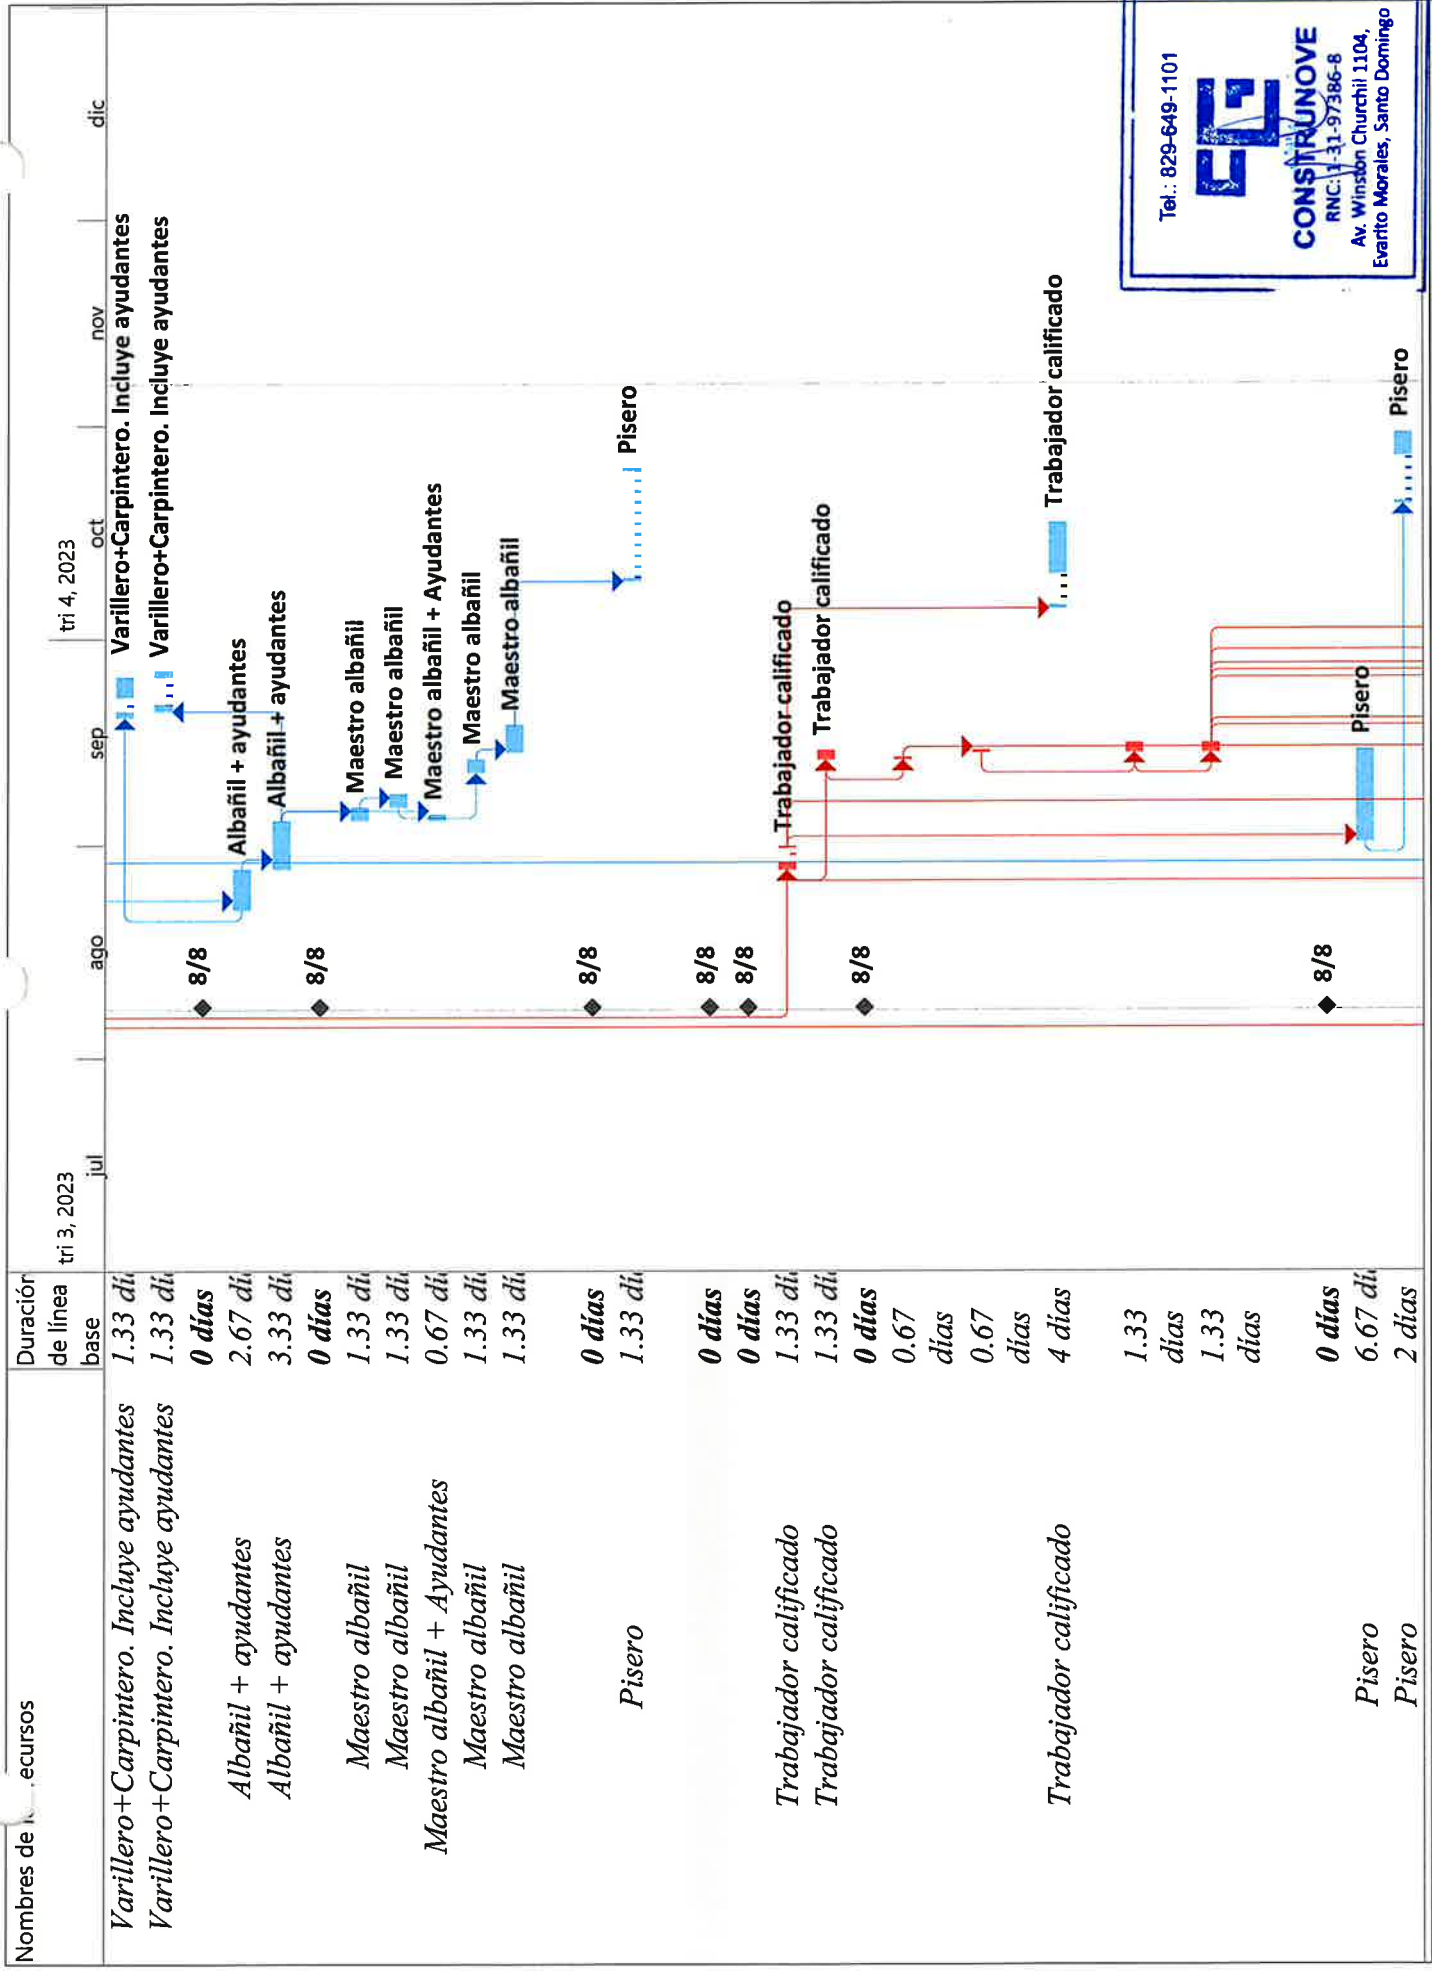


Tel.: 829-649-1101



CONSTRUNOVE
 RNC: 1-31-97386-8
 Av. Winston Churchill 1104,
 Evarito Morales, Santo Domingo

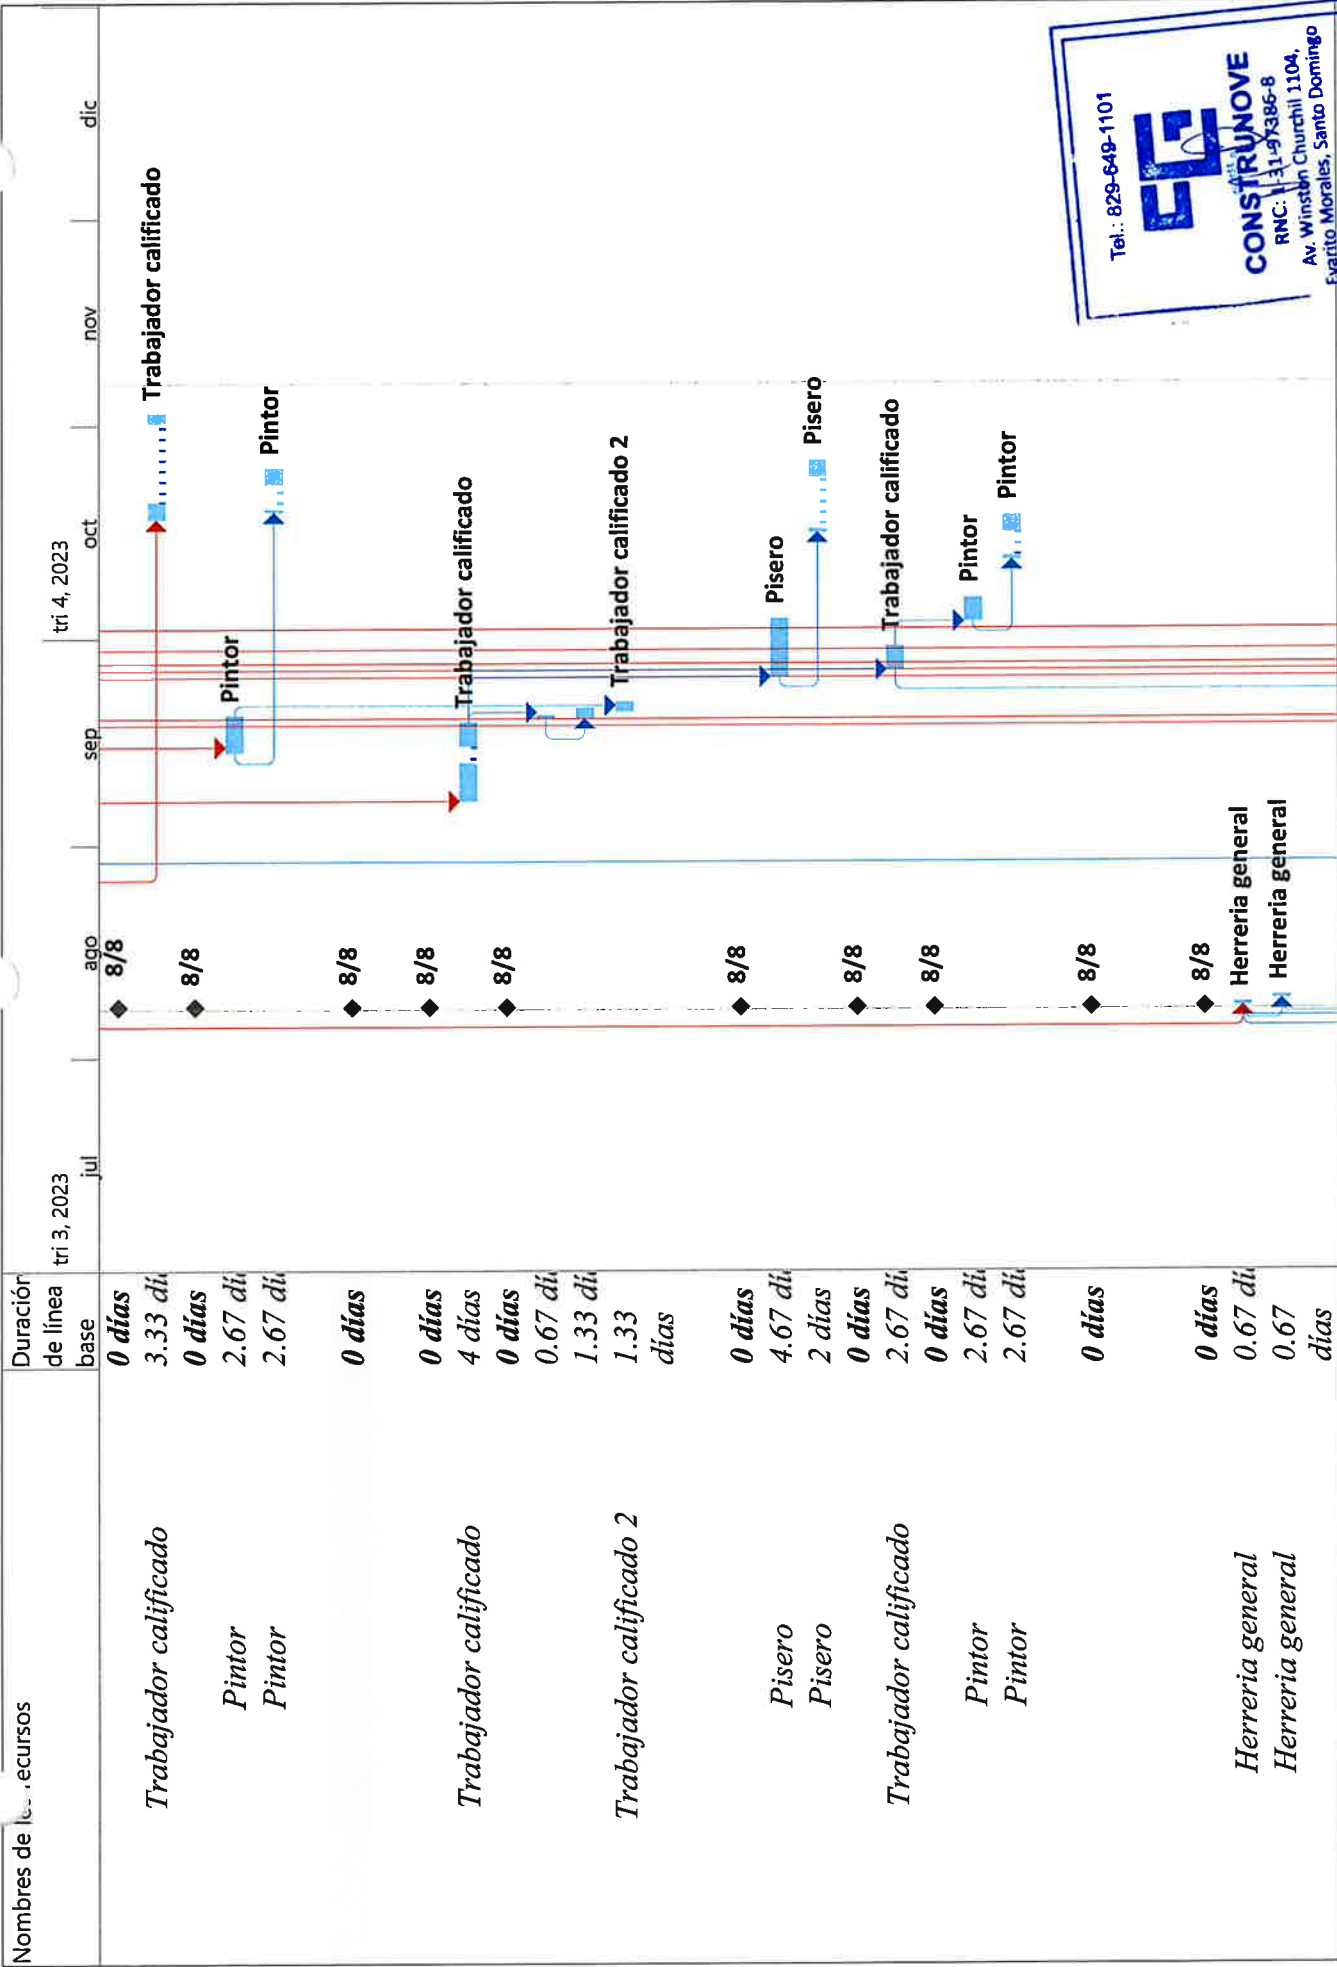

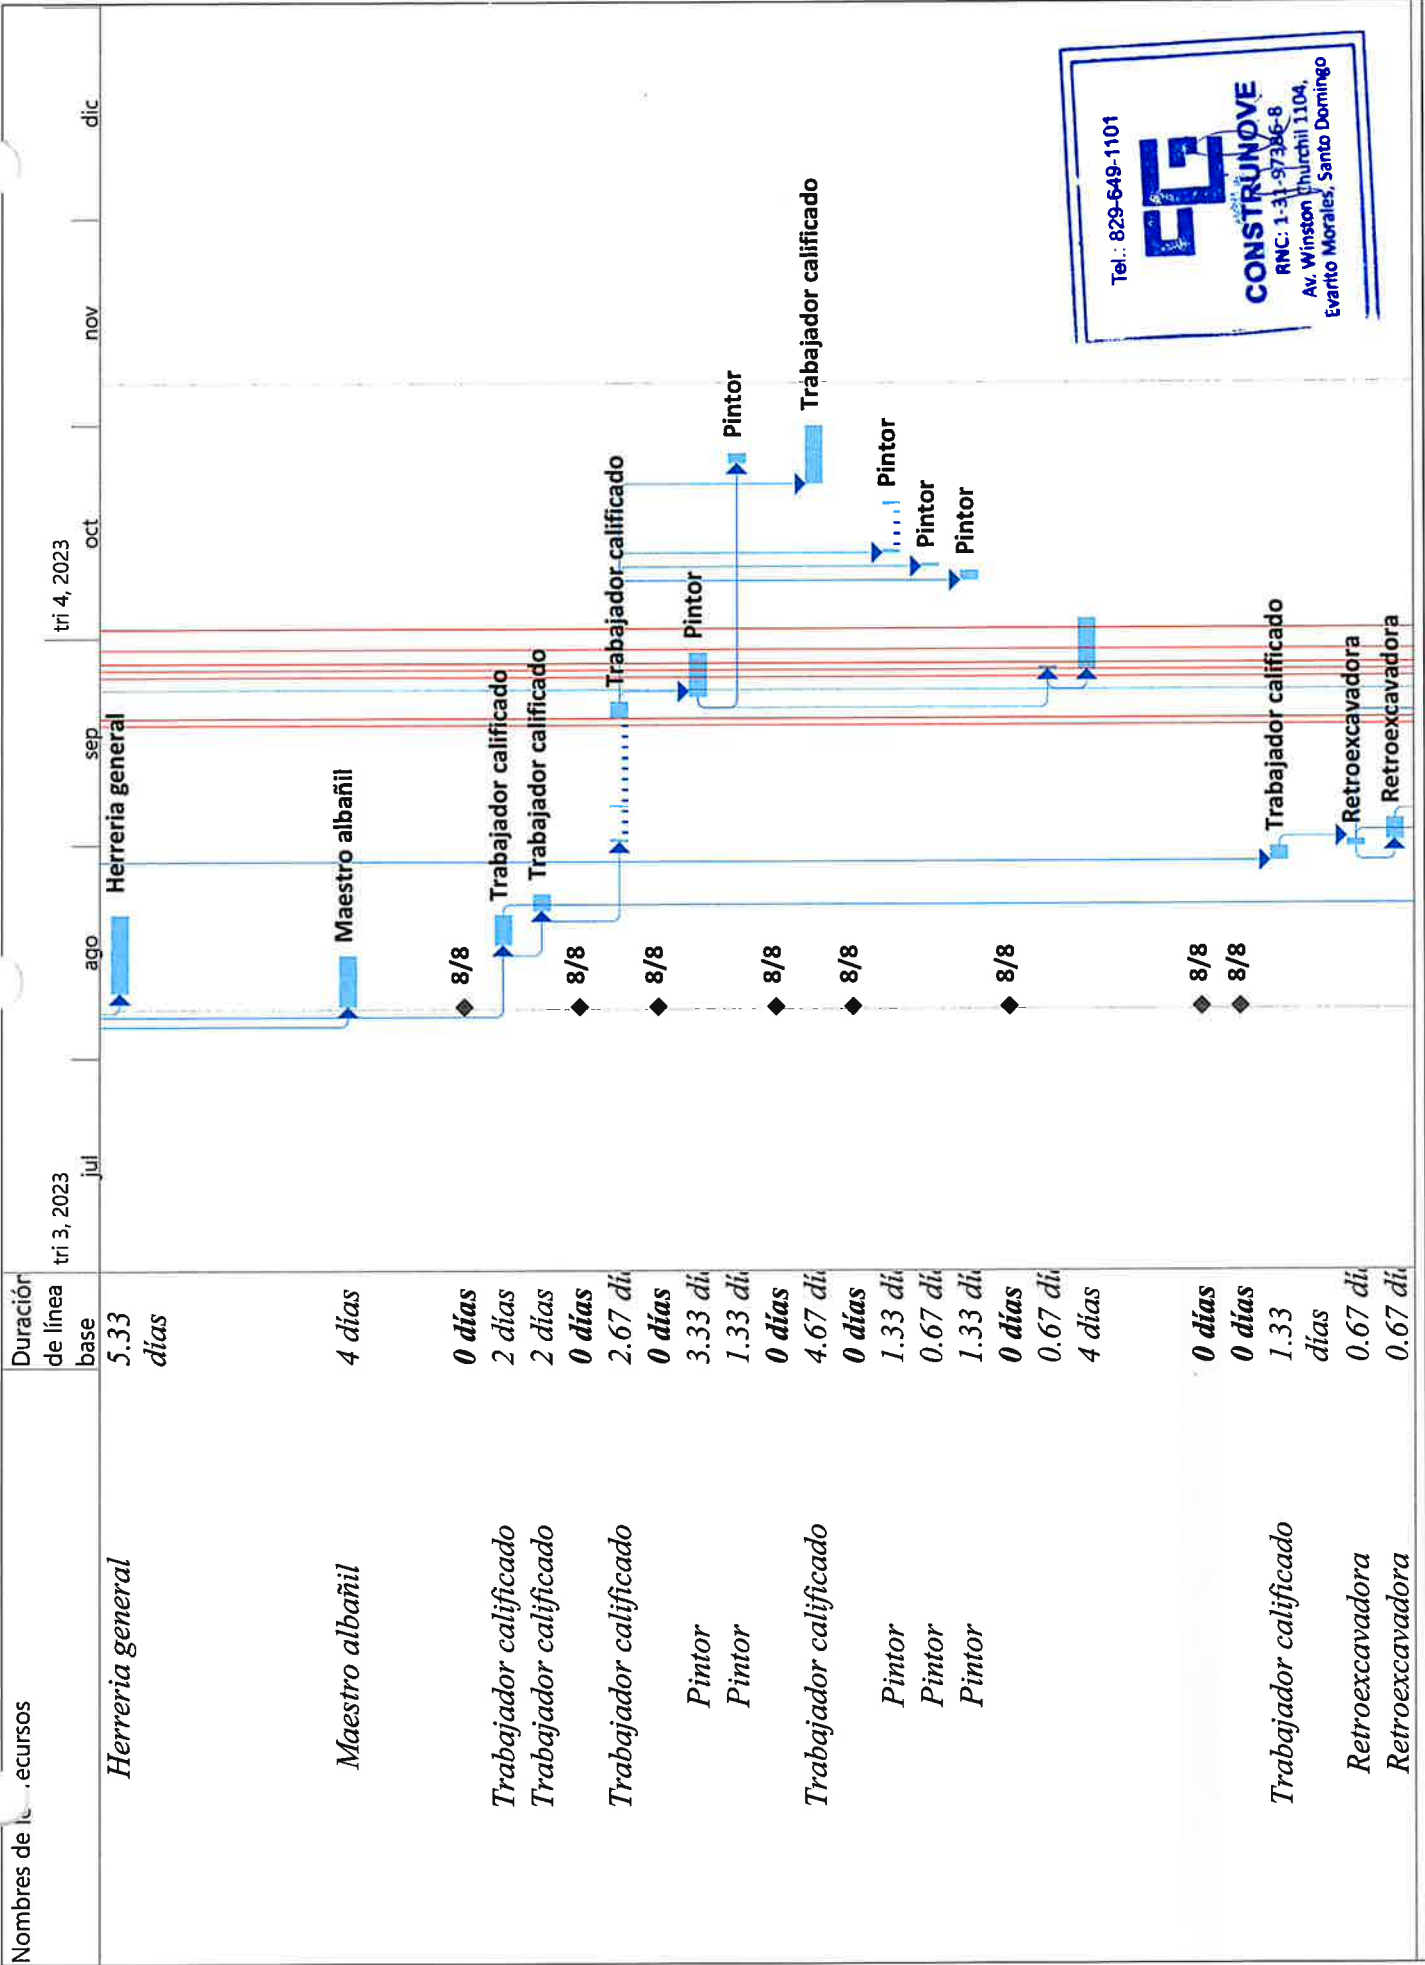


Nombres de los recursos	Duración de línea base	jul			ago			sep			oct			nov			dic		
		tri 3, 2023																	
Suministro de relleno	0.67 días																		
Camión bote	0.67 días																		
	0 días																		
Varillero+Carpintero. Incluye ayudantes	1.33 días																		
Varillero+Carpintero. Incluye ayudantes	0.67 días																		
Varillero+Carpintero. Incluye ayudantes	0.67 días																		
Varillero+Carpintero. Incluye ayudantes	0.67 días																		
Varillero+Carpintero. Incluye ayudantes	0.67 días																		
Varillero+Carpintero. Incluye ayudantes	0.67 días																		
Varillero+Carpintero. Incluye ayudantes	2 días																		
	0 días																		
Maestro albañil	2 días																		
Maestro albañil	1.83 días																		
	0 días																		
Maestro albañil	0.67 días																		
Maestro albañil	1.33 días																		
Maestro albañil	0.67 días																		
Maestro albañil	1.33 días																		
Maestro albañil	1.33 días																		
	0 días																		
Pisero	0.67 días																		
Pisero	0 días																		
Pisero	2 días																		
Pisero	0.67 días																		
	0 días																		
Maestro albañil	0.67 días																		
	0 días																		
Pisero	2.67 días																		
	0 días																		
Pisero	0.67 días																		
	0.67 días																		
	0 días																		
	1.33 días																		
	0.67 días																		
	0 días																		
	1.33 días																		
	0.67 días																		
	0 días																		


Tel.: 829-649-1101



CONSTRUNOVE
RNC: 1-31-97386-8
Av. Winston Churchill 1104,
Esposito Morales, Santo Domingo

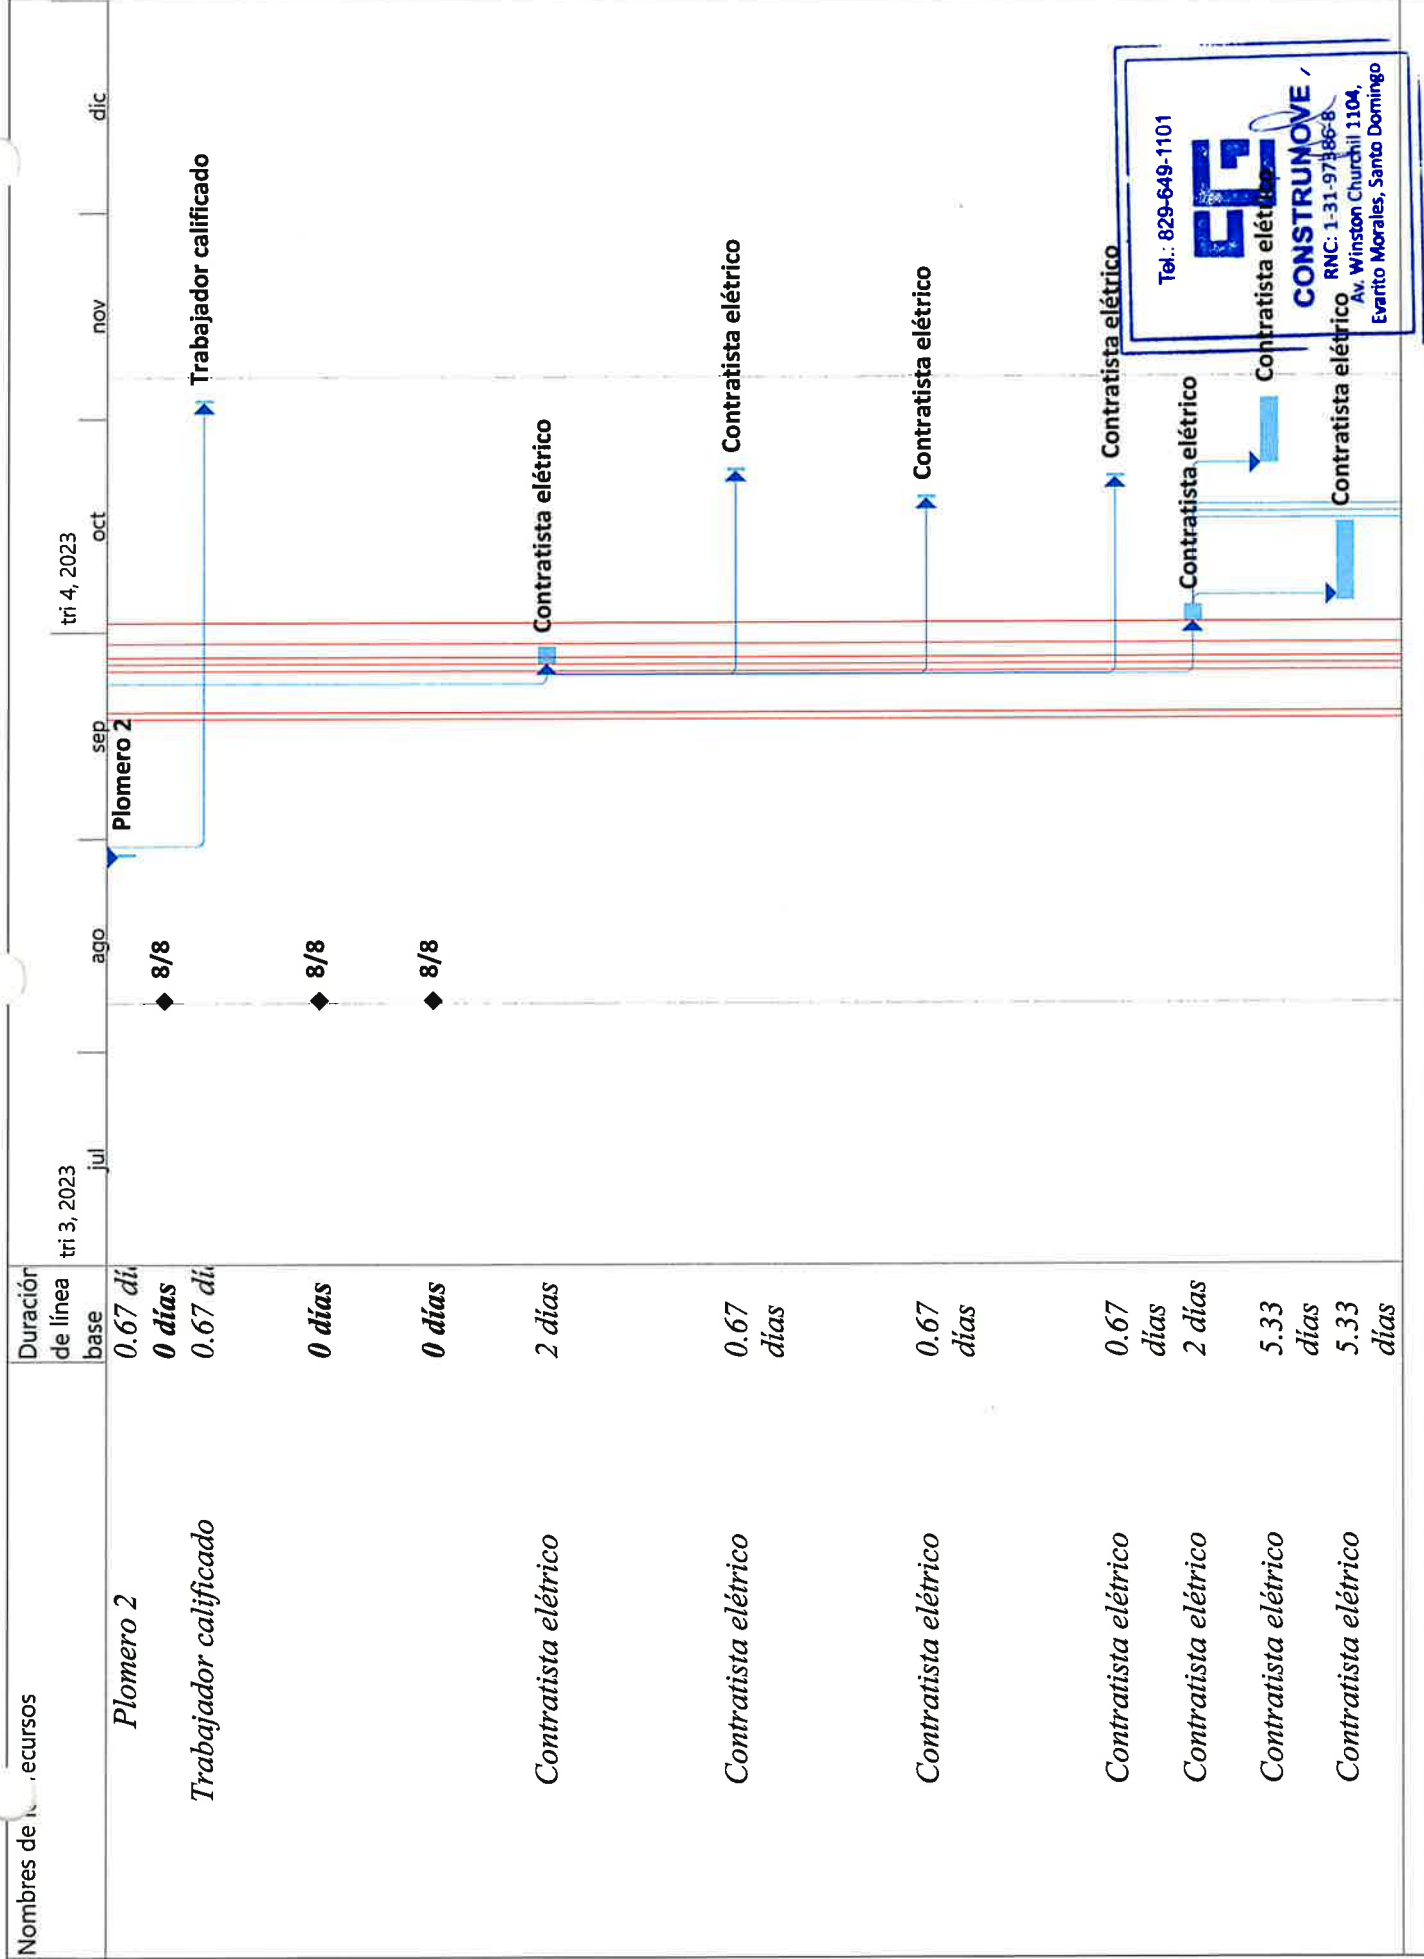



 Tel.: 829-649-1101
CONSTRUNOVE
 Contratista eléctrico
 RNC: 1-31-97486-8
 Av. Winston Churchill 1104,
 Esmerito Morales, Santo Domingo

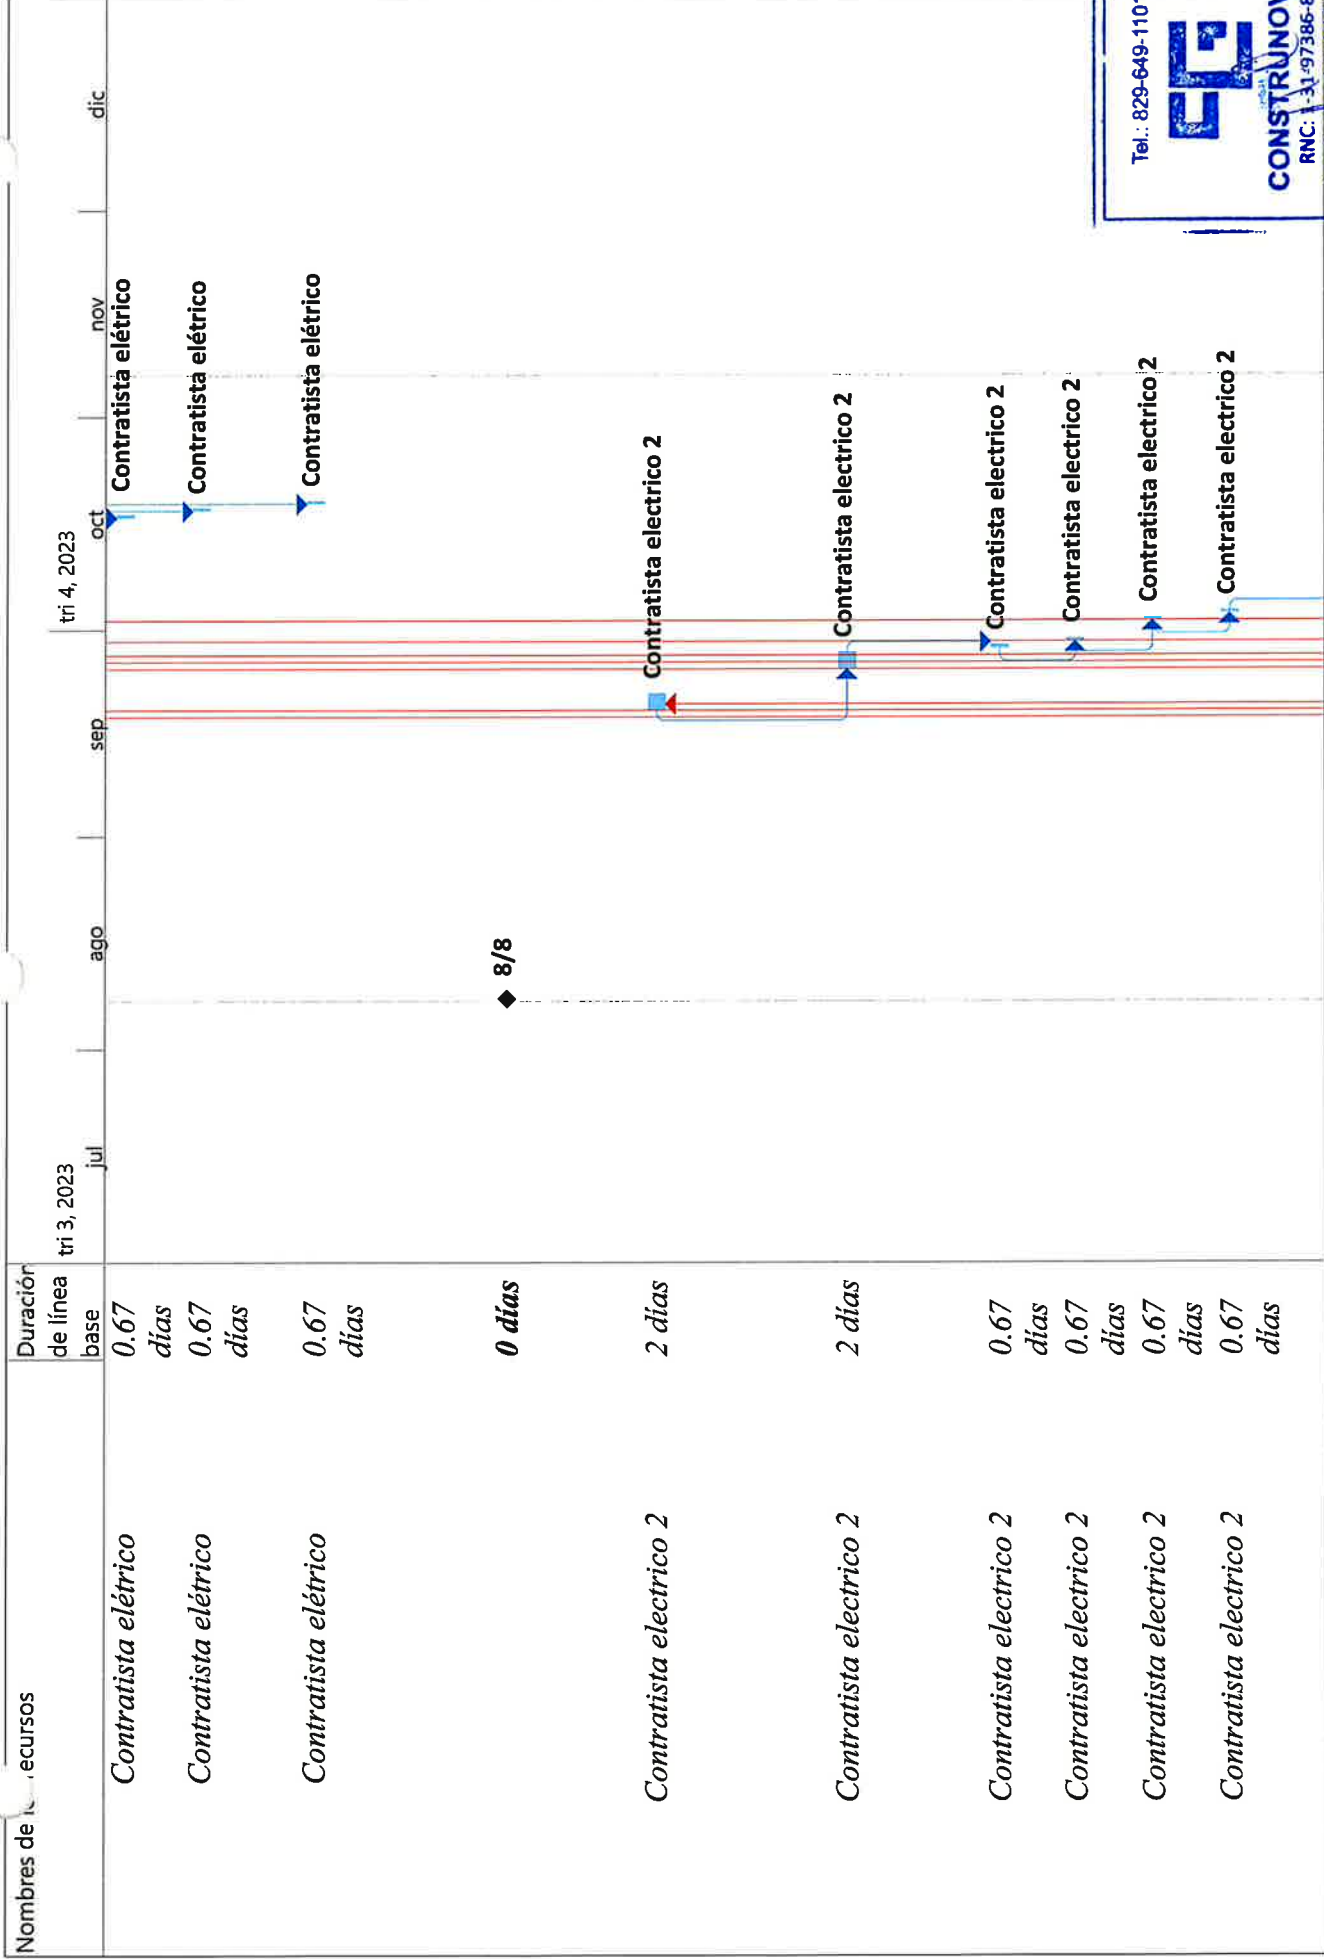


Tel.: 829-649-1101



CONSTRUNOVE
RNC: 1-31-97386-8
Av. Winston Churchill 1104,
Evarito Morales, Santo Domingo

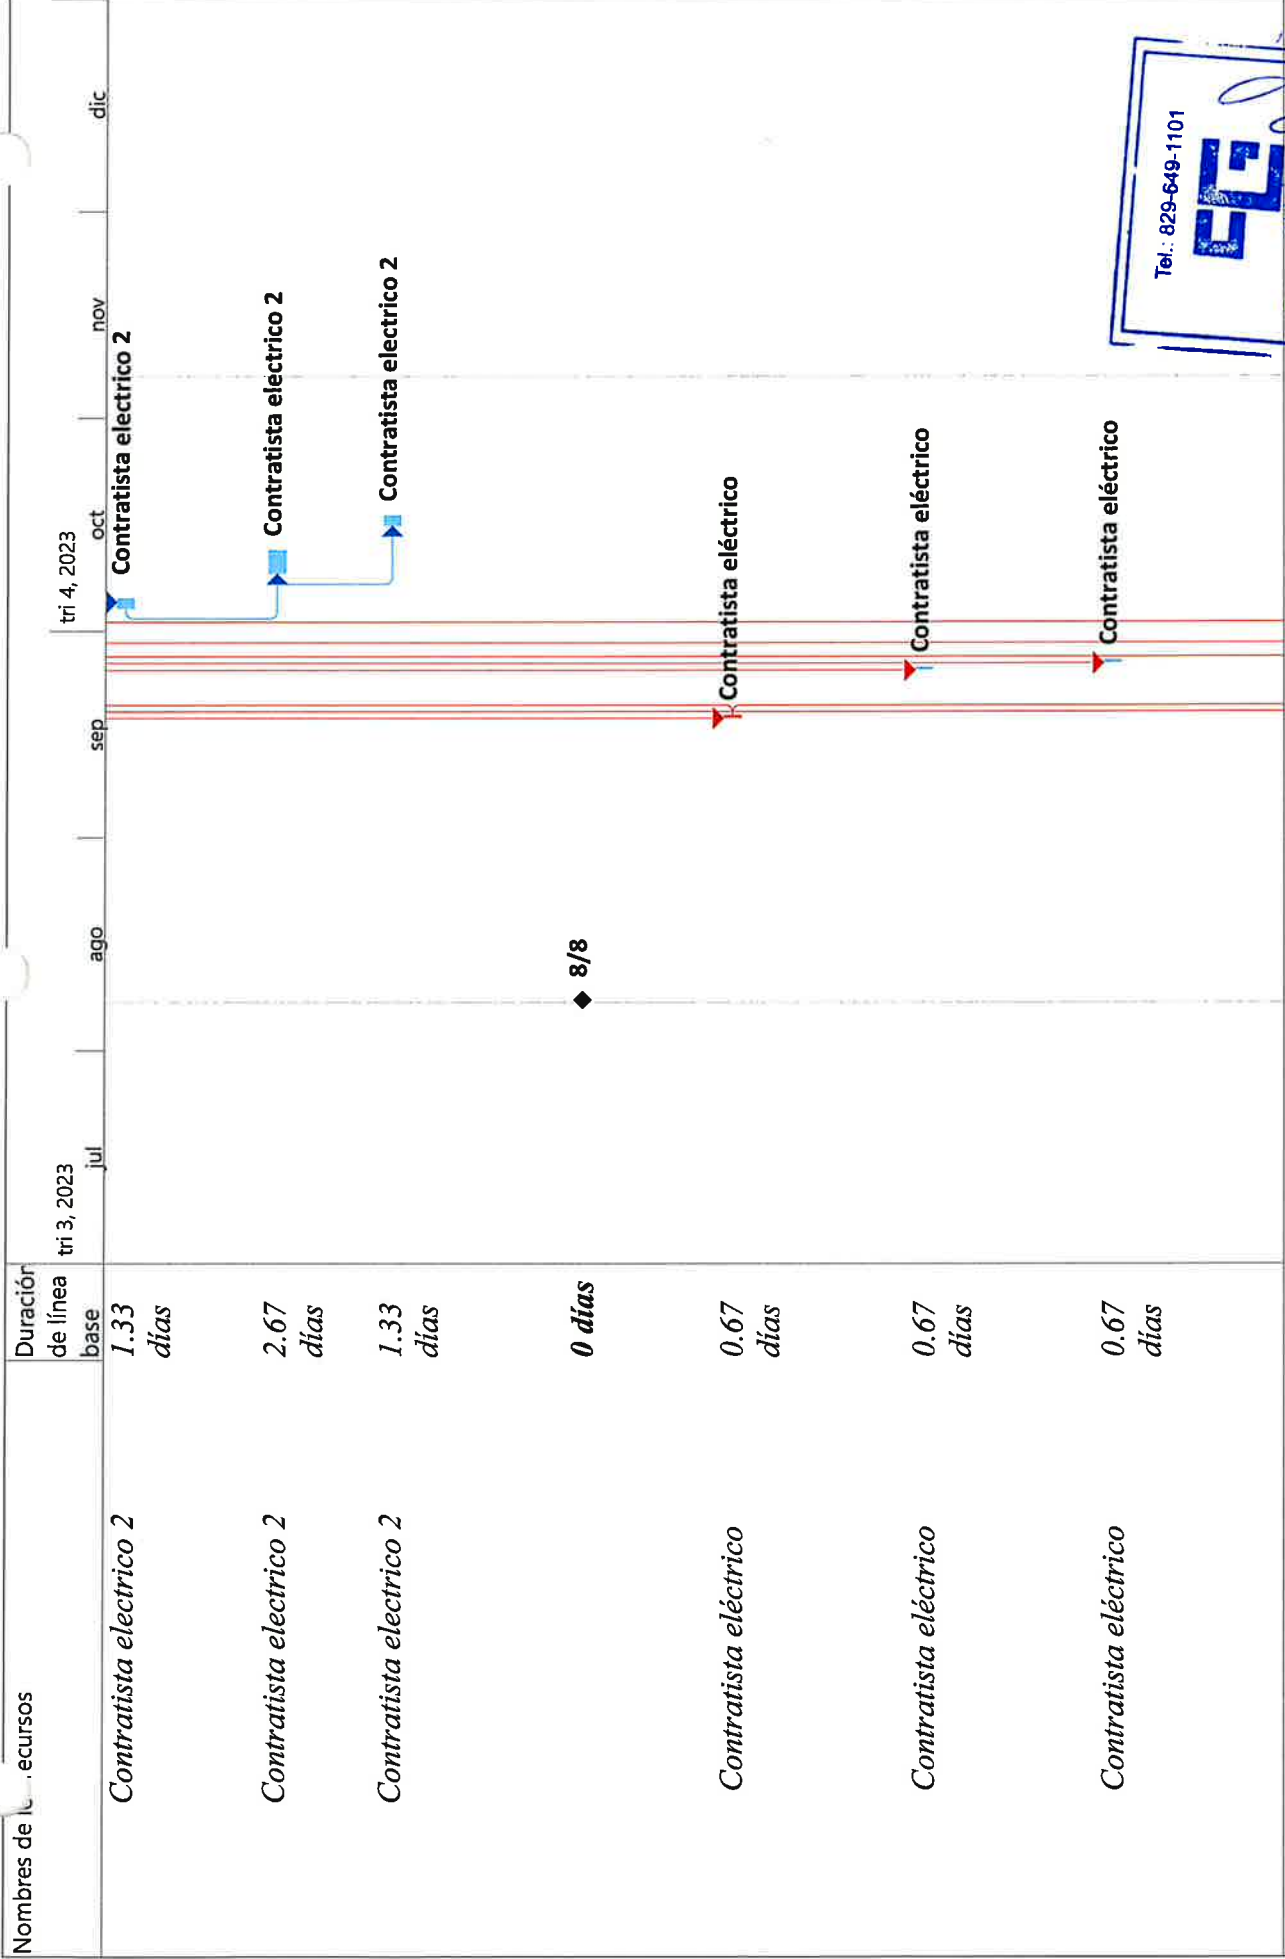


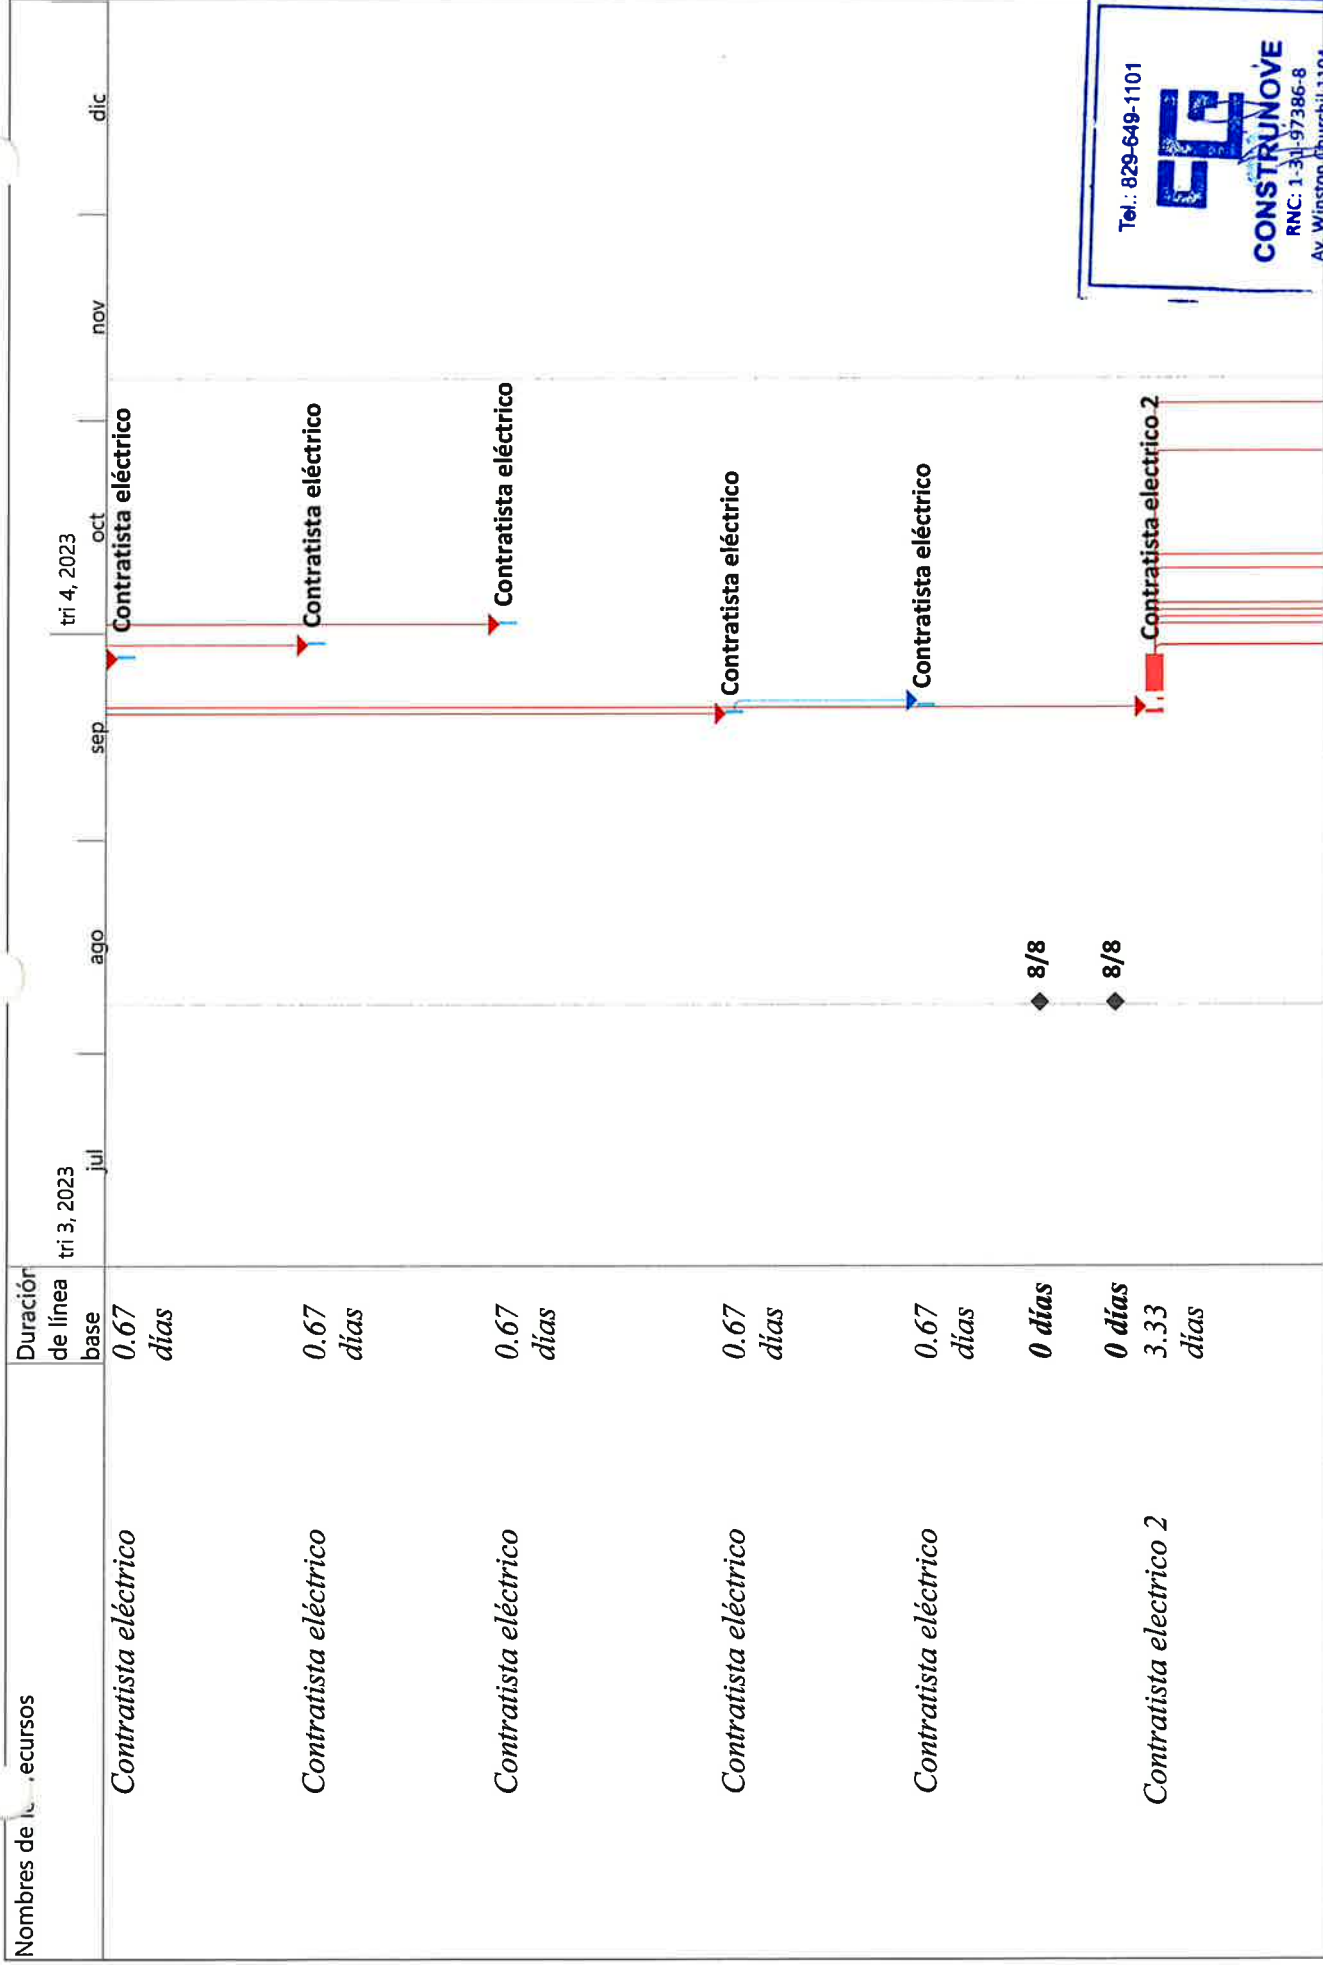

Tel.: 829-649-1101



CONSTRUNOVE
 RNC: 1-311-97386-8
 Av. Winston Churchill 1104,
 Evaristo Morales, Santo Domingo

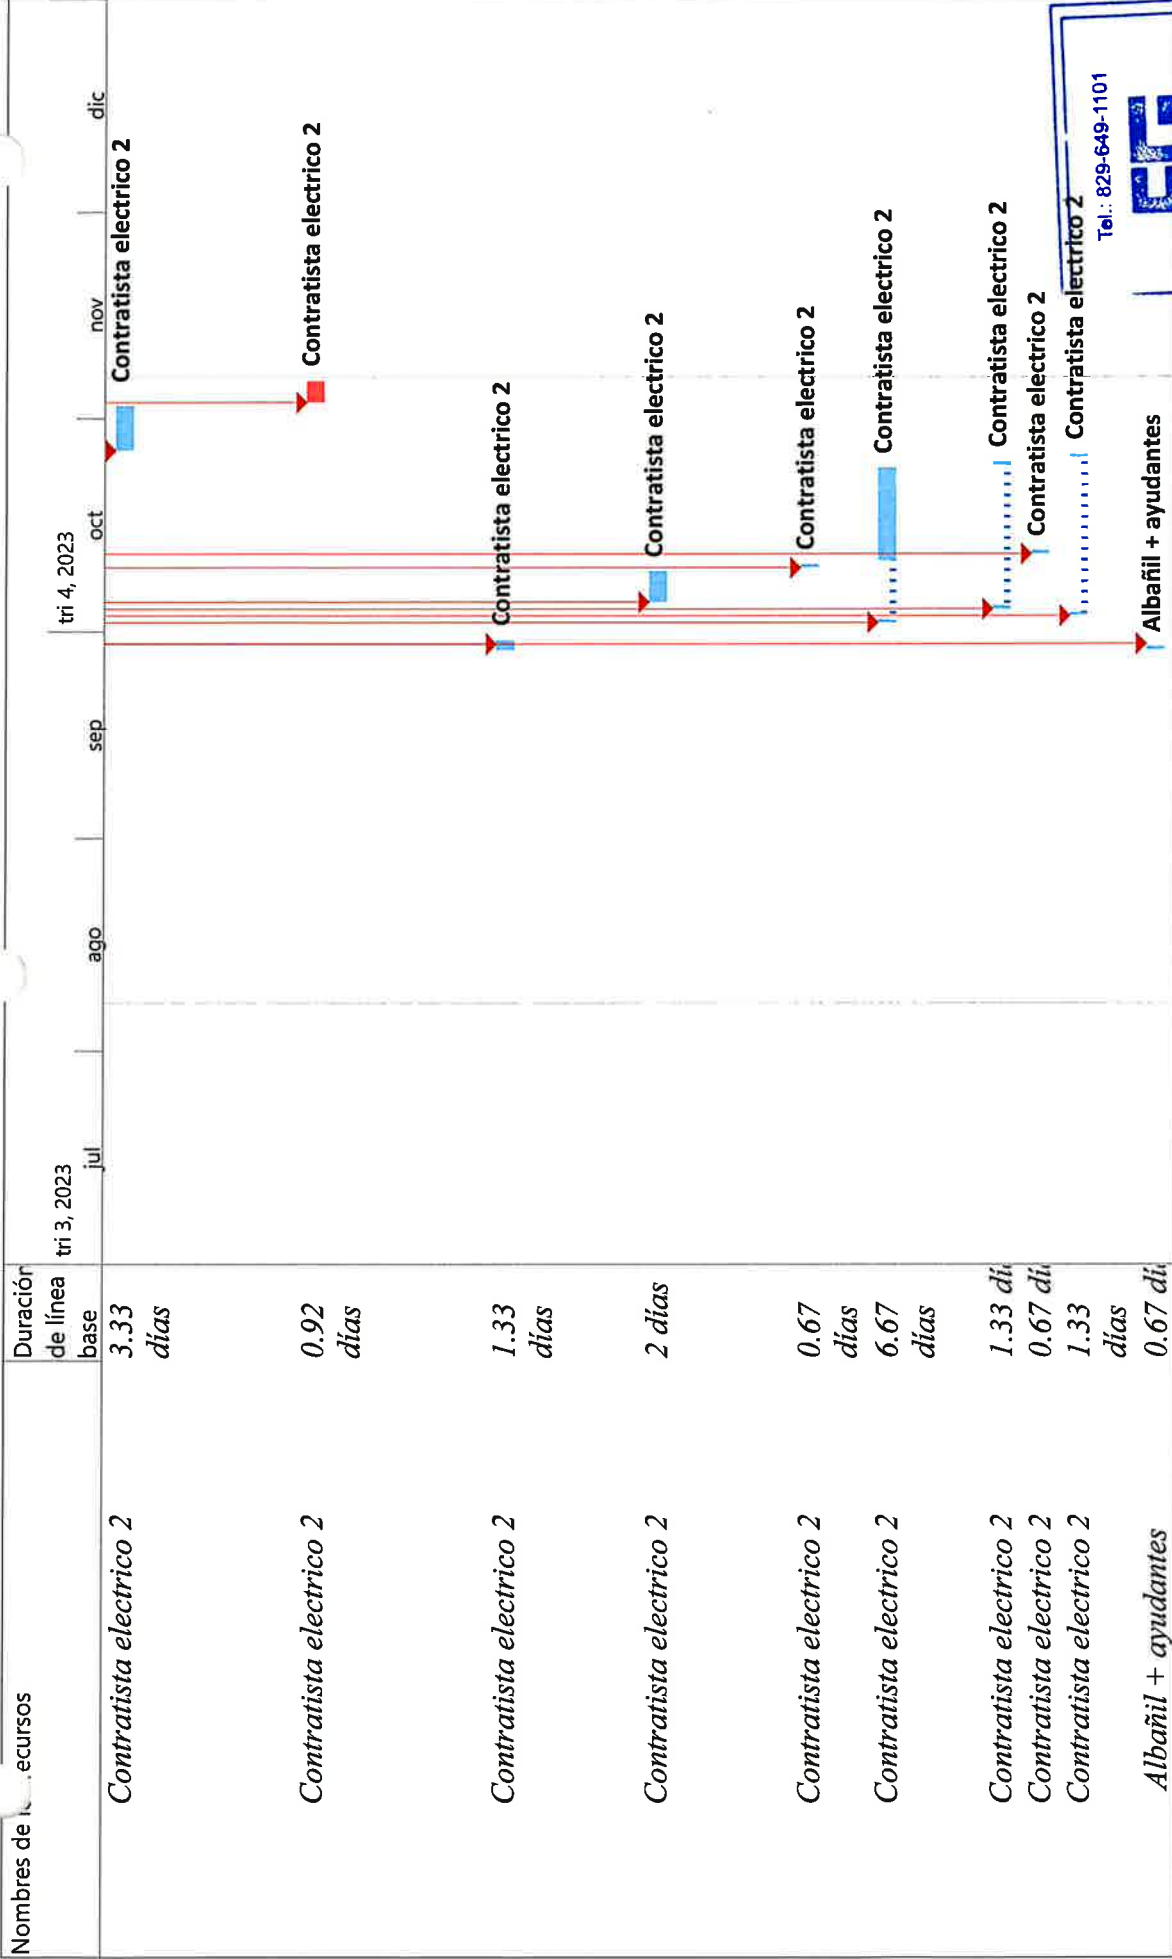

Tel.: 829-649-1101

CONSTRUNOVE
 RNC: 1-31-97386-8
 Av. Winston Churchill 1104,
 Barrio Morales Santo Domingo
