


ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	14 Oct '24	21 Oct '24	28 Oct '24	4 Nov '24	11 Nov '24
1		PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LATERAL LAS COLINAS.	29.5 days	14/10/2024	12/11/2024	S	S	M	T	W
2		Preliminares:	6 days	14/10/2024	20/10/2024					
3		Limpieza area	1 day	14/10/2024	15/10/2024					
4		Replanteo general. (A = 147.05m²)	1 day	19/10/2024	20/10/2024					
5		Demolicion de Canaleta adyacente al Muro	2 days	15/10/2024	17/10/2024					
6		Bote de escombros. (Aprox. 10.00 Camiones de 6m³)	2 days	17/10/2024	19/10/2024					
7		Movimiento de tierra	18 days	20/10/2024	7/11/2024					
8		Demolicion de muro de contencion existente con compresor	1 day	20/10/2024	21/10/2024					
9		Demolicion de zapata de muro de contencion existente con compresor	0.5 days	21/10/2024	21/10/2024					
10		Excavacion de material proximo al muro (V = 5.00m × 29.41m × 5.00m (Con Equipo))	10.5 days	20/10/2024	30/10/2024					
11		Excavacion de zapata del muro (V= 1.15m × 29.41m × 2.60m (Con compresor))	1 day	30/10/2024	31/10/2024					
12		Relleno de Reposicion de Material Excavado (V= 0.60 × 2.00 × 29.41)m³	0.5 days	30/10/2024	31/10/2024					
13		Bote de Material Excavado (Con Equipo)(Factor de Esp. = 1.20)	6 days	30/10/2024	5/11/2024					
14		Relleno compactado caliche (Con Equipo)(Factor de Comp. = 1.30)	7.5 days	30/10/2024	7/11/2024					
15		Hormigon Simple y armado en:	5.5 days	7/11/2024	12/11/2024					

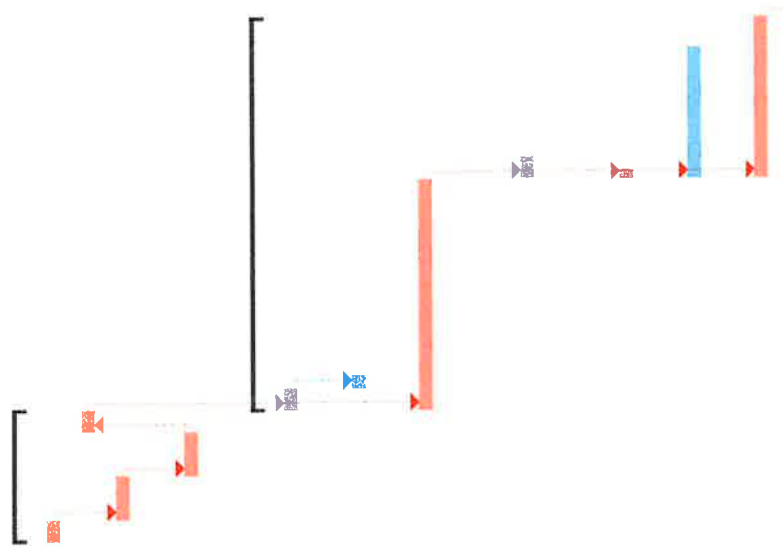

CRS

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	14 Oct '24	21 Oct '24	28 Oct '24	4 Nov '24	11 Nov '24
16		Hormigon Simple de Limpieza debajo 0.5 days de la Zapata (V= 29.41m x 0.10m x 2.60m)	0.5 days	8/11/2024	9/11/2024	S	S	S	S	S
17		Zapata de Muro de Contencion Ø¾" @0.15 A.D. cara inferior y Ø½" @0.15 A.D en cara superior (V= 2.60m x 0.40m x 29.41m)	1.5 days	7/11/2024	8/11/2024	S	S	S	S	S
18		Muro de Contencion Ø½" @0.15 A.D. En cara izquierda y de Ø½" @0.15 long. Y Ø¾" @0.15 transv. en cara derecha (V= (0.30+0.60)/2 x	3.5 days	9/11/2024	12/11/2024	S	S	S	S	S
19		Suministro y colocacion de Lloraderos en muro y Construcccion de Canaleta con Rejilla Metalica	5 days	7/11/2024	12/11/2024	S	S	S	S	S
20		Suministro y colocacion de lloraderos en muro de contencion con tubos Ø2" PVC SDR-26 (L= 0.60m c/u) (11.00	3 days	7/11/2024	10/11/2024	S	S	S	S	S
21		Construccion de canaleta con muros y 2 days piso de H.S. con rejilla compuesta de angulares 2" x 2" y perfiles de 2" x 1"	2 days	10/11/2024	12/11/2024	S	S	S	S	S

Griffith

