



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REPARACION BAÑOS SEDE PRINCIPAL JUNTA CENTAL ELECTORAL

Proceso : JCE- CCC-CP-2021-0027

Ofertante : Polystone S.R.L.

RNC: 130-927-251

Telefono: 809-620-2920

Correo: gerenciapolystone@outlook.com

NO	DESCRIPCION	Duración/d		
		Inicio	las	Fin
1.01	NIVEL 3 Desmontar equipos	01-dic-21	1	02-dic-21
1.02	Demolióón paredes y pisos	03-dic	1.5	04-dic-21
1.03	Bote de material producto de la demolioón	04-dic	2	06-dic-21
1.04	Subida de materiales	06-dic	1	07-dic-21
1.05	Resane	08-dic	3	11-dic-21
1.06	Chapapote	12-dic	3	15-dic-21
1.07	Instalaciones piezas sanitarias embebidas	09-dic	2	11-dic-21
1.08	Colocaci3n de cerámica de pared	11-dic	5	16-dic-21
1.09	Colocaci3n cerámica de piso	17-dic	4	21-dic-21
1.1	Colocaci3n tope	22-dic	2	24-dic-21
1.11	Reparaciones ventanas	26-dic	2	28-dic-21
1.12	Colocaci3n de equipos y accesorios	26-dic	3	29-dic-21
1.13	Electricidad	23-dic	3	26-dic-21
1.14	Limpieza continua y final	01-dic	31	26-dic-22
2.01	NIVEL 2 Desmontar equipos	02-ene	2.5	04-ene-22
2.02	Demolióón paredes y pisos	04-ene	1.5	05-ene-22
2.03	Bote de material producto de la demolioón	05-ene	2	07-ene-22
2.04	Subida de materiales	07-ene	2	09-ene-22
2.05	Resane	09-ene	2	11-ene-22
2.06	Chapapote	12-ene	2	14-ene-22
2.07	Instalaciones piezas sanitarias embebidas	14-ene	2	16-ene-22
2.08	Colocaci3n de cerámica de pared	17-ene	7	24-ene-22
2.09	Colocaci3n cerámica de piso	25-ene	5	30-ene-22
2.1	Colocaci3n tope	01-feb	2	03-feb-22
2.11	Reparaciones ventanas	01-feb	1	02-feb-22
2.12	Colocaci3n de equipos y accesorios	03-feb	3	06-feb-22
2.13	Electricidad	02-feb	3	05-feb-22
2.14	Limpieza continua y final	02-ene	23	06-feb-22
3.01	NIVEL 1 Desmontar equipos	07-feb	1.5	08-feb-22
3.02	Demolióón paredes y pisos	08-feb	1	09-feb-22
3.03	Bote de material producto de la demolioón	10-feb	1	11-feb-22
3.04	Subida de materiales	11-feb	1	12-feb-22
3.05	Resane	12-feb	2	14-feb-22
3.06	Chapapote	14-feb	2	16-feb-22
3.07	Instalaciones piezas sanitarias embebidas	12-feb	1	13-feb-22
3.08	Colocaci3n de cerámica de pared	14-feb	5	19-feb-22
3.09	Colocaci3n cerámica de piso	19-feb	3	22-feb-22
3.1	Colocaci3n tope	23-feb	3	26-feb-22
3.11	Reparaciones ventanas	26-feb	2	28-feb-21
3.12	Colocaci3n de equipos y accesorios	01-mar	2	03-mar-22
3.13	Electricidad	01-mar	2	03-mar-22
3.14	Limpieza continua y final	07-feb	24	03-mar-22

* Se asume fecha de inicio el 1ero diciembre 2021

De acuerdo a las instrucciones se asume un solo equipo de trabajo los 7 días de la semana de 8 a 4 pm todo será de

* acuerdo a las coordinaciones con la JCE. No se trabaja, 24, 25, 31 dic 2021 , ni 1 ene 2022

* Los trabajos de excavaci3n y plomería hasta la bomba, serán coordinados con la JCE

Inicio 44531.00


Final 44623.00

Preparado por:


Ing. Ana Beatriz Valdez Duval

POLYSTONE, S.R.L.
Santo Domingo
RNC: 130927251

DIAGRAMA DE GANTT POR NIVEL PROCESO JCE-CCC-CP-2021-0027

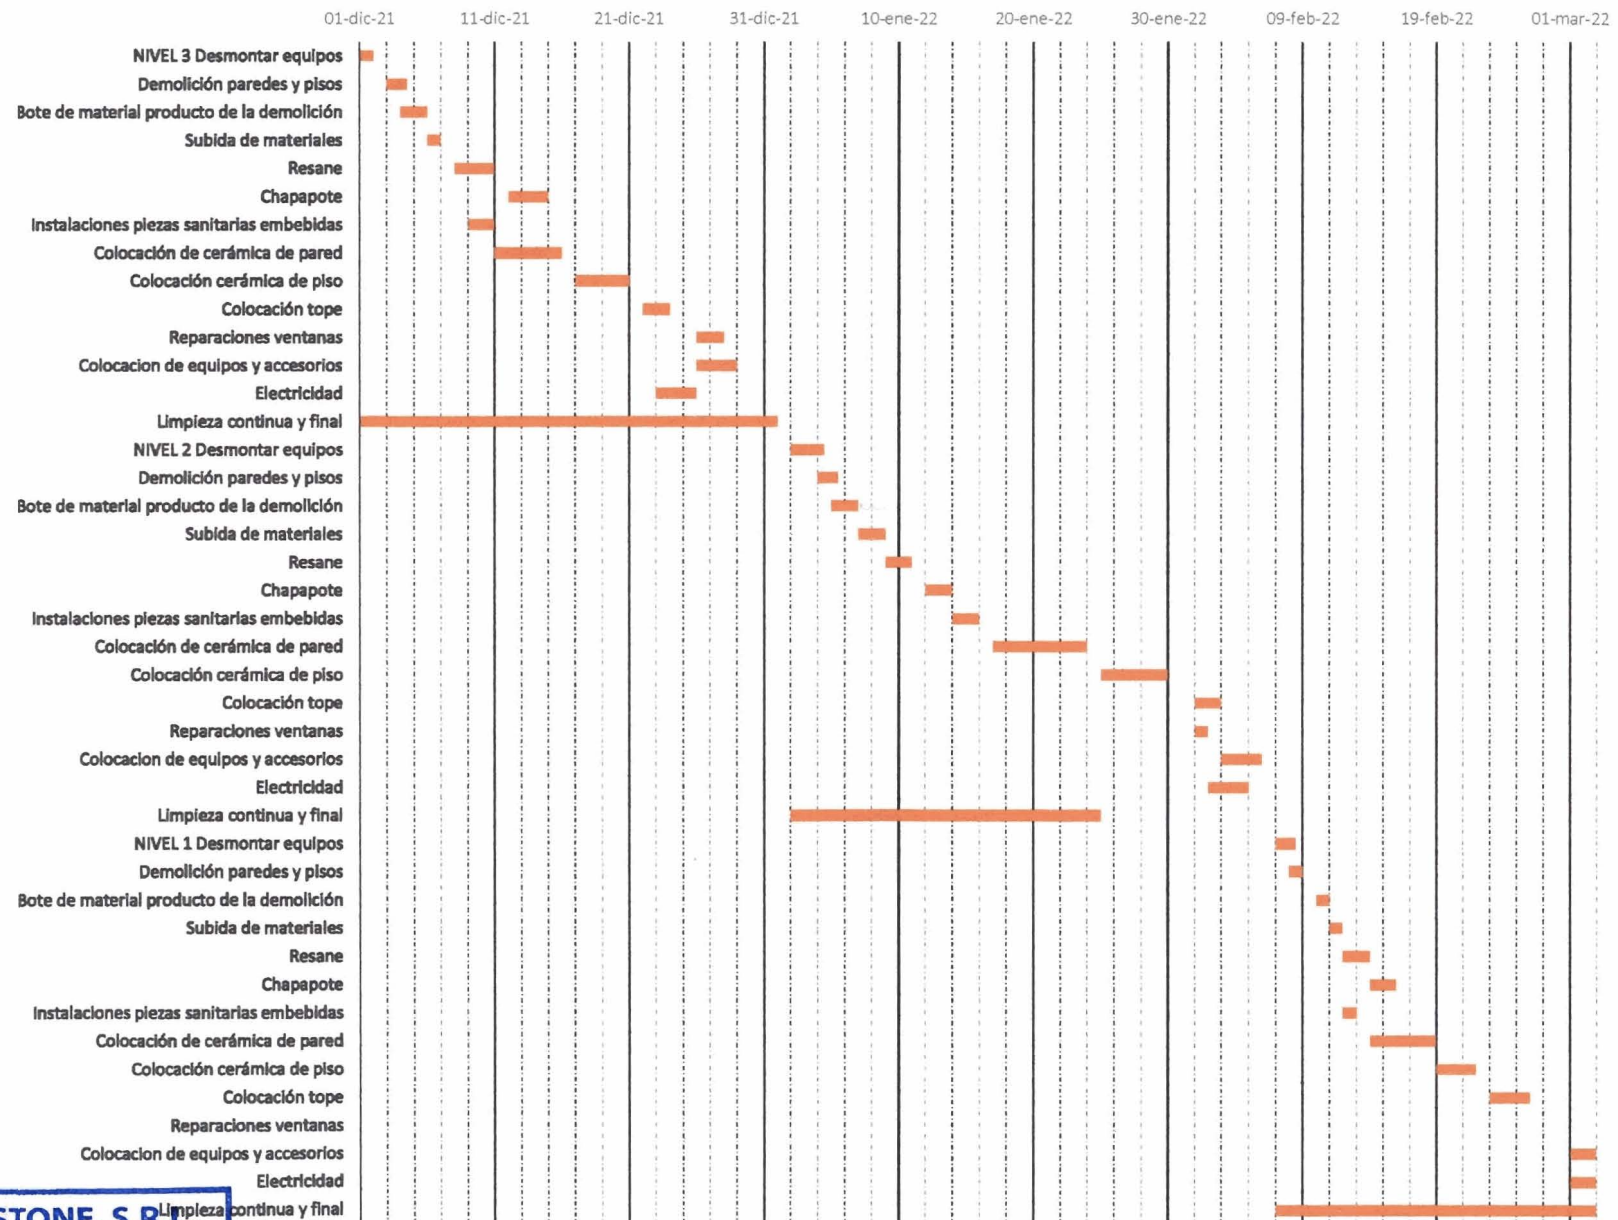

POLYSTONE, S.R.L.
Santo Domingo
RNC: 130927251

Polystone S.R.L.

[Handwritten signature]
