



DIAGRAMA DE GANTT

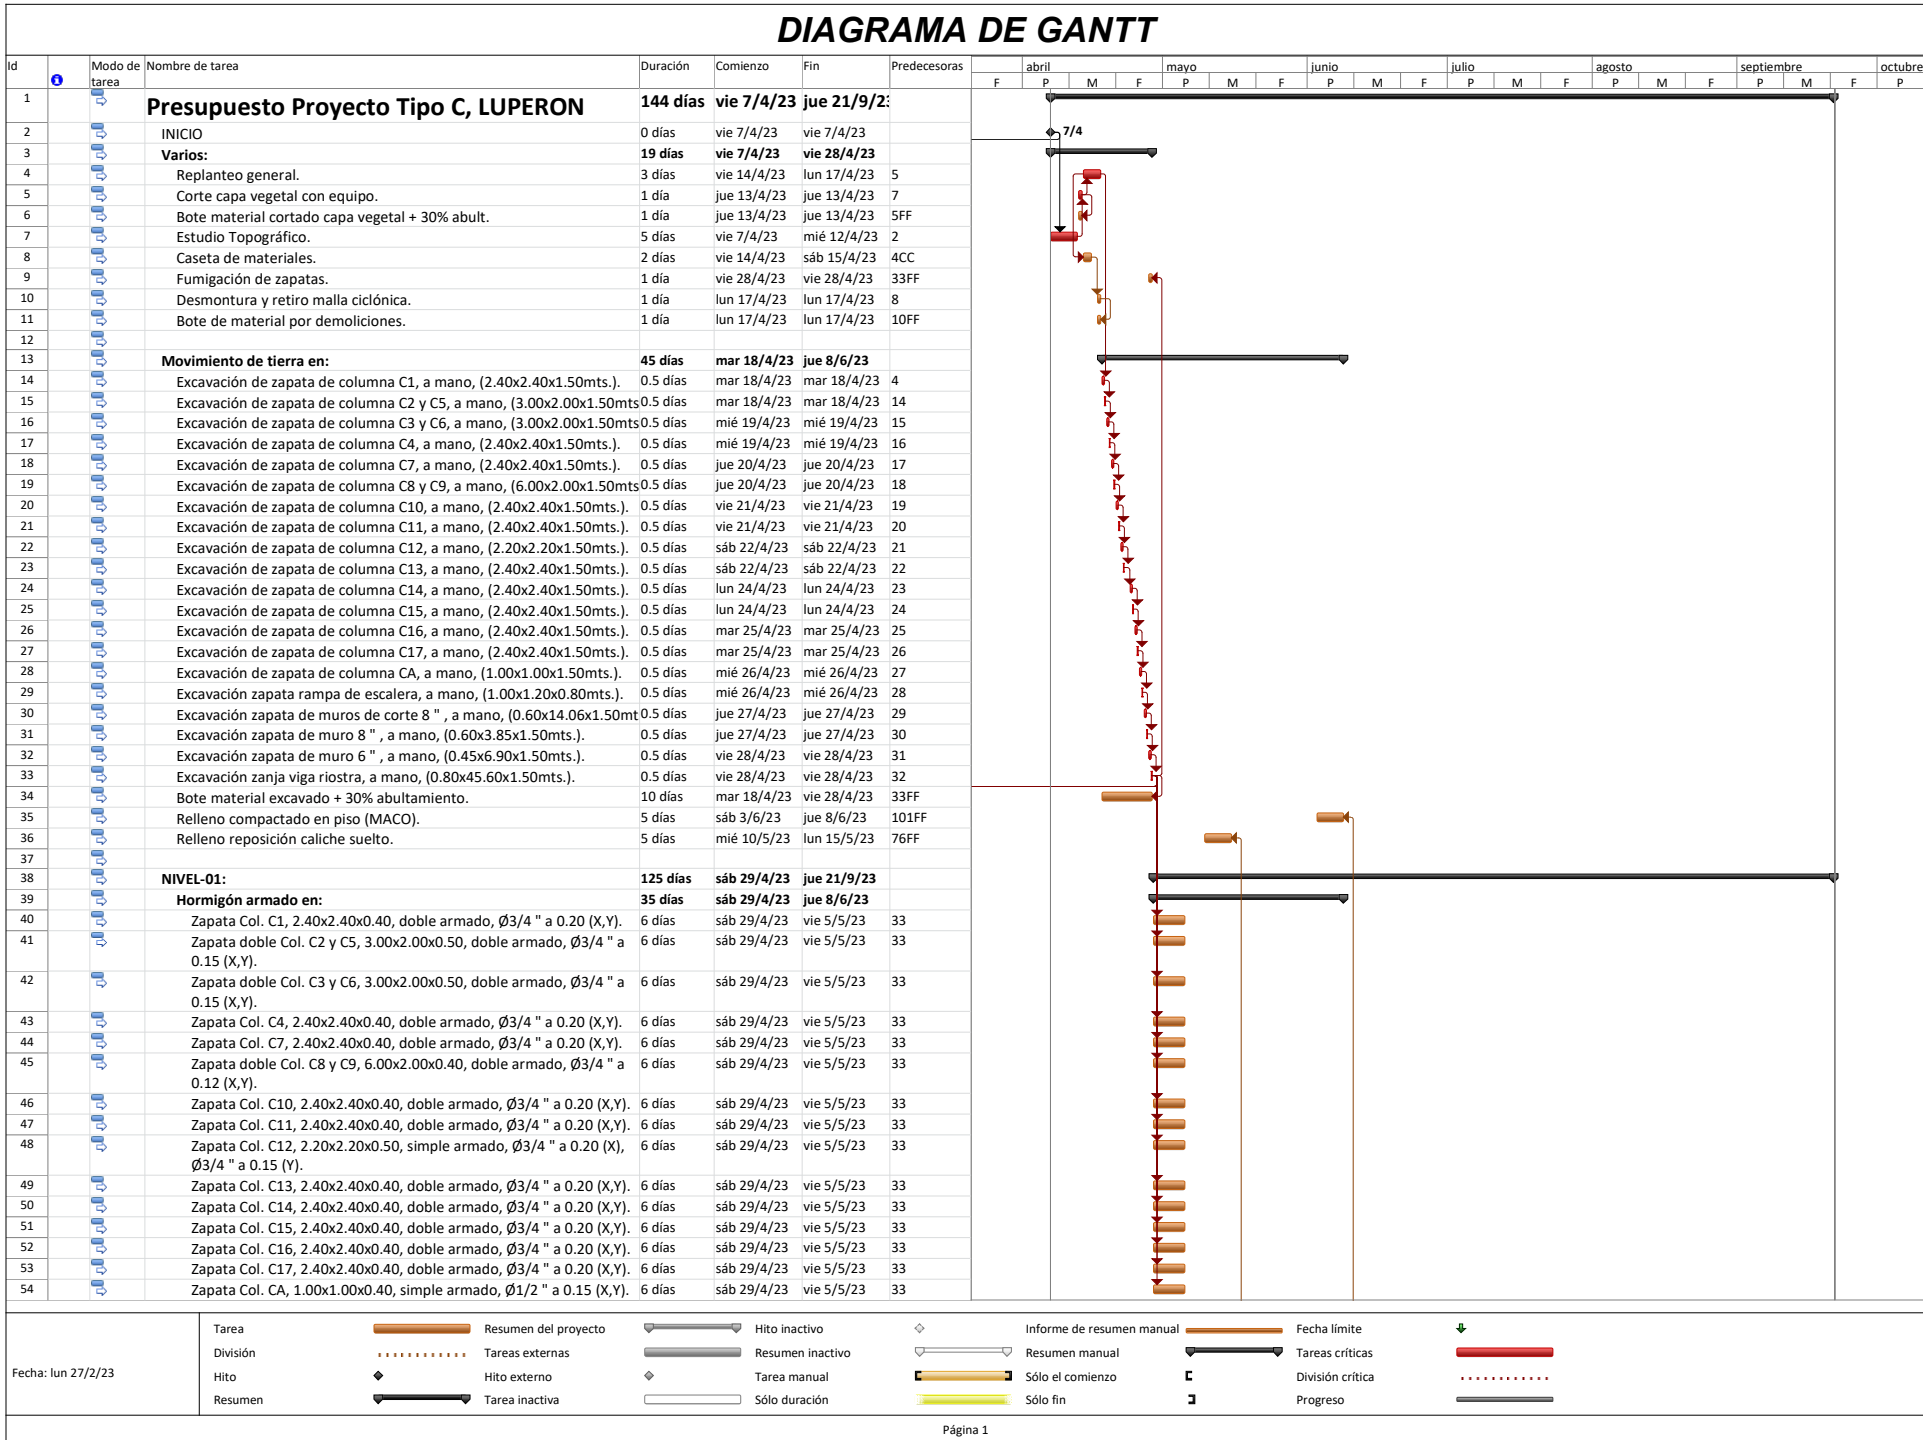

Página 1

DIAGRAMA DE GANTT

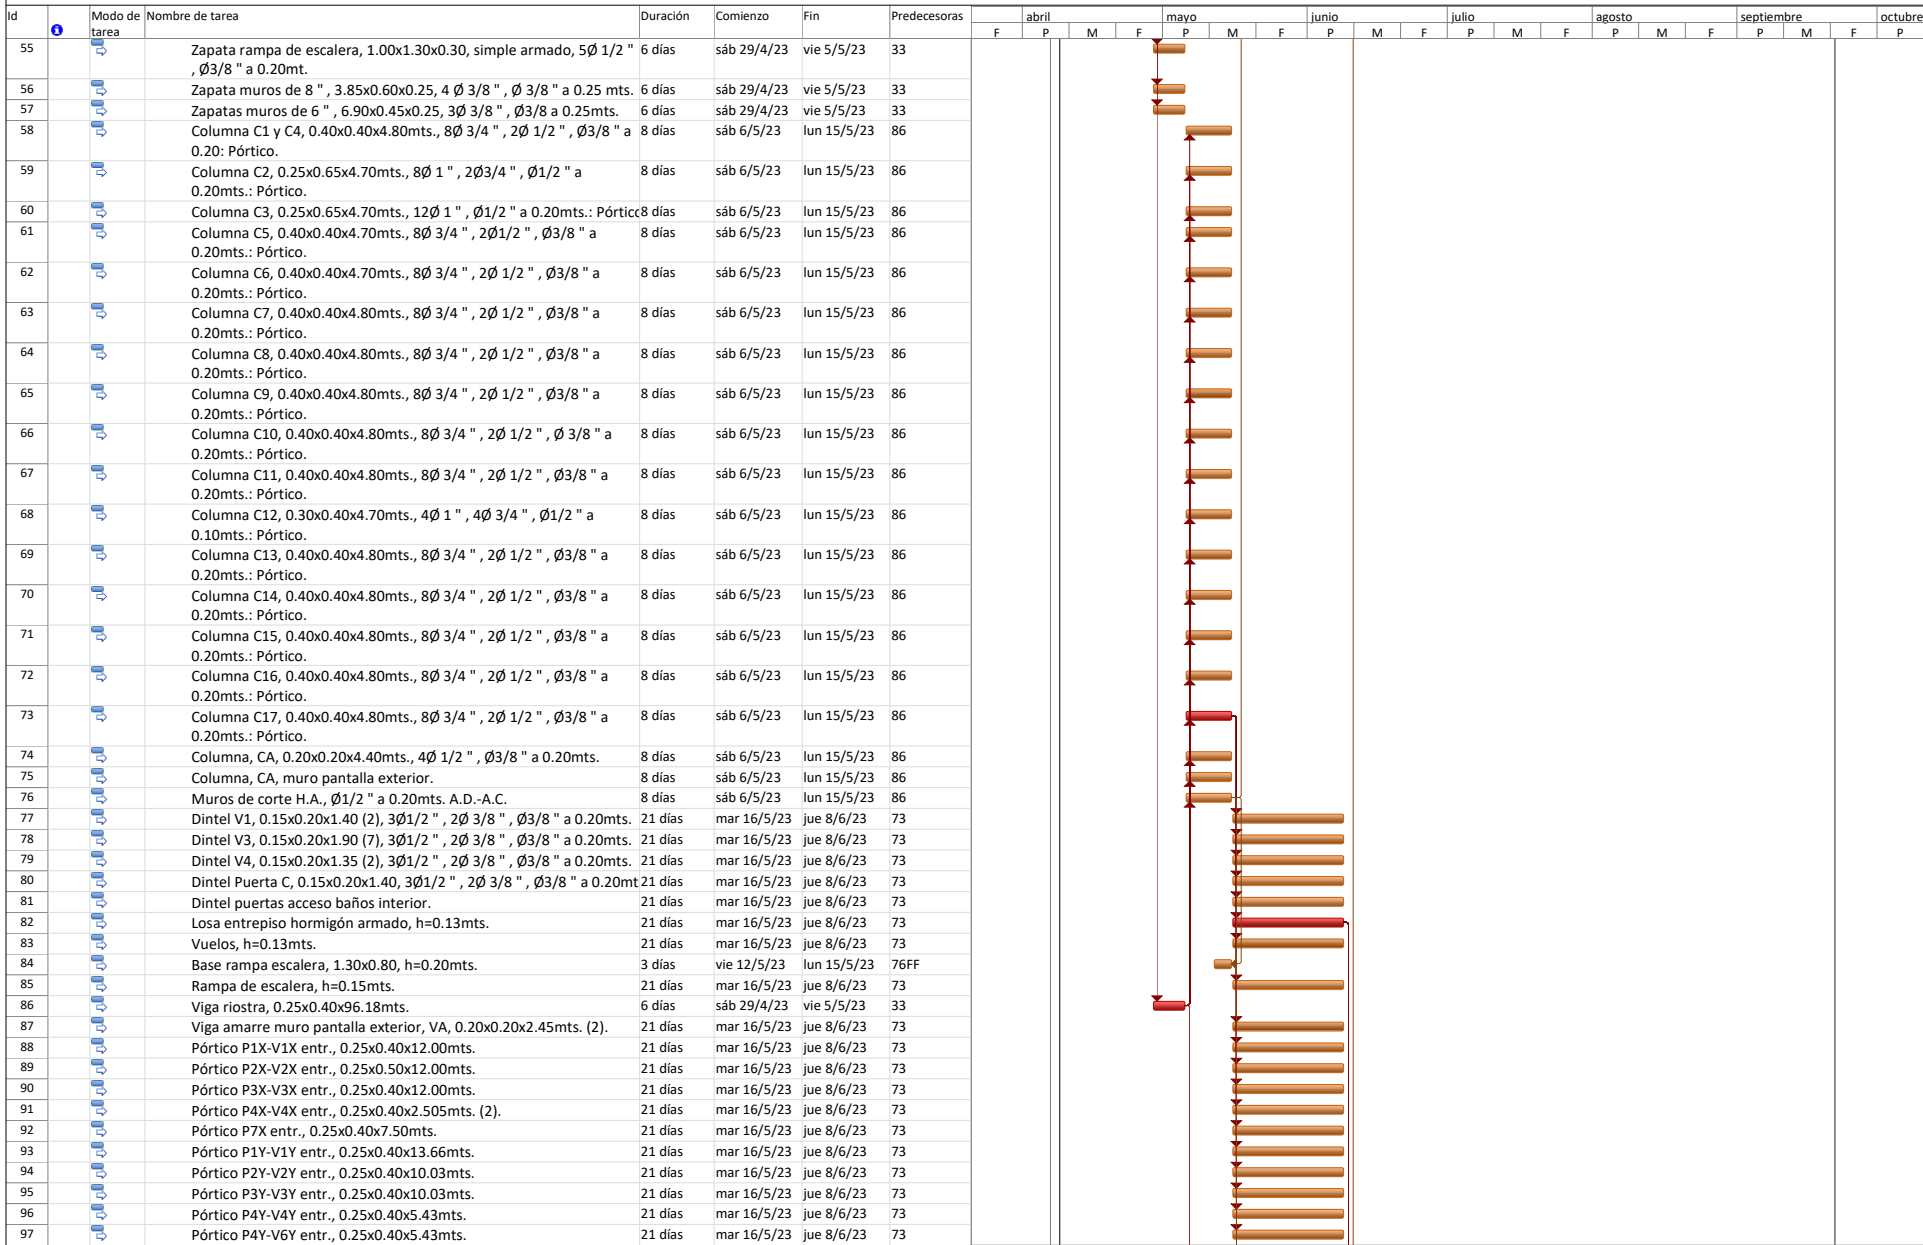

Fecha: lun 27/2/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Tarea interna

Hito inactivo

Resumen inactivo

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Página 2

DIAGRAMA DE GANTT

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecessoras	mayo							junio			julio			agosto			septiembre		octubre	
							F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P
98		Pórtico P2Y-V5Y entr., 0.25x0.50x4.62mts. (2).	21 días	mar 16/5/23	jue 8/6/23	73																				
99		Viga VESC. entr., 0.20x0.40x3.00mts.	21 días	mar 16/5/23	jue 8/6/23	73																				
100		Viga V1 entr., 0.20x0.40x4.75mts.	21 días	mar 16/5/23	jue 8/6/23	73																				
101		Viga V.A. entr., 0.20x0.40x3.00mts.	21 días	mar 16/5/23	jue 8/6/23	73																				
102																										
103		Muros de bloques de:	28 días	sáb 6/5/23	mié 7/6/23																					
104		Bloques horm. 6 " unión pórticos, Ø3/8 " a 4 líneas horiz., Ø3/8 " a 0.80mts. vertical y espuma expans. Poliuretano 1 " en unión, B.N.P.	2 días	sáb 6/5/23	lun 8/5/23	86																				
105		Bloques horm. 6 " , Ø3/8 " a 0.80mts., B.N.P.	1 día	mar 9/5/23	mar 9/5/23	104																				
106		Bloques horm. 8 " , Ø3/8 " a 0.80mts., B.N.P.	1 día	mié 10/5/23	mié 10/5/23	105																				
107		Bloques horm. 6 " unión pórticos, Ø3/8 " a 4 líneas horiz., Ø3/8 " a 0.80mts. vertical y espuma expans. Poliuretano 1 " en unión, S.N.P.	8 días	mar 16/5/23	mié 24/5/23	76																				
108		Bloques horm. 6 " , Ø3/8 " a 0.80mts., S.N.P.	2 días	jue 25/5/23	vie 26/5/23	107																				
109		Bloques horm. 8 " , Ø3/8 " a 0.80mts., S.N.P.	2 días	sáb 27/5/23	lun 29/5/23	108																				
110		División en Sheetrock (Dos caras).	8 días	mar 30/5/23	mié 7/6/23	109																				
111																										
112		Terminación de superficie:	25 días	vie 4/8/23	vie 1/9/23																					
113		Fragüache.	3 días	vie 4/8/23	lun 7/8/23	253																				
114		Empañete maestrado columnas.	3 días	mar 8/8/23	jue 10/8/23	113																				
115		Empañete maestrado interior.	16 días	mar 8/8/23	vie 25/8/23	114CC																				
116		Empañete maestrado exterior con retalle canal de aluminio tipo U de 1/2 " , entre cruce tramo de muro frontal y lateral en esquina.	3 días	mié 23/8/23	vie 25/8/23	115FF																				
117		Empañete maestrado exterior con retalle canal de aluminio tipo U de 1/2 " , entre muros y centros de ventanas.	12 días	sáb 19/8/23	vie 1/9/23	116FC-6 días																				
118		Cantos en columnas.	7 días	vie 25/8/23	vie 1/9/23	117FF																				
119		Cantos en vigas.	7 días	vie 25/8/23	vie 1/9/23	117FF																				
120		Cantos en mochetas puertas y ventanas.	7 días	vie 25/8/23	vie 1/9/23	117FF																				
121		Cantos horizontales y verticales en paredes.	7 días	vie 25/8/23	vie 1/9/23	117FF																				
122		Cantos en vuelos.	5 días	lun 28/8/23	vie 1/9/23	117FF																				
123		Goterros colgantes en vuelo.	3 días	mié 30/8/23	vie 1/9/23	117FF																				
124																										
125		Plafond:	4 días	sáb 2/9/23	mié 6/9/23																					
126		Plafond PVC 2' x 2' revestido antihumedad.	4 días	sáb 2/9/23	mié 6/9/23	123																				
127		Plafond PVC 2' x 2' (baños).	1 día	mié 6/9/23	mié 6/9/23	126FF																				
128																										
129		Pisos y zócalos:	9 días	vie 11/8/23	lun 21/8/23																					
130		Porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico.	5 días	vie 11/8/23	mié 16/8/23	277																				
131		Zócalo porcelanato.	3 días	jue 17/8/23	sáb 19/8/23	130																				
132		Cerámica importada 0.30 x 0.30mts. en baño.	1 día	lun 21/8/23	lun 21/8/23	131																				
133																										
134		Revestimientos:	8 días	mar 22/8/23	mié 30/8/23																					
135		Cerámica importada 0.25 x 0.40mts., h=2.70mts. en paredes (baño).	4 días	mar 22/8/23	vie 25/8/23	132																				
136		Cerámica importada en pared exterior 0.50 x 0.50mts., h=1.00mts. en paredes.	4 días	sáb 26/8/23	mié 30/8/23	135																				
137																										
138		Escaleras y escal ones:	17 días	mar 22/8/23	sáb 9/9/23																					
139		Barandas escalera acero inoxidable.	2 días	vie 8/9/23	sáb 9/9/23	191																				
140		Descanso escalera en porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico.	1 día	mar 22/8/23	mar 22/8/23	132																				
141		Escalones porcelanato alto tráfico (huella y contrahuella).	3 días	mié 23/8/23	vie 25/8/23	140																				
142		Zócalos porcelanato en descanso.	1 día	sáb 26/8/23	sáb 26/8/23	141																				
143		Zócalos porcelanato escalones.	1 día	lun 28/8/23	lun 28/8/23	142																				
144																										
145		Instalación sanitaria:	17 días	sáb 2/9/23	jue 21/9/23																					
146		Suministro e instalación de inodoro alargado blanco (incluye piezas).	1 día	sáb 9/9/23	sáb 9/9/23	163																				
147		Suministro e instalación de orinal media falda blanco con fluxómetro (incluye piezas).	1 día	lun 11/9/23	lun 11/9/23	146																				
148		Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (incluye piezas).	1 día	mar 12/9/23	mar 12/9/23	147																				
149		Ventilación sanitaria Ø3 " PVC SDR41.	1 día	mié 13/9/23	mié 13/9/23	148																				
150		Desagüe de piso Ø2 " instalado (Tub. Matriz 4 ").	1 día	jue 14/9/23	jue 14/9/23	149																				

DIAGRAMA DE GANTT


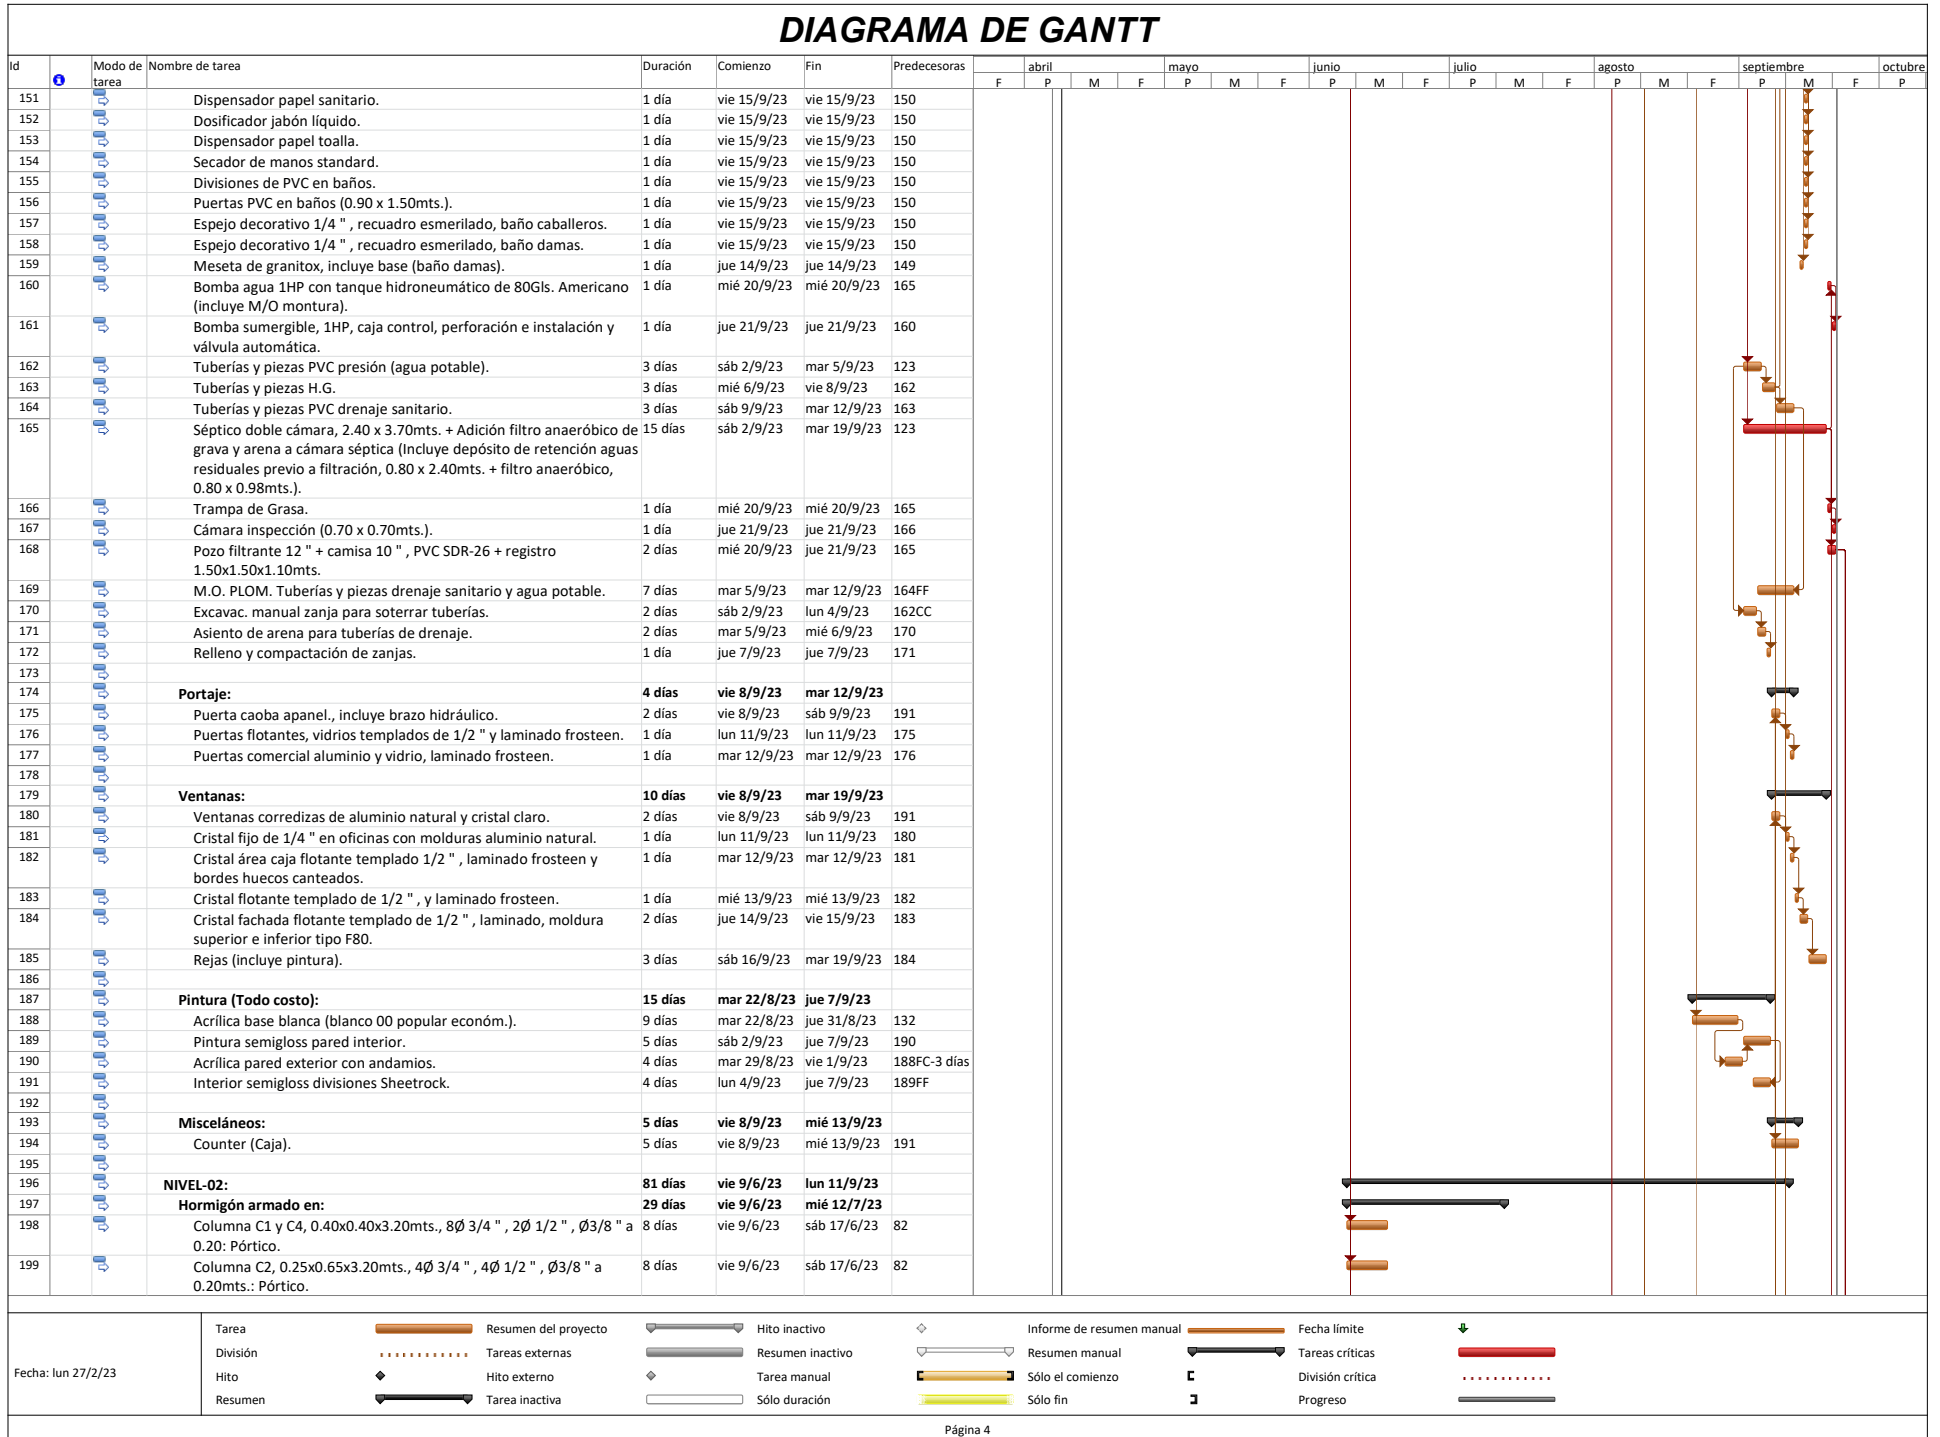


DIAGRAMA DE GANTT

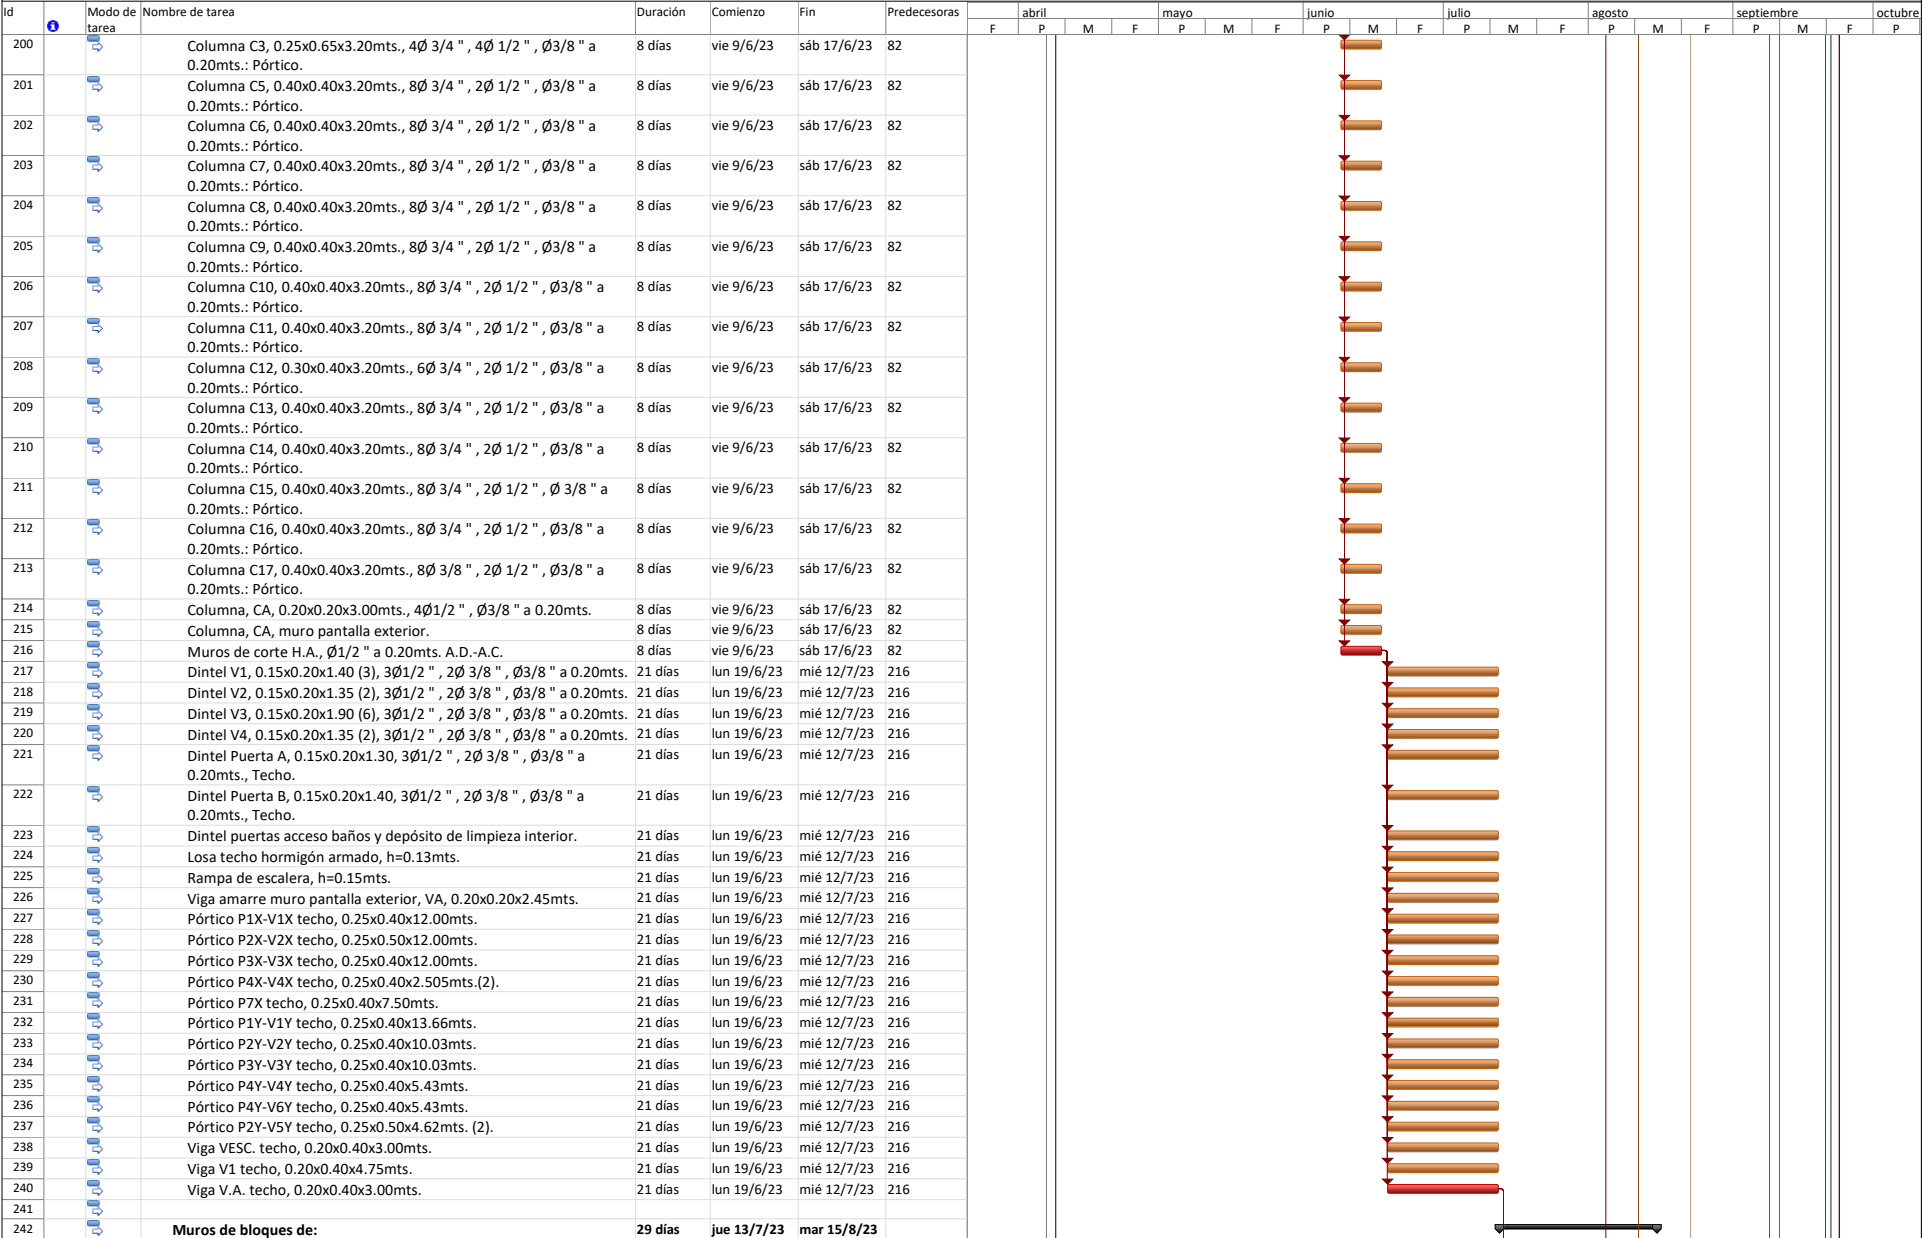

Fecha: lun 27/2/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

DIAGRAMA DE GANTT

ID	Modo de tarea	NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	PREDECESORAS
243	[icon]	Bloques horm. 6 " unión pórticos, Ø3/8 " a 4 líneas horiz., Ø3/8 " a 0.80mts. vertical y espuma expans. Poliuretano 1 " en unión.	3 días	jue 13/7/23	sáb 15/7/23	240
244	[icon]	Bloques horm. 6 " , Ø3/8 " a 0.80mts.	4 días	vie 14/7/23	mar 18/7/23	243FC-2 días
245	[icon]	Bloques horm. 8 " , Ø3/8 " a 0.80mts.	3 días	lun 17/7/23	mié 19/7/23	244FC-2 días
246	[icon]	División en Sheetrock (Dos caras).	6 días	mié 9/8/23	mar 15/8/23	261
247	[icon]	División plycem, baño Presidente y Secretario.	1 día	mar 15/8/23	mar 15/8/23	246FF
248	[icon]	Antepecho bloques 6 " , 48.45 x 1.00mts.	2 días	jue 20/7/23	vie 21/7/23	245
249	[icon]					
250	[icon]	Terminación de superficie:	17 días	jue 20/7/23	mar 8/8/23	
251	[icon]	Fragüache.	3 días	jue 20/7/23	sáb 22/7/23	245
252	[icon]	Empañete maestrado columnas.	2 días	lun 24/7/23	mar 25/7/23	251
253	[icon]	Empañete maestrado interior.	10 días	lun 24/7/23	jue 3/8/23	251
254	[icon]	Empañete maestrado exterior con retalle canal de aluminio tipo U de 1/2 " , entre cruce tramo de muro frontal y lateral en esquina.	2 días	mié 2/8/23	jue 3/8/23	253FF
255	[icon]	Empañete maestrado exterior con retalle canal de aluminio tipo U de 1/2 " , entre muros y centros de ventanas.	7 días	mar 1/8/23	mar 8/8/23	254FC-3 días
256	[icon]	Cantos en antepecho.	6 días	mié 2/8/23	mar 8/8/23	255FF
257	[icon]	Cantos en columnas.	6 días	mié 2/8/23	mar 8/8/23	255FF
258	[icon]	Cantos en vigas.	6 días	mié 2/8/23	mar 8/8/23	255FF
259	[icon]	Cantos en mochetas puertas y ventanas.	6 días	mié 2/8/23	mar 8/8/23	255FF
260	[icon]	Cantos horizontales y verticales en paredes.	6 días	mié 2/8/23	mar 8/8/23	255FF
261	[icon]	Cantos en vuelos.	6 días	mié 2/8/23	mar 8/8/23	255FF
262	[icon]					
263	[icon]	Plafond:	7 días	mié 9/8/23	mié 16/8/23	
264	[icon]	Plafond PVC 2' x 2' revestido antihumedad.	7 días	mié 9/8/23	mié 16/8/23	261
265	[icon]	Plafond PVC 2' x 2' (baños).	2 días	mar 15/8/23	mié 16/8/23	264FF
266	[icon]	Plafond de sheetrock en lobby doble altura.	3 días	lun 14/8/23	mié 16/8/23	265FF
267	[icon]					
268	[icon]	Desagües:	2 días	jue 13/7/23	vie 14/7/23	
269	[icon]	Desagüe pluvial 3 " , PVC SDR-26, 2 codos (Dos plantas).	2 días	jue 13/7/23	vie 14/7/23	240
270	[icon]					
271	[icon]	Terminación de techos:	11 días	jue 13/7/23	mar 25/7/23	
272	[icon]	Fino techo plano.	6 días	jue 13/7/23	mié 19/7/23	240
273	[icon]	Impermeo. Bitupol inst., 4mm., reforz. Con poliester, 10 años garantía.	4 días	vie 21/7/23	mar 25/7/23	274
274	[icon]	Zabaleta de techo.	1 día	jue 20/7/23	jue 20/7/23	272
275	[icon]					
276	[icon]	Pisos y zócalos:	9 días	vie 4/8/23	lun 14/8/23	
277	[icon]	Porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico.	6 días	vie 4/8/23	jue 10/8/23	254
278	[icon]	Zócalo porcelanato.	2 días	vie 11/8/23	sáb 12/8/23	277
279	[icon]	Cerámica importada 0.30 x 0.30mts. en baño.	1 día	lun 14/8/23	lun 14/8/23	278
280	[icon]					
281	[icon]	Revestimientos:	4 días	mar 15/8/23	vie 18/8/23	
282	[icon]	Cerámica importada 0.25 x 0.40mts., h=2.70mts. en paredes (baño)	3 días	mar 15/8/23	jue 17/8/23	279
283	[icon]	Cerámica importada blanca 0.20 x 0.20mts., h=2.70mts. en paredes (cocina y pantry).	1 día	vie 18/8/23	vie 18/8/23	282
284	[icon]					
285	[icon]	Escaleras y escalones:	24 días	mar 15/8/23	lun 11/9/23	
286	[icon]	Barandas escalera acero inoxidable.	1 día	lun 11/9/23	lun 11/9/23	139
287	[icon]	Descanso escalera en porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico.	1 día	mar 15/8/23	mar 15/8/23	279
288	[icon]	Escalones porcelanato alto tráfico (huella y contrahuella).	2 días	mié 16/8/23	jue 17/8/23	287
289	[icon]	Zócalos porcelanato en descanso.	1 día	vie 18/8/23	vie 18/8/23	288
290	[icon]	Zócalos porcelanato escalones.	1 día	sáb 19/8/23	sáb 19/8/23	289
291	[icon]					
292	[icon]	Instalación sanitaria:	16 días	mié 9/8/23	sáb 26/8/23	
293	[icon]	Suministro e instalación de inodoro alargado blanco (incluye piezas).	1 día	lun 14/8/23	lun 14/8/23	315
294	[icon]	Suministro e instalación de orinal media falda blanco con fluxómetro (incluye piezas).	1 día	mar 15/8/23	mar 15/8/23	293
295	[icon]	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (incluye piezas).	1 día	mié 16/8/23	mié 16/8/23	294
296	[icon]	Vertedero para uso Mayordomía.	1			

Página 6

DIAGRAMA DE GANTT

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecessoras
297		Suministro e instalación de fregadero acero inoxidable sencillo (incluye piezas).	1 día	vie 18/8/23	vie 18/8/23	296
298		Ventilación sanitaria Ø3 " PVC SDR41.	1 día	sáb 19/8/23	sáb 19/8/23	297
299		Bajante de descarga Ø4 " , PVC SDR-41.	1 día	sáb 19/8/23	sáb 19/8/23	297
300		Bajante de descarga Ø2 " , PVC SDR-41.	1 día	sáb 19/8/23	sáb 19/8/23	297
301		Columna de agua fría Ø1/2 " , PVC SCH-40.	1 día	sáb 19/8/23	sáb 19/8/23	297
302		Columna de agua fría Ø11/2 " , PVC SCH-40.	1 día	sáb 19/8/23	sáb 19/8/23	297
303		Desagüe de piso Ø2 " instalado (Tub. Matriz 4 ").	1 día	lun 21/8/23	lun 21/8/23	302
304		Dispensador papel sanitario.	1 día	lun 21/8/23	lun 21/8/23	302
305		Dosificador jabón líquido.	1 día	lun 21/8/23	lun 21/8/23	302
306		Dispensador papel toalla.	1 día	lun 21/8/23	lun 21/8/23	302
307		Secador de manos standard.	1 día	lun 21/8/23	lun 21/8/23	302
308		Divisiones de PVC en baños.	1 día	mar 22/8/23	mar 22/8/23	307
309		Puertas PVC en baños (0.60 x 1.50mts.).	1 día	mié 23/8/23	mié 23/8/23	308
310		Espejo decorativo 1/4 " , recuadro esmerilado, baño caballeros.	1 día	jue 24/8/23	jue 24/8/23	309
311		Espejo decorativo 1/4 " con recuadro esmerilado, baño damas.	1 día	vie 25/8/23	vie 25/8/23	310
312		Meseta de granitox, incluye base (baño damas).	1 día	sáb 26/8/23	sáb 26/8/23	311
313		Tuberías y piezas PVC presión (agua potable).	2 días	mié 9/8/23	jue 10/8/23	261
314		Tuberías y piezas PVC drenaje sanitario.	2 días	vie 11/8/23	sáb 12/8/23	313
315		M.O. PLOM. Tuberías y piezas drenaje sanitario y agua potable.	4 días	mié 9/8/23	sáb 12/8/23	314FF
316						
317		Cocina y pantry:	4 días	sáb 26/8/23	mié 30/8/23	
318		Gabinets de pared en caoba.	1 día	sáb 26/8/23	sáb 26/8/23	338
319		Gabinets de piso en caoba.	1 día	lun 28/8/23	lun 28/8/23	318
320		Meseta de granitox.	1 día	mar 29/8/23	mar 29/8/23	319
321		Base hormigón simple gabinetes piso.	1 día	mié 30/8/23	mié 30/8/23	320
322						
323		Portaje:	2 días	sáb 26/8/23	lun 28/8/23	
324		Puerta caoba apanel., incluye brazo hidráulico.	1 día	sáb 26/8/23	sáb 26/8/23	338
325		Puertas flotantes, vidrios templados de 1/2 " y laminado frosteen.	1 día	lun 28/8/23	lun 28/8/23	324
326						
327		Ventanas:	7 días	sáb 26/8/23	sáb 2/9/23	
328		Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro.	1 día	sáb 26/8/23	sáb 26/8/23	338
329		Cristal fijo de 1/4 " en oficinas con molduras aluminio natural.	1 día	lun 28/8/23	lun 28/8/23	328
330		Cristal flotante templado de 1/2 " , y laminado frosteen.	1 día	mar 29/8/23	mar 29/8/23	329
331		Cristal fachada flotante templado de 1/2 " , laminado, moldura superior e inferior tipo F80.	1 día	mié 30/8/23	mié 30/8/23	330
332		Rejas (incluye pintura).	3 días	jue 31/8/23	sáb 2/9/23	331
333						
334		Pintura (Todo costo):	10 días	mar 15/8/23	vie 25/8/23	
335		Acrílica base blanca (blanco 00 popular económ.).	7 días	mar 15/8/23	mar 22/8/23	279
336		Pintura semigloss pared interior.	3 días	mié 23/8/23	vie 25/8/23	335
337		Acrílica pared exterior con andamios.	2 días	lun 21/8/23	mar 22/8/23	335FF
338		Interior semigloss divisiones Sheetrock.	2 días	jue 24/8/23	vie 25/8/23	336FF
339						
340		Misceláneos:	2 días	sáb 26/8/23	lun 28/8/23	
341		Baranda interior en acero inox. y cristal 1/2 " .	2 días	sáb 26/8/23	lun 28/8/23	338
342						
343		TECHO Y ESTRUCTURA CAJA DE ESCALERA (3ER. NIVEL):	35 días	jue 13/7/23	mar 22/8/23	
344		Hormigón armado en:	19 días	jue 13/7/23	jue 3/8/23	
345		Columna C12 y C13.	5 días	jue 13/7/23	mar 18/7/23	240
346		Dinteles.	14 días	mié 19/7/23	jue 3/8/23	345
347		Losa techo hormigón armado, h=0.12mts.	14 días	mié 19/7/23	jue 3/8/23	345
348		Viga VT, 0.20x0.50x16.80mts.	14 días	mié 19/7/23	jue 3/8/23	345
349		Viga de pergolado.	14 días	mié 19/7/23	jue 3/8/23	345
350						
351		Muros de bloques de:	4 días	vie 4/8/23	mar 8/8/23	
352		Bloques horm. 6 " , Ø3/8 " a 0.80mts.	1 día	vie 4/8/23	vie 4/8/23	349
353		Bloques horm. 8 " , Ø3/8 " a 0.80mts.	2 días	sáb 5/8/23	lun 7/8/23	352

Fecha: lun 27/2/23	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	
Página 7										

DIAGRAMA DE GANTT

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	abril			mayo			junio			julio			agosto			septiembre			octubre	
							F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P
354		Antepecho bloques 6 " , 0.20 x 16.80mts.	1 día	mar 8/8/23	mar 8/8/23	353																				
355																										
356		Terminación de superficie:	10 días	vie 4/8/23	mar 15/8/23																					
357		Fragüache.	1 día	vie 4/8/23	vie 4/8/23	349																				
358		Empañete mastrado columnas.	1 día	sáb 5/8/23	sáb 5/8/23	357																				
359		Empañete mastrado interior.	3 días	lun 7/8/23	mié 9/8/23	358																				
360		Empañete mastrado exterior con retalle canal de aluminio tipo U de 1/2 " , entre muros y centros de ventanas.	1 día	jue 10/8/23	jue 10/8/23	359																				
361		Empañete mastrado exterior pergolado.	1 día	vie 11/8/23	vie 11/8/23	360																				
362		Cantos en antepecho.	3 días	sáb 12/8/23	mar 15/8/23	361																				
363		Cantos en columnas.	3 días	sáb 12/8/23	mar 15/8/23	361																				
364	Cantos en vigas.	3 días	sáb 12/8/23	mar 15/8/23	361																					
365	Cantos en moquetas puertas y ventanas.	3 días	sáb 12/8/23	mar 15/8/23	361																					
366	Cantos horizontales y verticales en paredes.	3 días	sáb 12/8/23	mar 15/8/23	361																					
367																										
368	Desagües:	1 día	mié 9/8/23	mié 9/8/23																						
369	Desagüe pluvial 3 " , PVC SDR-26, techo caja de escalera.	1 día	mié 9/8/23	mié 9/8/23	354																					
370																										
371	Terminación de techos:	3 días	jue 10/8/23	sáb 12/8/23																						
372	Fino techo plano.	1 día	jue 10/8/23	jue 10/8/23	369																					
373	Imperm. Bitupol inst., 4mm., reforz. Con poliester, 10 años garantía.	1 día	sáb 12/8/23	sáb 12/8/23	374																					
374	Zabaleta de techo.	1 día	vie 11/8/23	vie 11/8/23	372																					
375																										
376	Pisos y zócalos:	2 días	mié 16/8/23	jue 17/8/23																						
377	Porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico.	1 día	mié 16/8/23	mié 16/8/23	366																					
378	Zócalo porcelanato.	1 día	jue 17/8/23	jue 17/8/23	377																					
379																										
380	Portaje:	2 días	lun 21/8/23	mar 22/8/23																						
381	Puerta caoba apanel., incluye brazo hidráulico.	1 día	lun 21/8/23	lun 21/8/23	390																					
382	Puerta doble tola (1.00 x 2.10mts.) con tirador.	1 día	mar 22/8/23	mar 22/8/23	381																					
383																										
384	Ventanas:	2 días	lun 21/8/23	mar 22/8/23																						
385	Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro.	1 día	lun 21/8/23	lun 21/8/23	390																					
386	Rejas (incluye pintura).	1 día	mar 22/8/23	mar 22/8/23	385																					
387																										
388	Pintura (Todo costo):	3 días	jue 17/8/23	sáb 19/8/23																						
389	Acrílica base blanca (blanco 00 popular económ.).	1 día	jue 17/8/23	jue 17/8/23	377																					
390	Pintura semigloss pared interior.	1 día	sáb 19/8/23	sáb 19/8/23	391																					
391	Acrílica pared exterior con andamios.	1 día	vie 18/8/23	vie 18/8/23	389																					
392																										
393	ENTRADA PRINCIPAL Y PLAZA DE ENTRADA:	20 días	mié 16/8/23	jue 7/9/23																						
394	Replanteo.	1 día	mié 16/8/23	mié 16/8/23	366																					
395	Remoción capa vegetal a mano.	1 día	jue 17/8/23	jue 17/8/23	394																					
396	Bote material cortado capa vegetal + 30% abult.	1 día	jue 17/8/23	jue 17/8/23	395FF																					
397	Relleno compactado caliche suelto, MACO.	1 día	mar 22/8/23	mar 22/8/23	402																					
398	Excavación zapata de muro 6 " , contención relleno entrada principal, a mano.	1 día	vie 18/8/23	vie 18/8/23	395																					
399	Relleno reposición caliche suelto, MACO.	1 día	mar 22/8/23	mar 22/8/23	402																					
400	Bote material excavado zapatas + 30% abult.	1 día	vie 18/8/23	vie 18/8/23	398FF																					
401	Zapatas muros de 6 " , contención relleno entrada principal.	1 día	sáb 19/8/23	sáb 19/8/23	398																					
402	Bloques horm. 6 " , contención relleno entrada principal, Ø3/8 " a 0.80mts., B.N.P.	1 día	lun 21/8/23	lun 21/8/23	401																					
403	Piso porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico.	1 día	mar 22/8/23	mar 22/8/23	402																					
404	Zócalo porcelanato.	1 día	mié 23/8/23	mié 23/8/23	403																					
405	Escalones porcelanato alto tráfico (huella y contrahuella).	1 día	jue 24/8/23	jue 24/8/23	404																					
406	Zócalos porcelanato escalones.	1 día	vie 25/8/23	vie 25/8/23	405																					
407	Rampa minusválidos (incluye bloques y zapata 0.20 x 0.15mts.).	1 día	sáb 26/8/23	sáb 26/8/23	406																					
408	Tabletas de hormigón (0.40 x 0.40mts.).	1 día	lun 28/8/23	lun 28/8/23	407																					
409	Acera perimetral horm. estampado, e=0.10mts.	1 día	mar 29/8/23	mar 29/8/23	408																					

Fecha: lun 27/2/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

DIAGRAMA DE GANTT

[illegible]

Fecha: lun 27/2/23	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	
Página 9										

DIAGRAMA DE GANTT

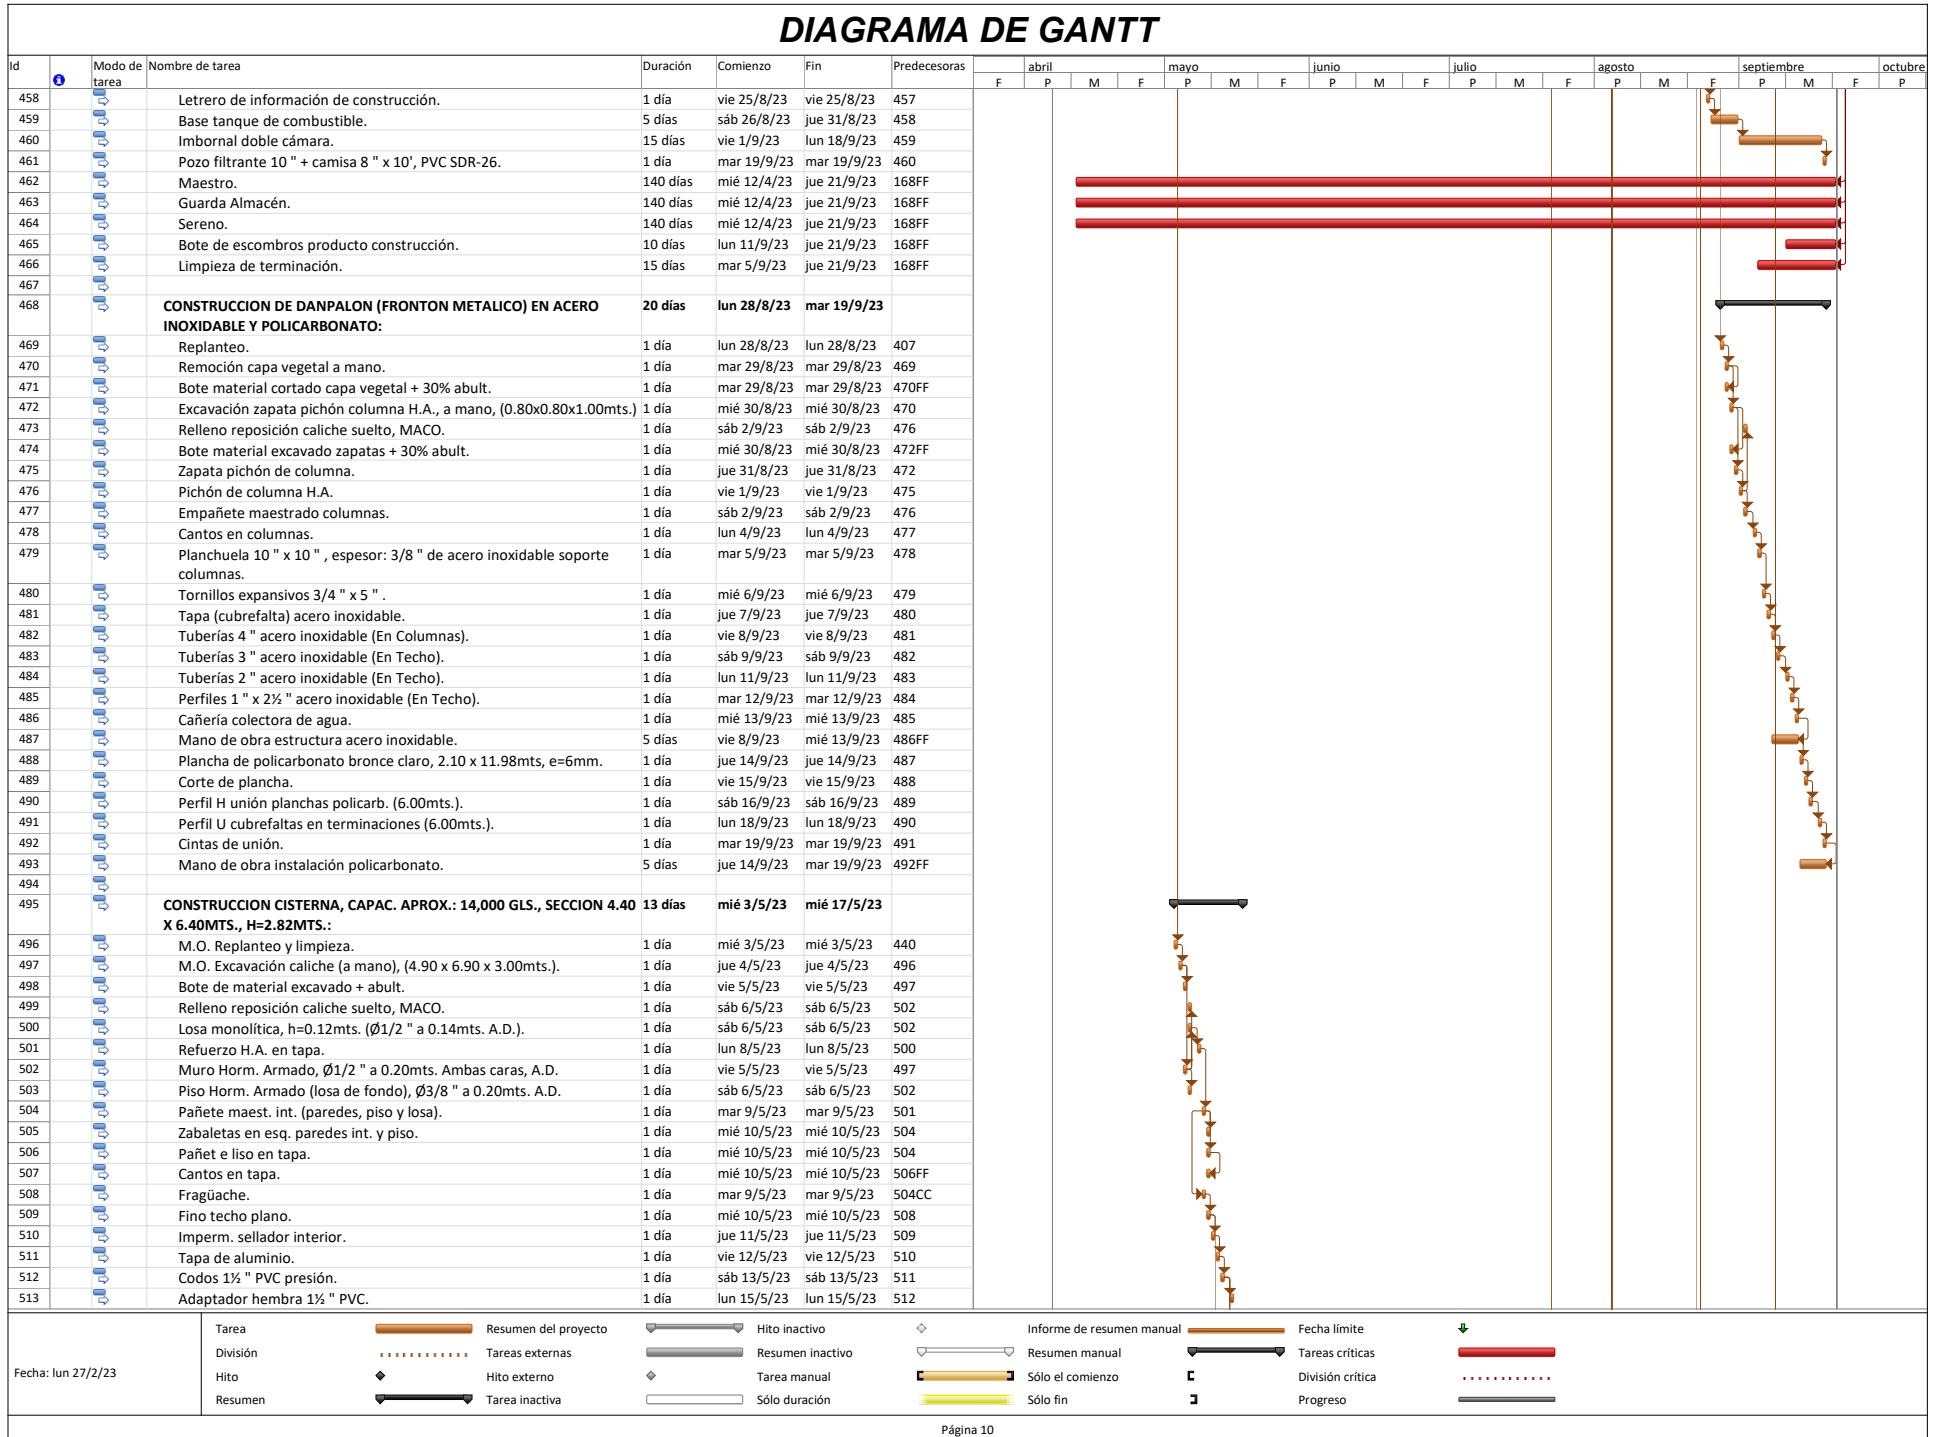


DIAGRAMA DE GANTT

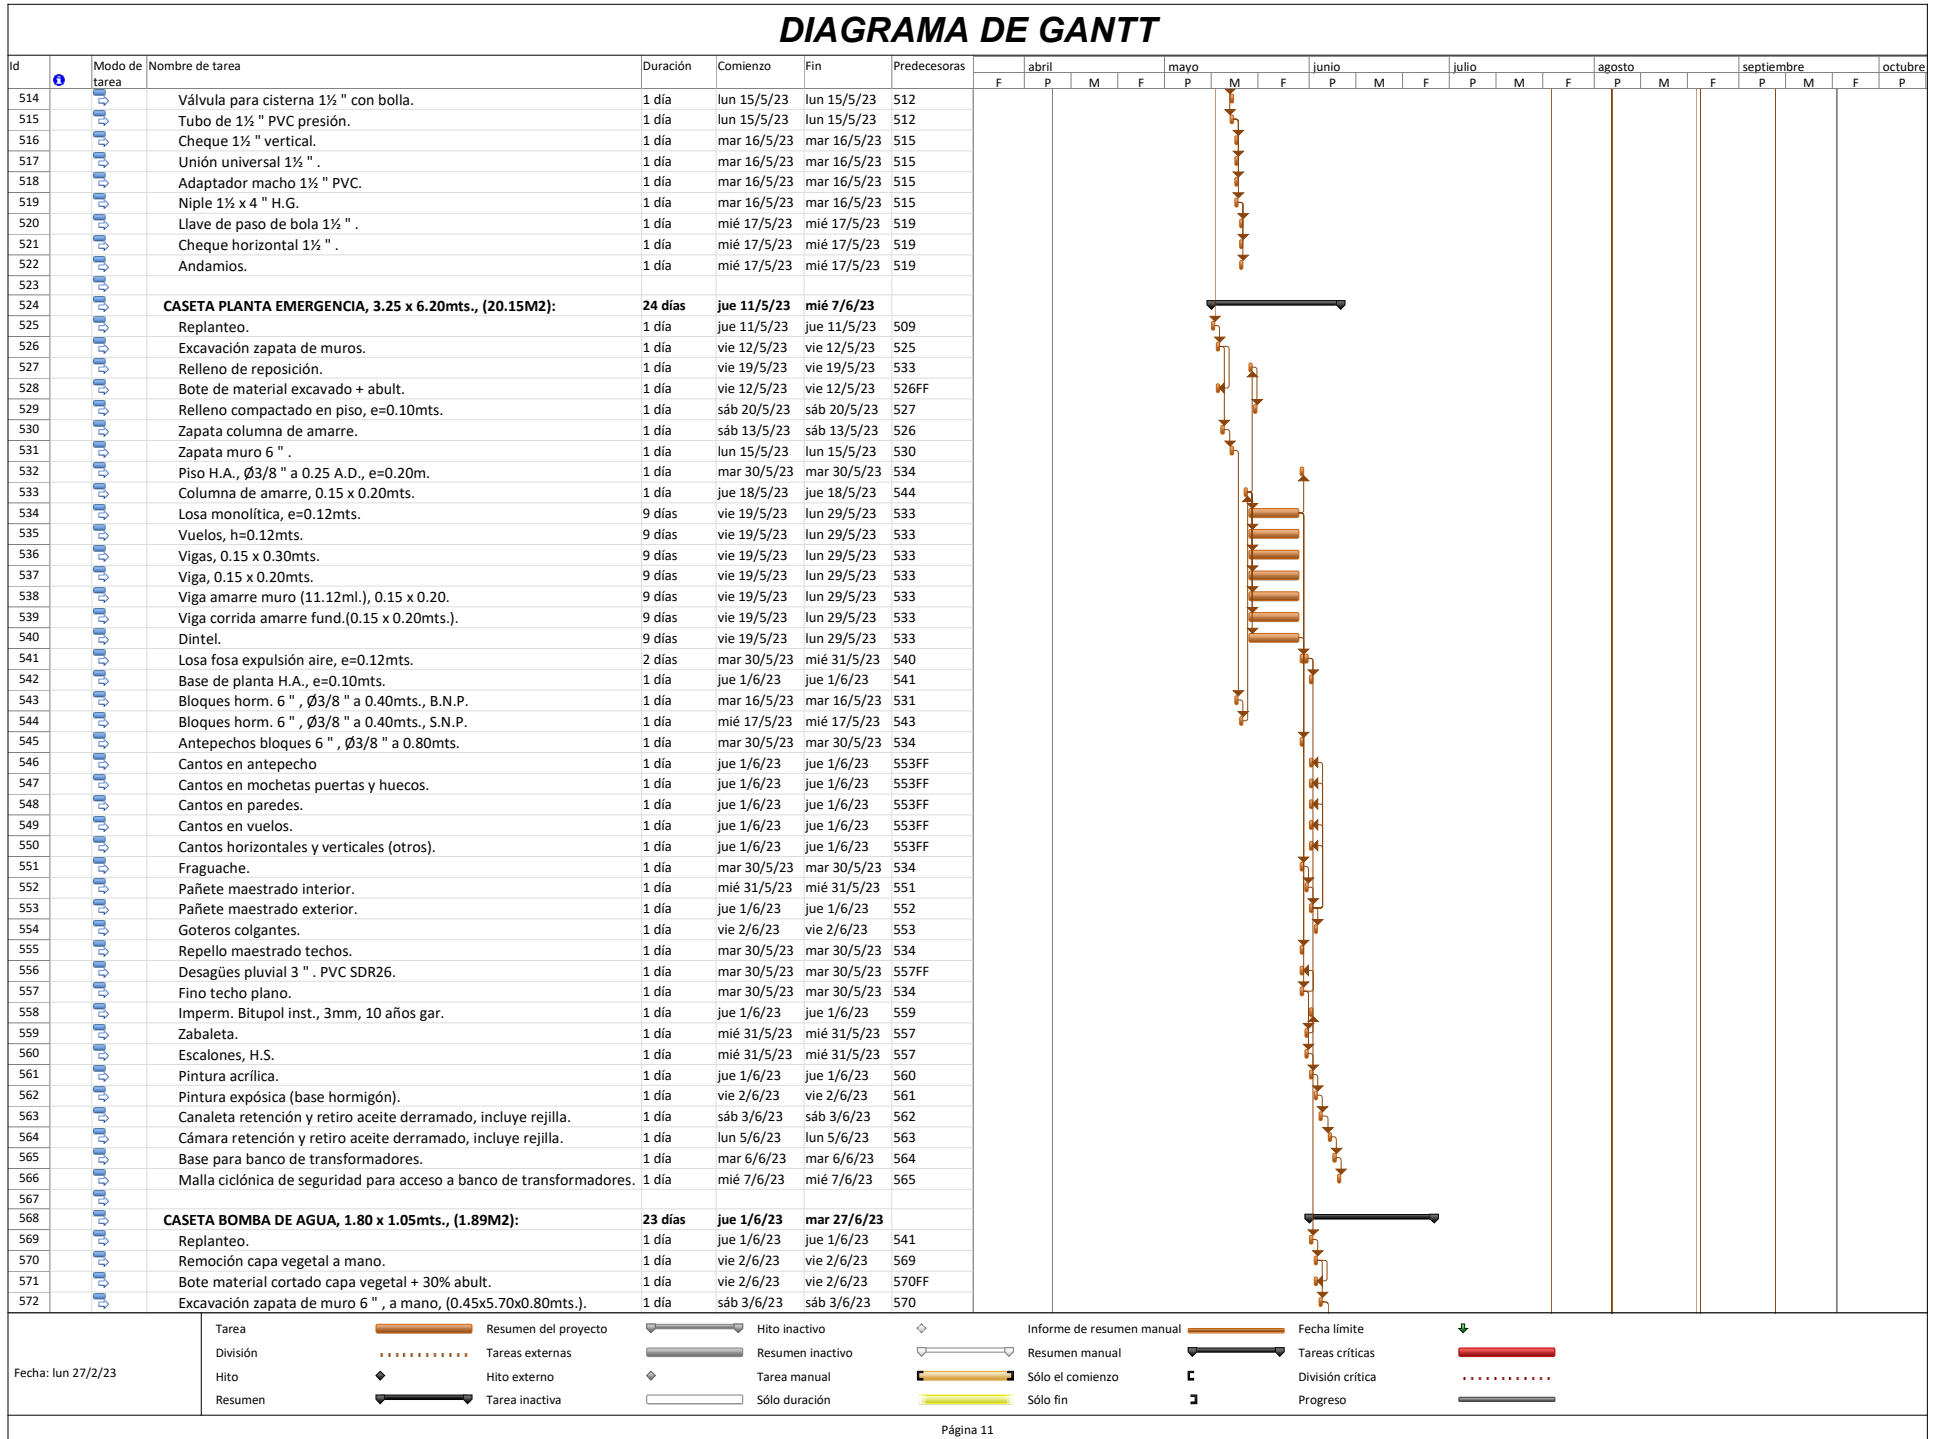


DIAGRAMA DE GANTT

[illegible]

Fecha: lun 27/2/23	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo				Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	

DIAGRAMA DE GANTT


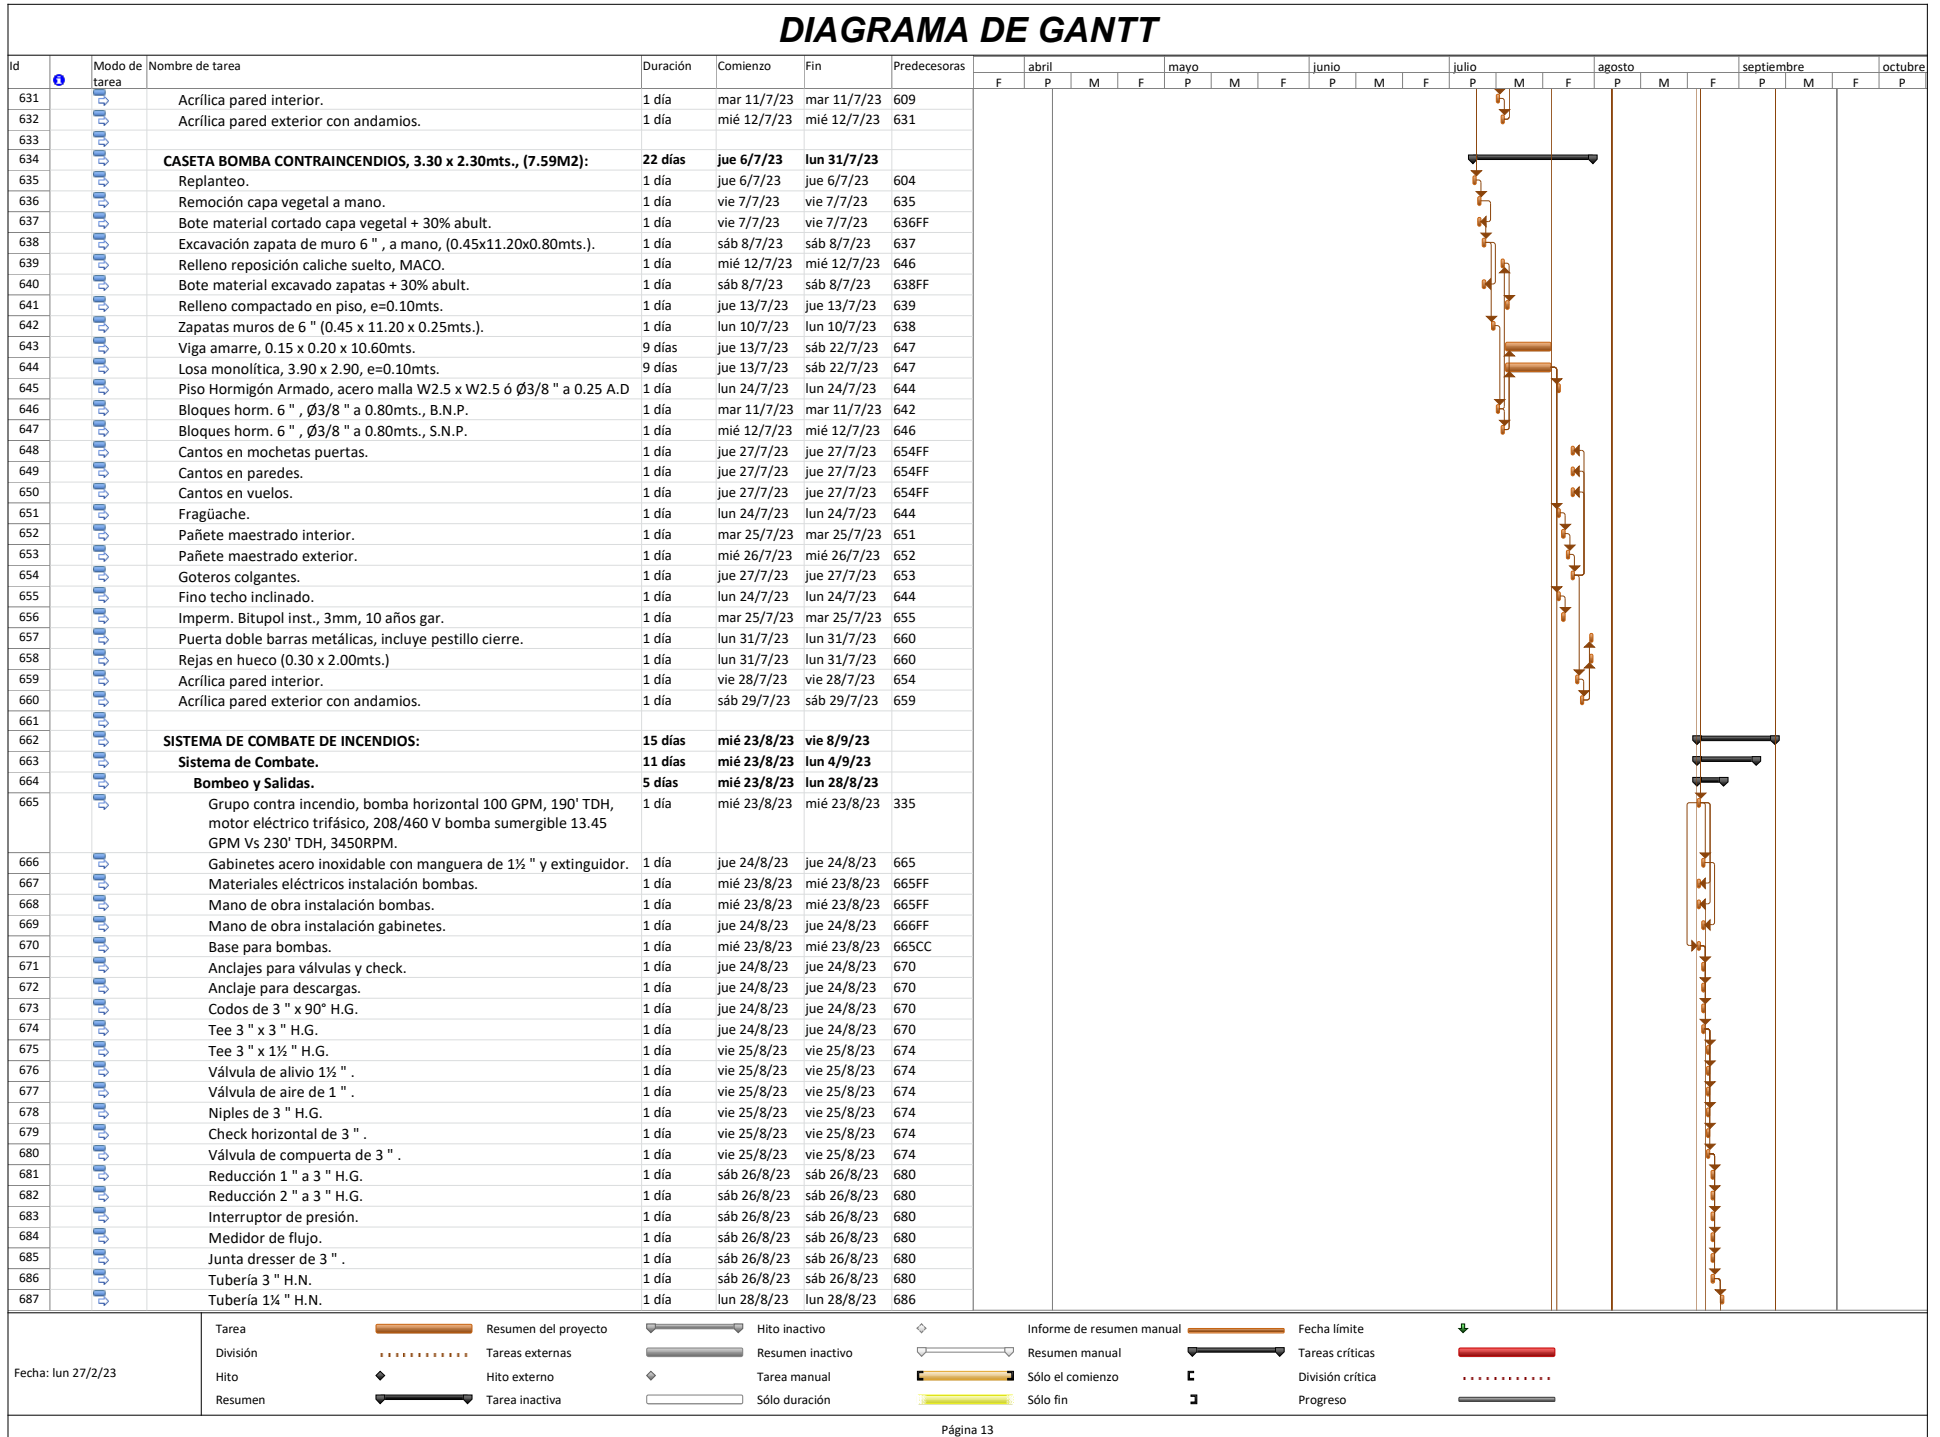


DIAGRAMA DE GANTT

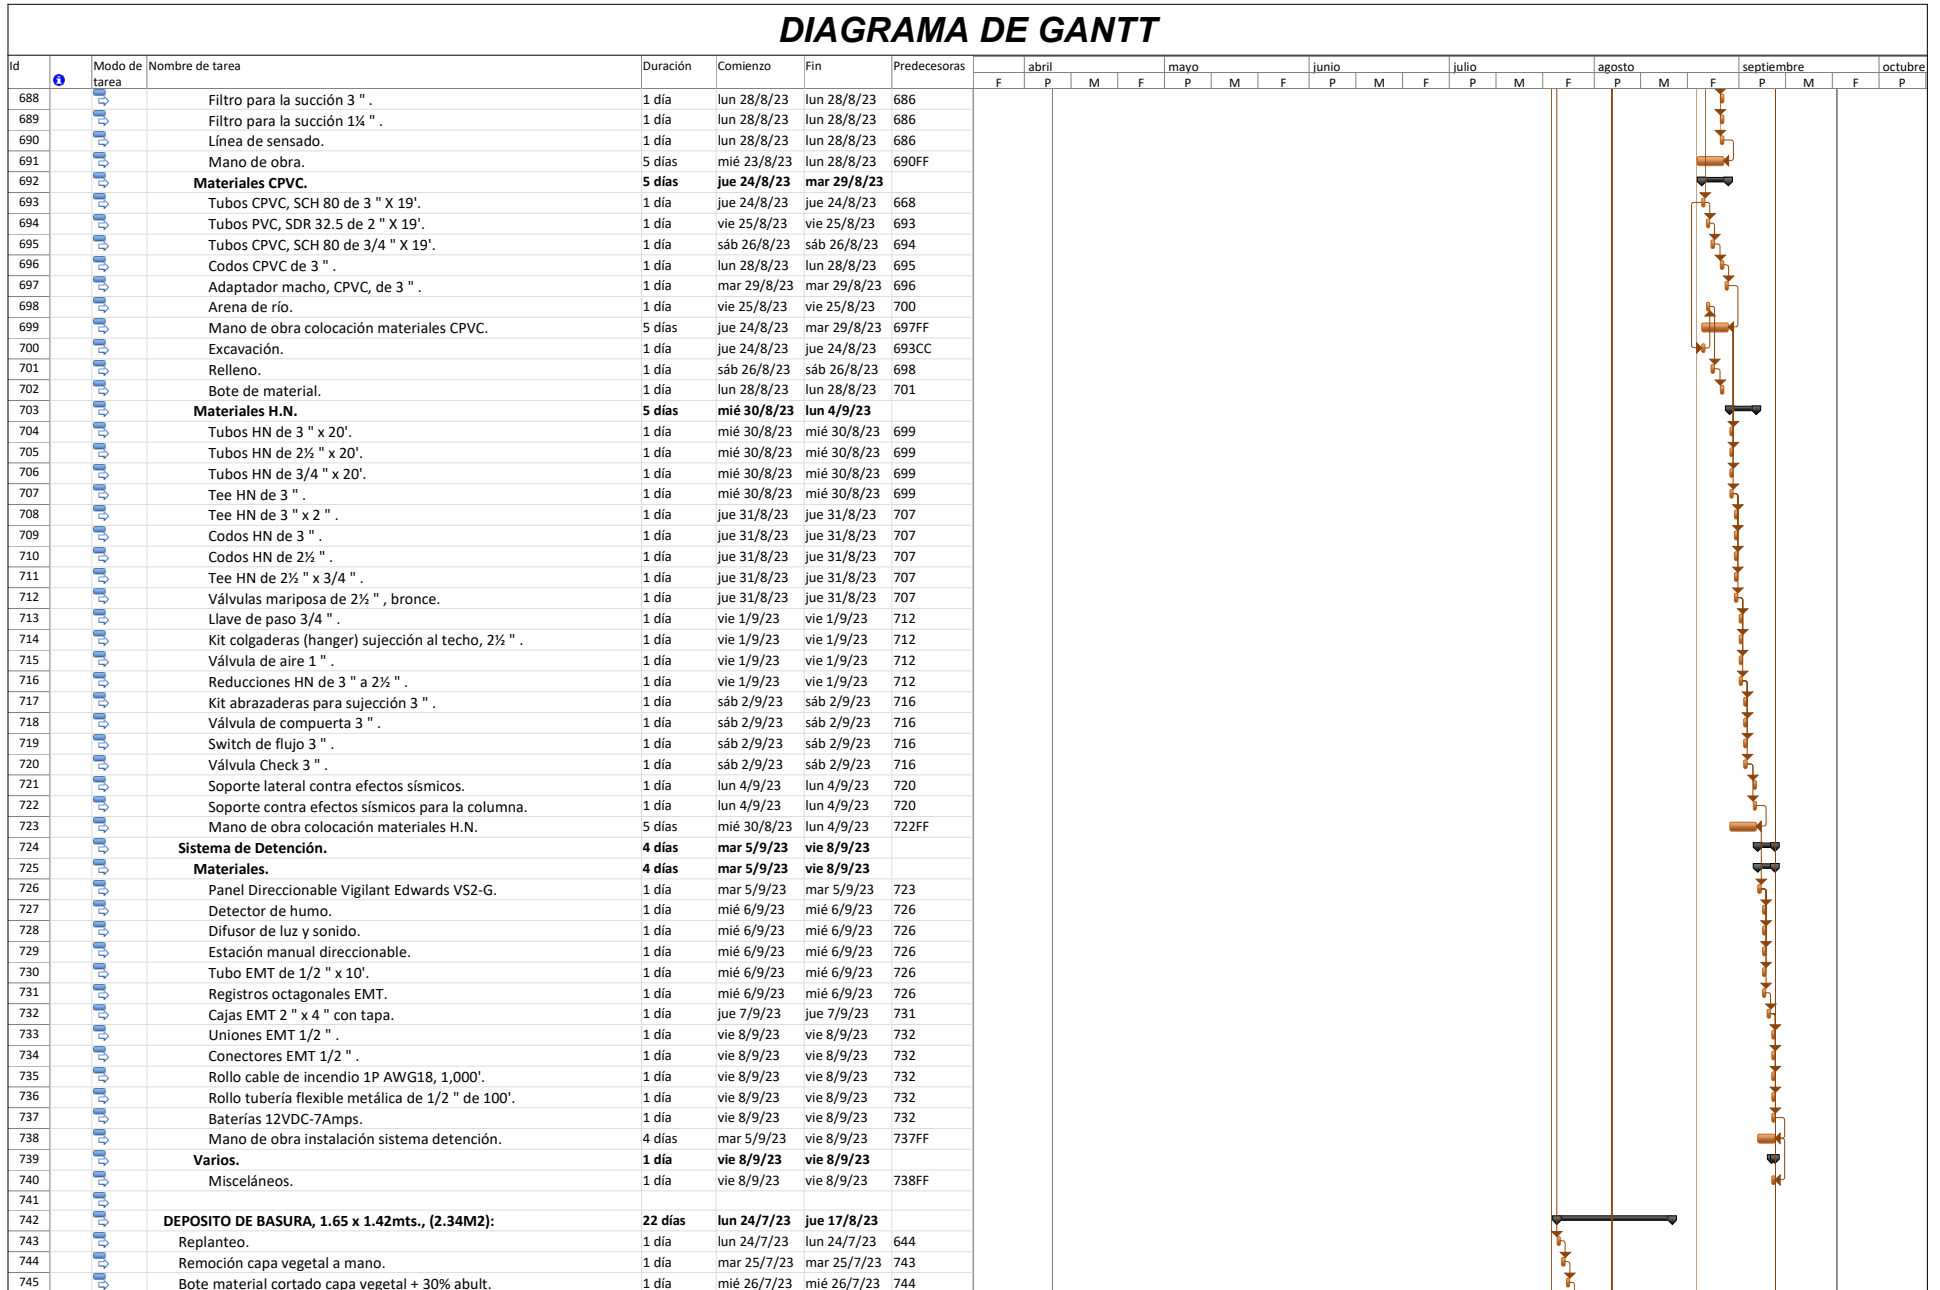

Fecha: lun 27/2/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

↓

Página 14

DIAGRAMA DE GANTT

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	abril							mayo			junio			julio			agosto				septiembre			octubre
								F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	
746			Excavación zapata de muro 6 " , a mano, (0.45x6.14x0.80mts.).	1 día	jue 27/7/23	jue 27/7/23	745																								
747			Relleno reposición caliche suelto, MACO.	1 día	lun 31/7/23	lun 31/7/23	753																								
748			Bote material excavado zapatas + 30% abult.	1 día	jue 27/7/23	jue 27/7/23	746FF																								
749			Relleno compactado en piso, e=0.10mts.	1 día	mar 1/8/23	mar 1/8/23	747																								
750			Zapatas muros de 6 " (0.45 x 6.14 x 0.25mts.).	1 día	vie 28/7/23	vie 28/7/23	746																								
751			Losa monolítica, 1.65 x 1.42, e=0.10mts.	9 días	mar 1/8/23	jue 10/8/23	754																								
752			Piso Hormigón Armado, acero malla W2.5 x W2.5 ó Ø3/8 " a 0.25 A.D	1 día	vie 11/8/23	vie 11/8/23	751																								
753			Bloques horm. 6 " , Ø3/8 " a 0.80mts., B.N.P.	1 día	sáb 29/7/23	sáb 29/7/23	750																								
754			Bloques horm. 6 " , Ø3/8 " a 0.80mts., S.N.P.	1 día	lun 31/7/23	lun 31/7/23	753																								
755			Cantos.	1 día	lun 14/8/23	lun 14/8/23	758FF																								
756			Fragüache.	1 día	vie 11/8/23	vie 11/8/23	751																								
757			Pañete maestrado interior.	1 día	sáb 12/8/23	sáb 12/8/23	756																								
758			Pañete maestrado exterior.	1 día	lun 14/8/23	lun 14/8/23	757																								
759			Fino techo plano.	1 día	vie 11/8/23	vie 11/8/23	751																								
760			Puerta en tola con barras metálicas, incluye pestillos de cierre.	1 día	jue 17/8/23	jue 17/8/23	762																								
761			Acrílica pared interior.	1 día	mar 15/8/23	mar 15/8/23	758																								
762			Acrílica pared exterior con andamios.	1 día	mié 16/8/23	mié 16/8/23	761																								
763																															
764			AMBIENTACION, 1ER. NIVEL:	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
765			Lobby de Entrada / Información.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
766			Planta para macetero.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
767			Maceteros.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
768			Area Espera (Oficialia).	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
769			Planta para macetero.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
770			Maceteros.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
771			Caja.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
772			Planta para macetero.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
773			Maceteros.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
774			Digitación.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
775			Planta para macetero.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
776			Maceteros.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
777			Archivo de Oficialía.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
778			Planta para macetero.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
779			Maceteros.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
780			Asistente Administrativo.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
781			Planta decorativa sobre escritorio.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
782			Planta para macetero.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
783			Maceteros.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
784			Oficial Civil.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
785			Planta decorativa sobre escritorio.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
786			Planta para macetero.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
787			Maceteros.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
788			Area Espera (Oficial Civil y Asistente Admvo).	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
789			Planta para macetero.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
790			Maceteros.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
791			Encargado Cedulación.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
792			Planta decorativa sobre escritorio.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
793			Planta para macetero.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
794			Maceteros.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
795			Cedulación y Area Espera.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
796			Planta para macetero.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
797			Maceteros.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
798			Areas Comunes.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23																									
799			Planta para macetero.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
800			Maceteros.	1 día	vie 8/9/23	vie 8/9/23	191																								
801																															
802			AMBIENTACION, 2DO. NIVEL:	1 día	sáb 9/9/23	sáb 9/9/23																									
803			Matriz de Cómputos.	1 día	sáb 9/9/23	sáb 9/9/23																									
804			Planta para macetero.	1 día	sáb 9/9/23	sáb 9/9/23	800																								

Fecha: lun 27/2/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Tarea manual

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Página 15

DIAGRAMA DE GANTT

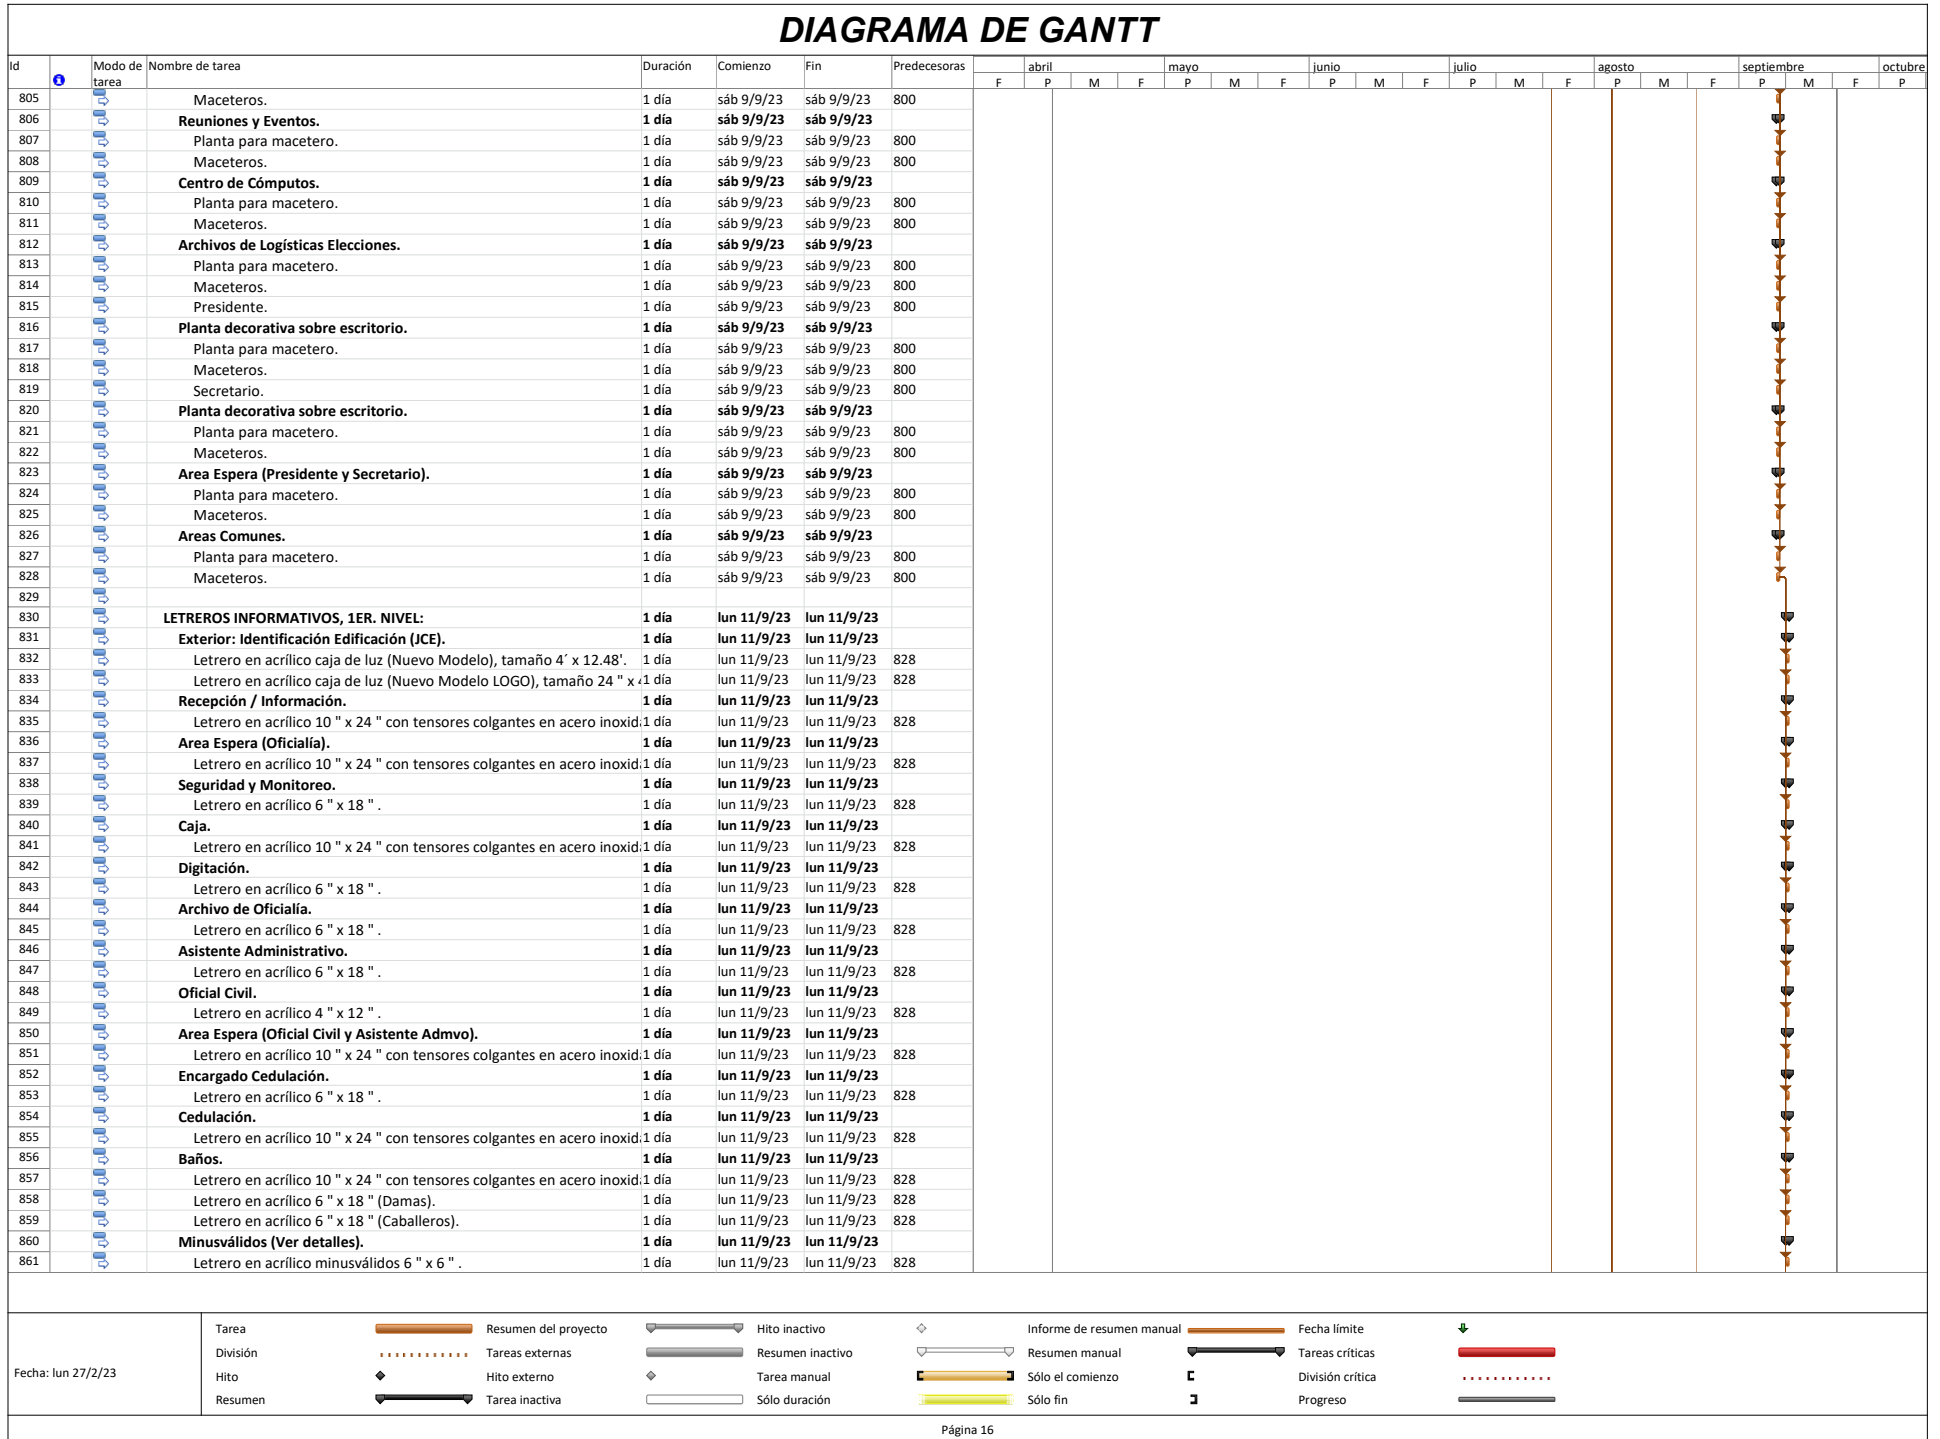


DIAGRAMA DE GANTT

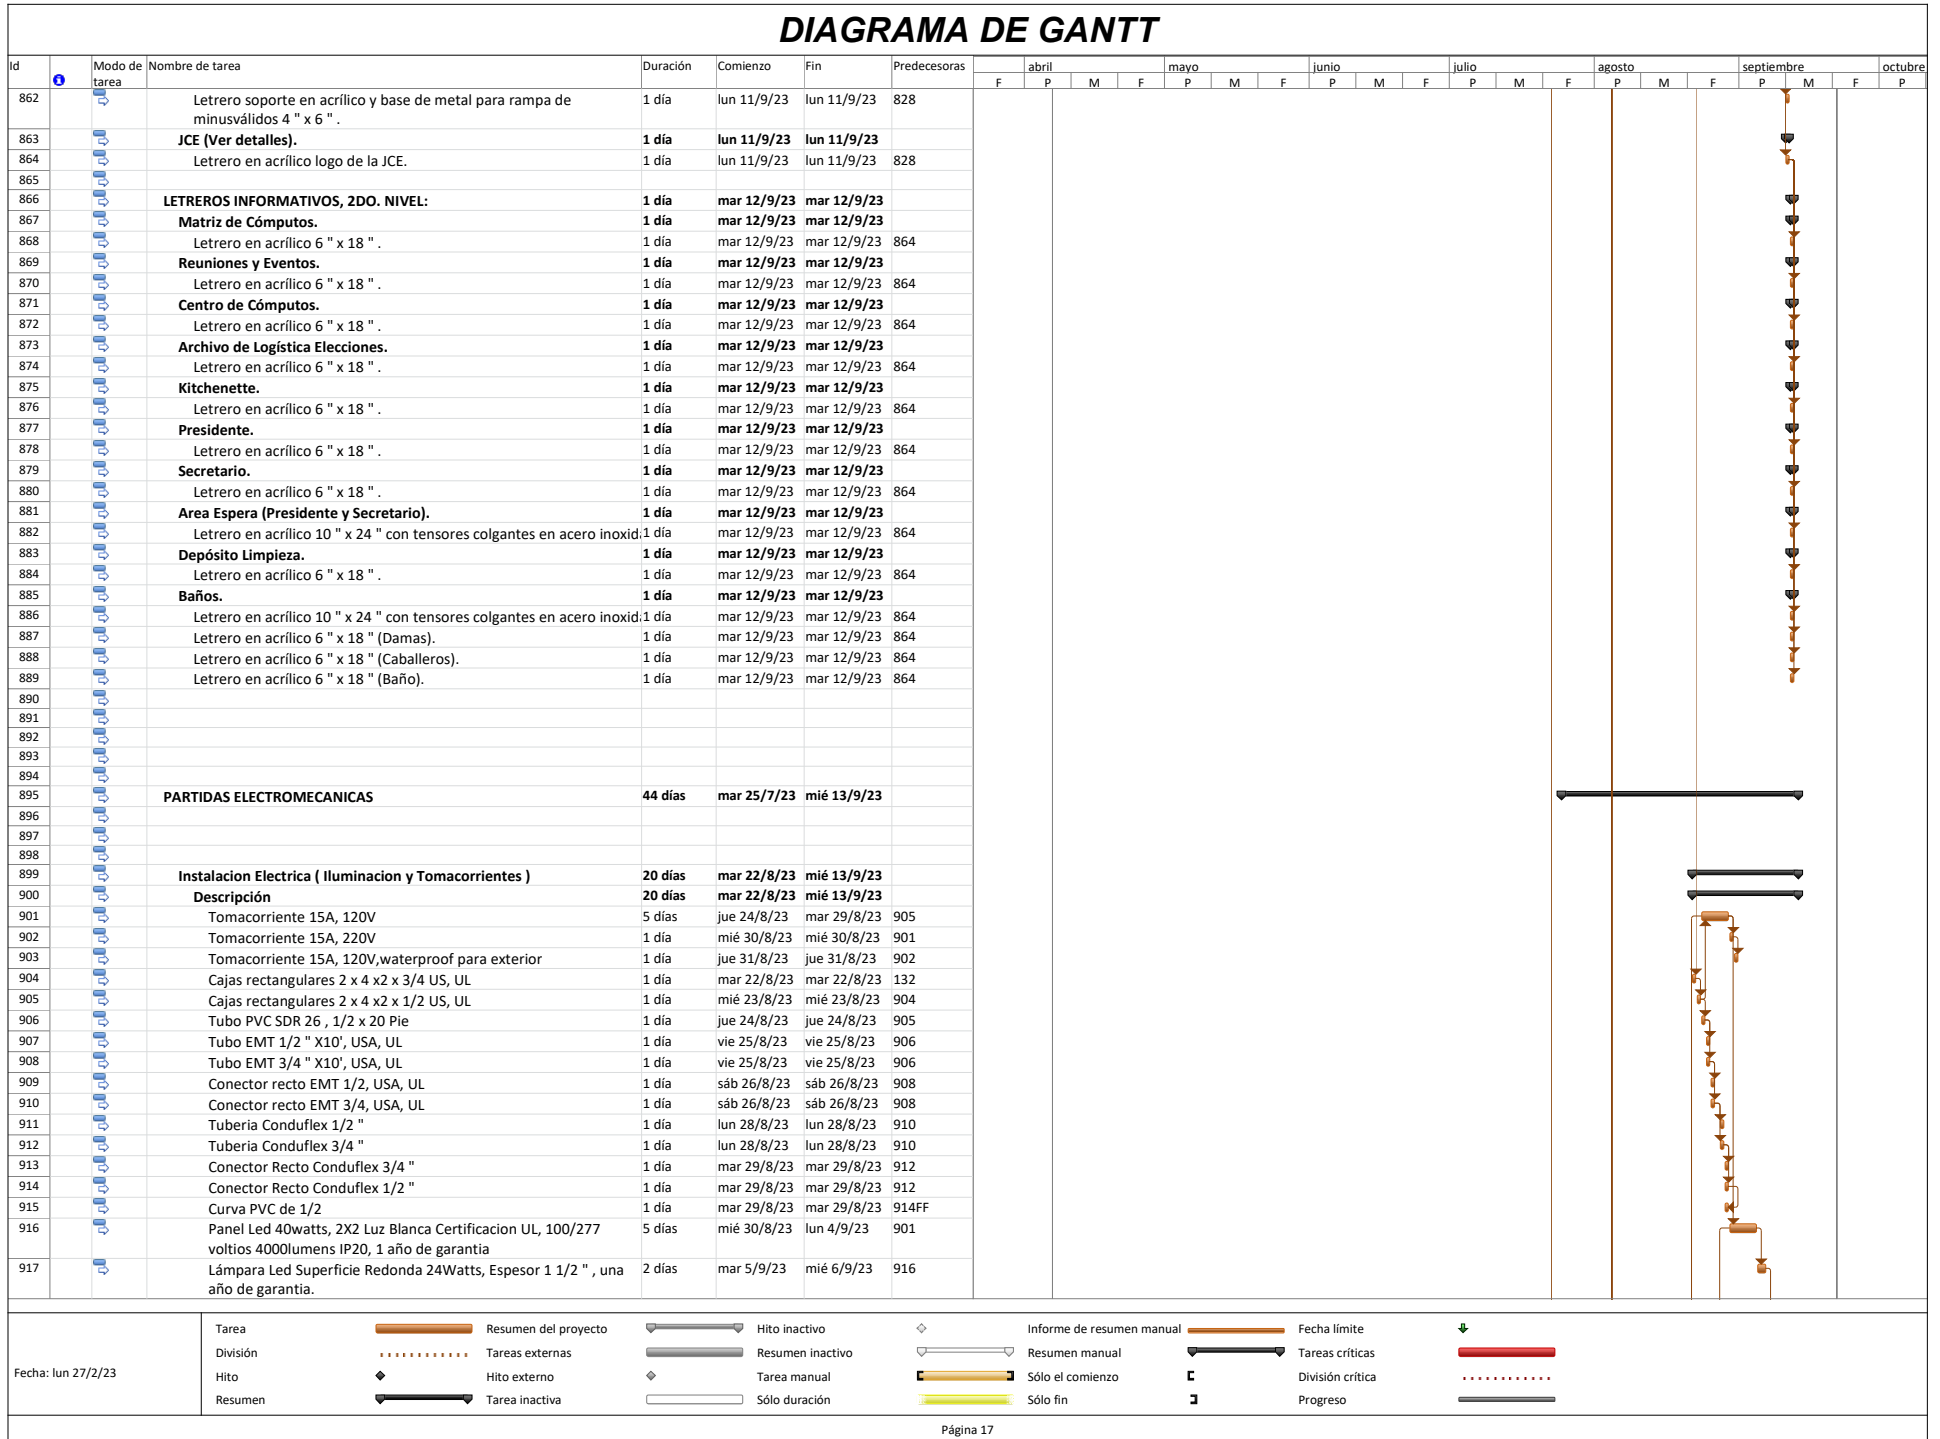


DIAGRAMA DE GANTT

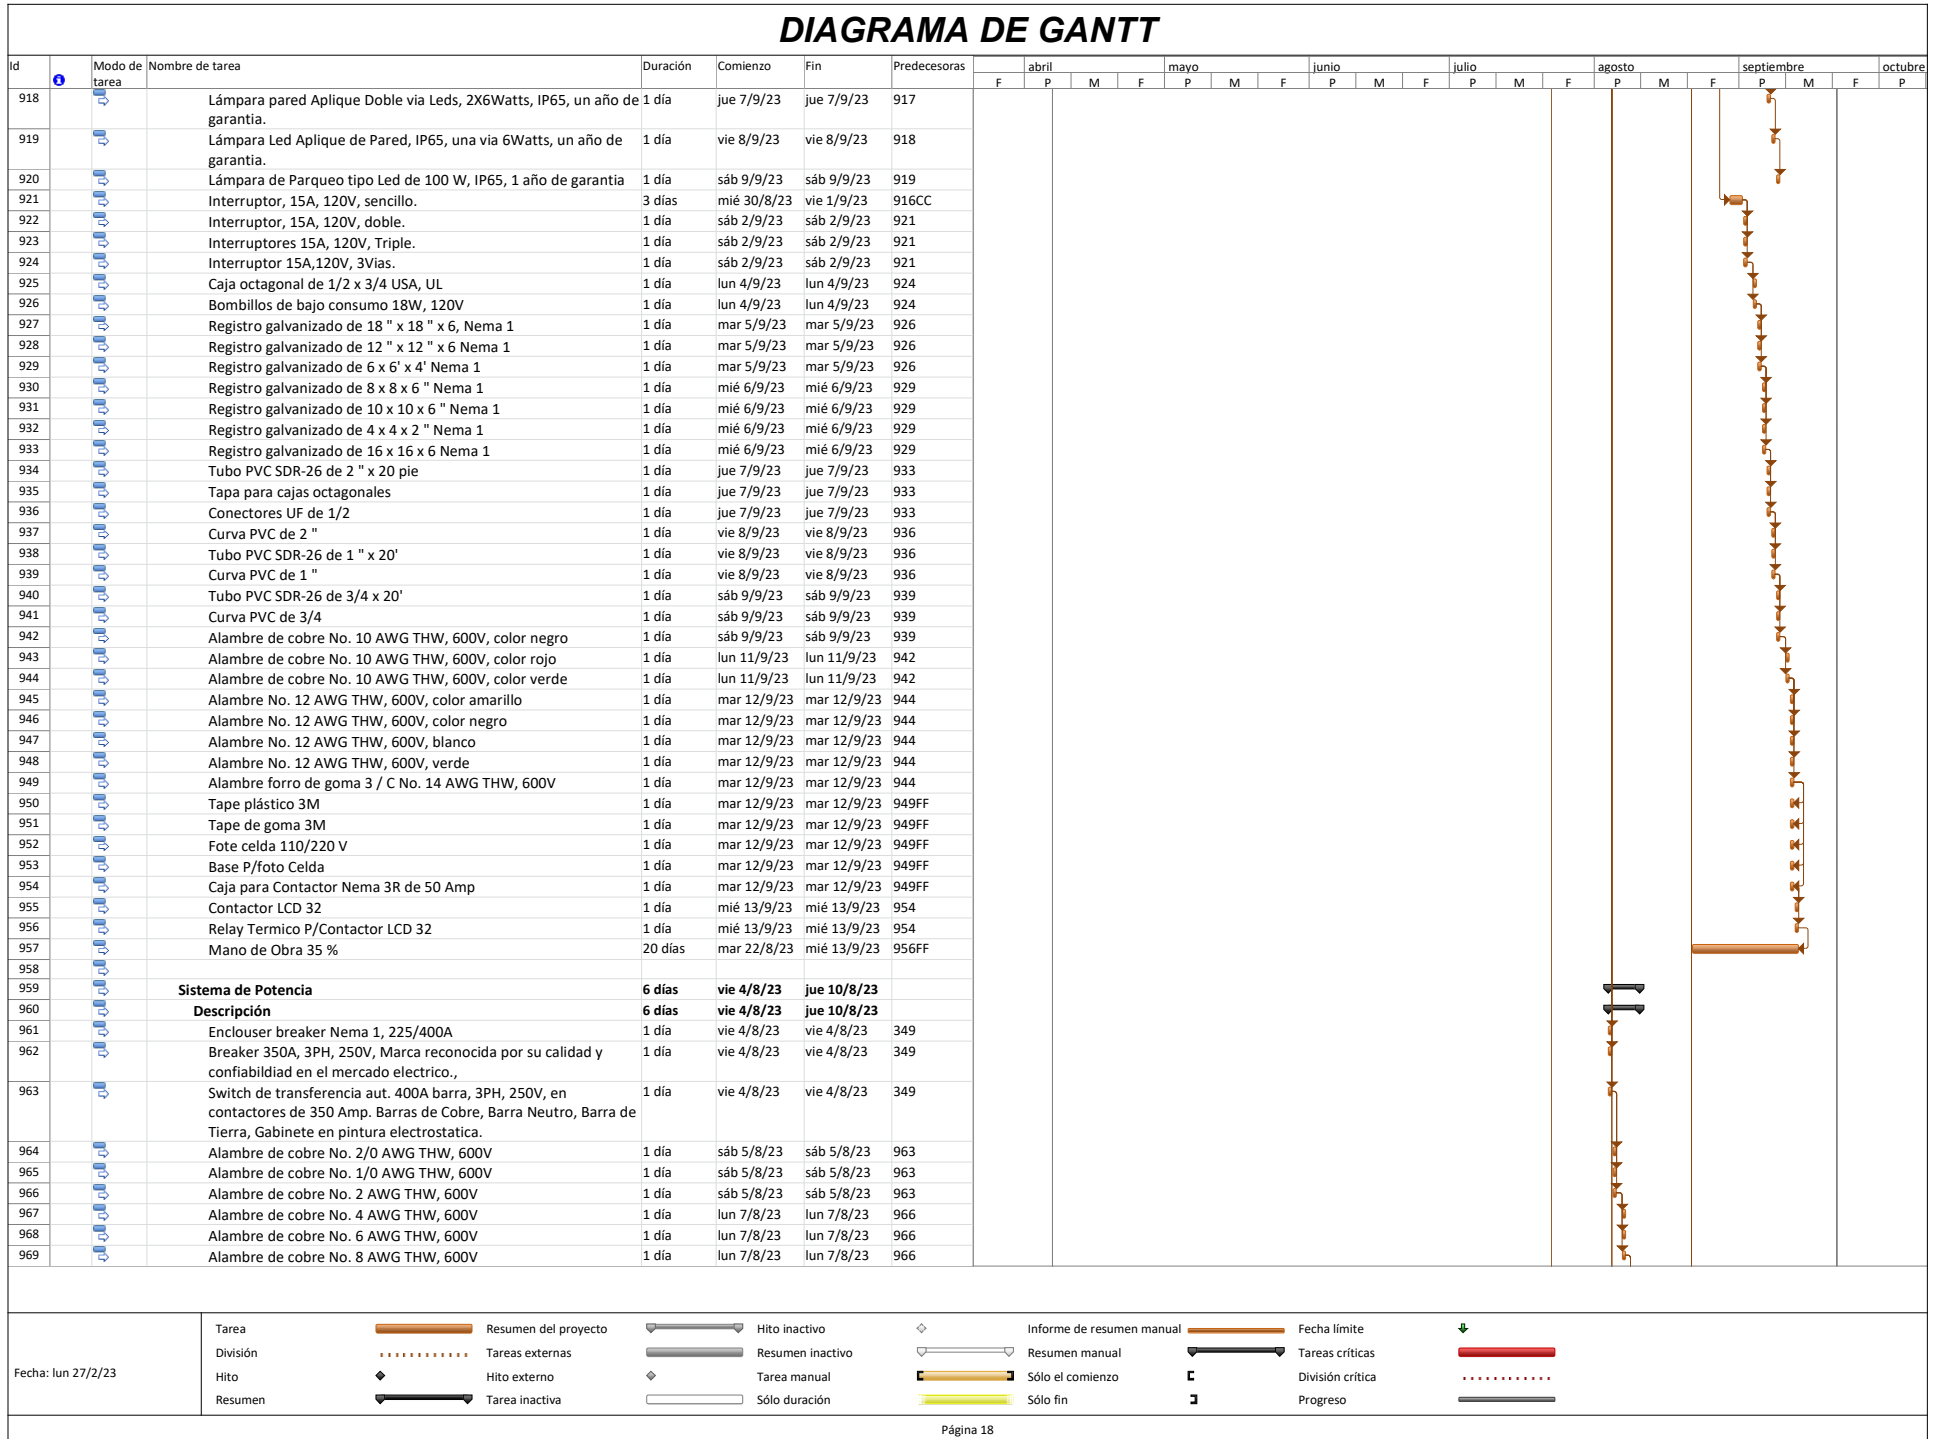


DIAGRAMA DE GANTT


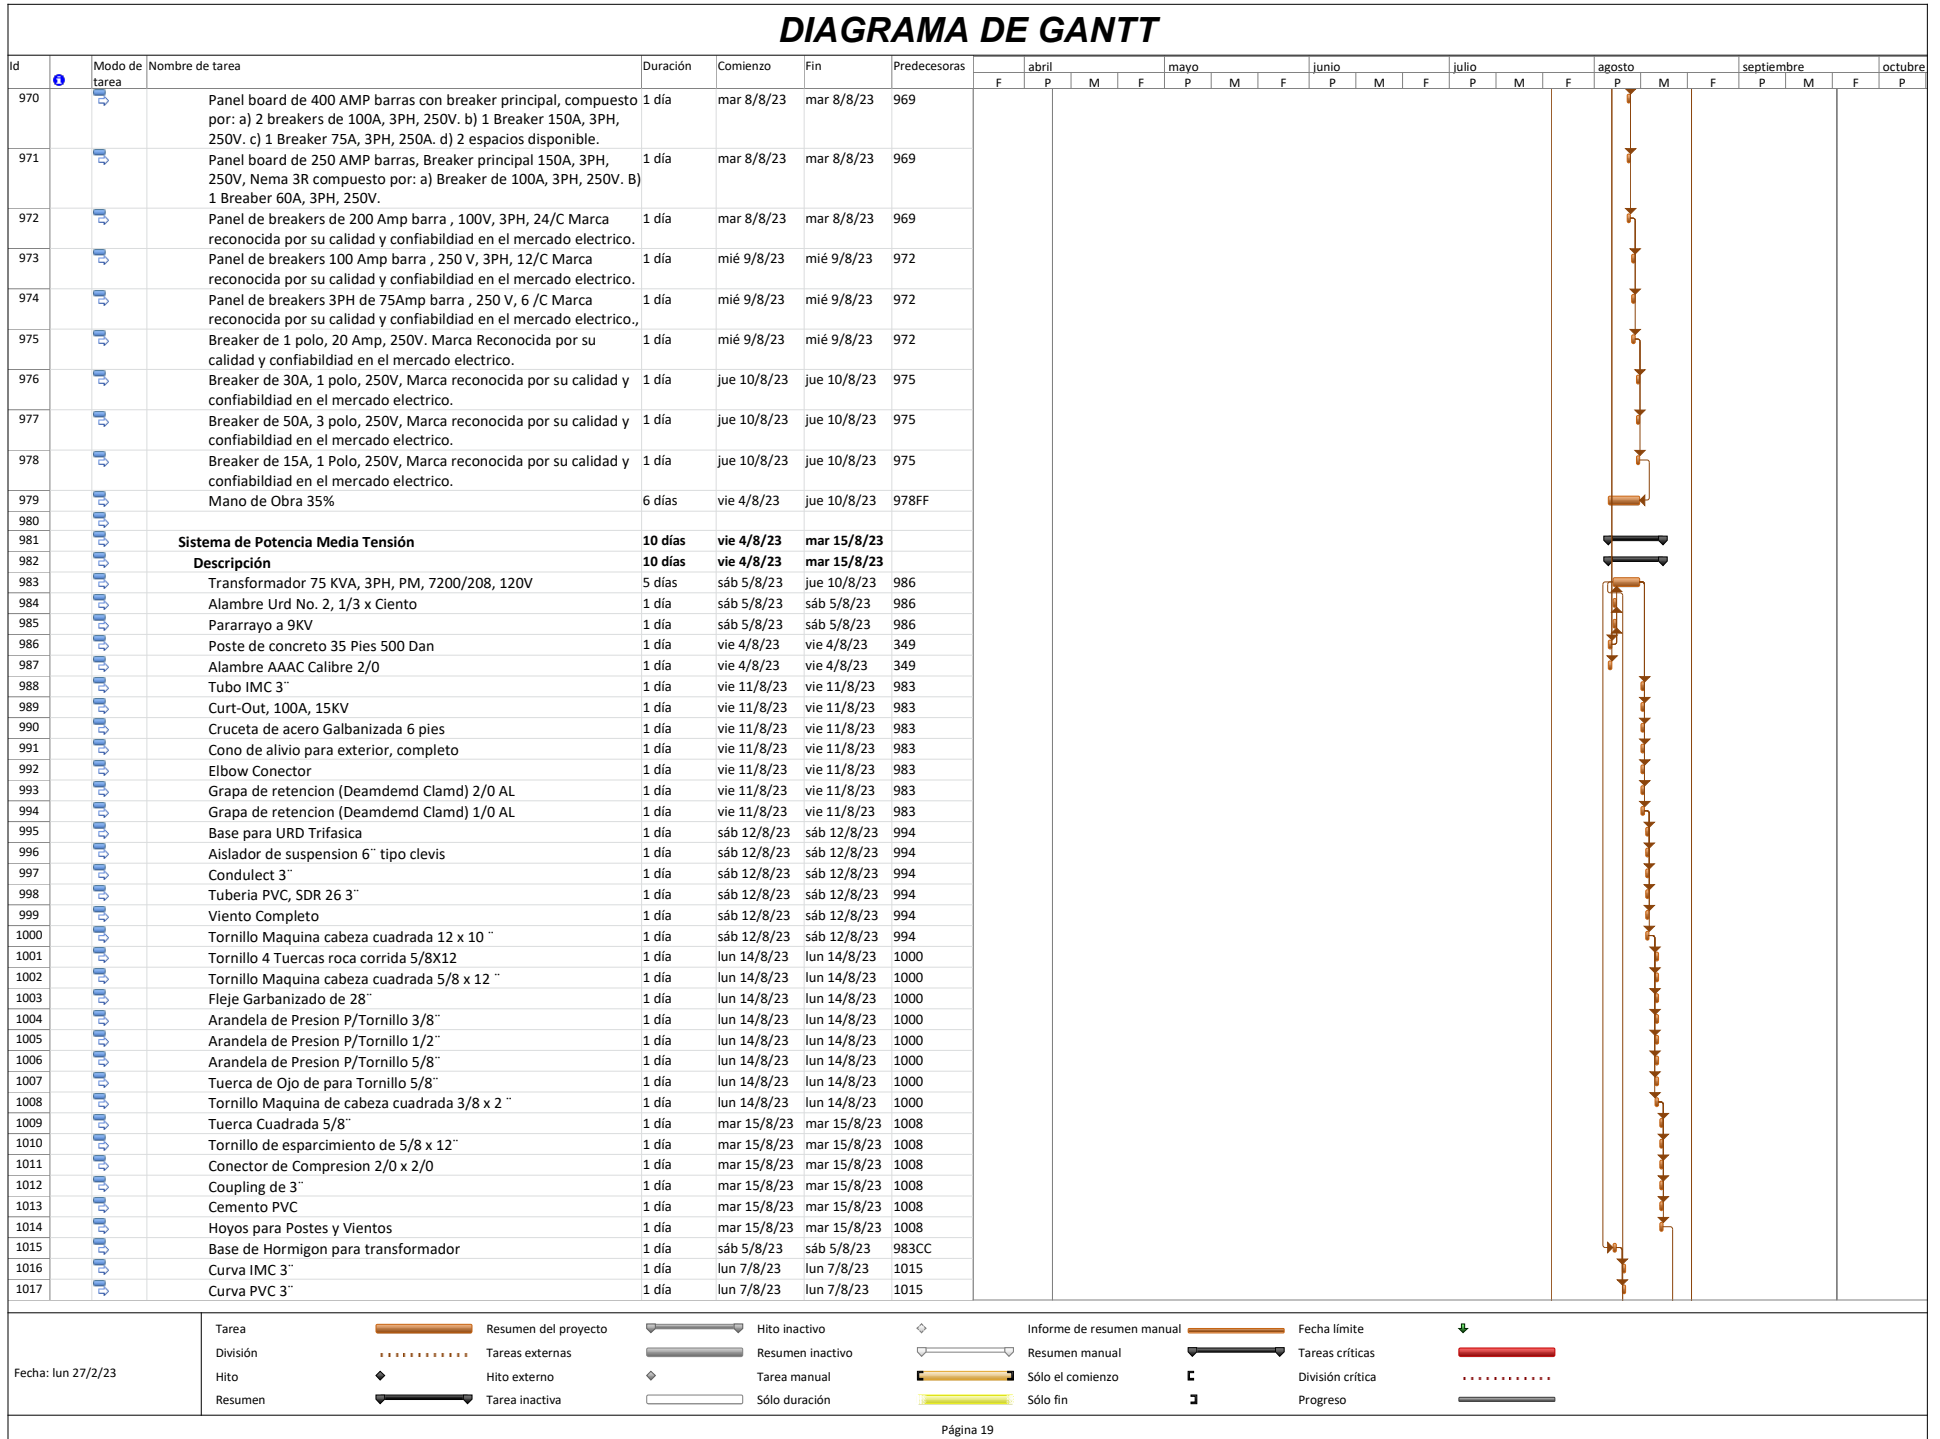


DIAGRAMA DE GANTT

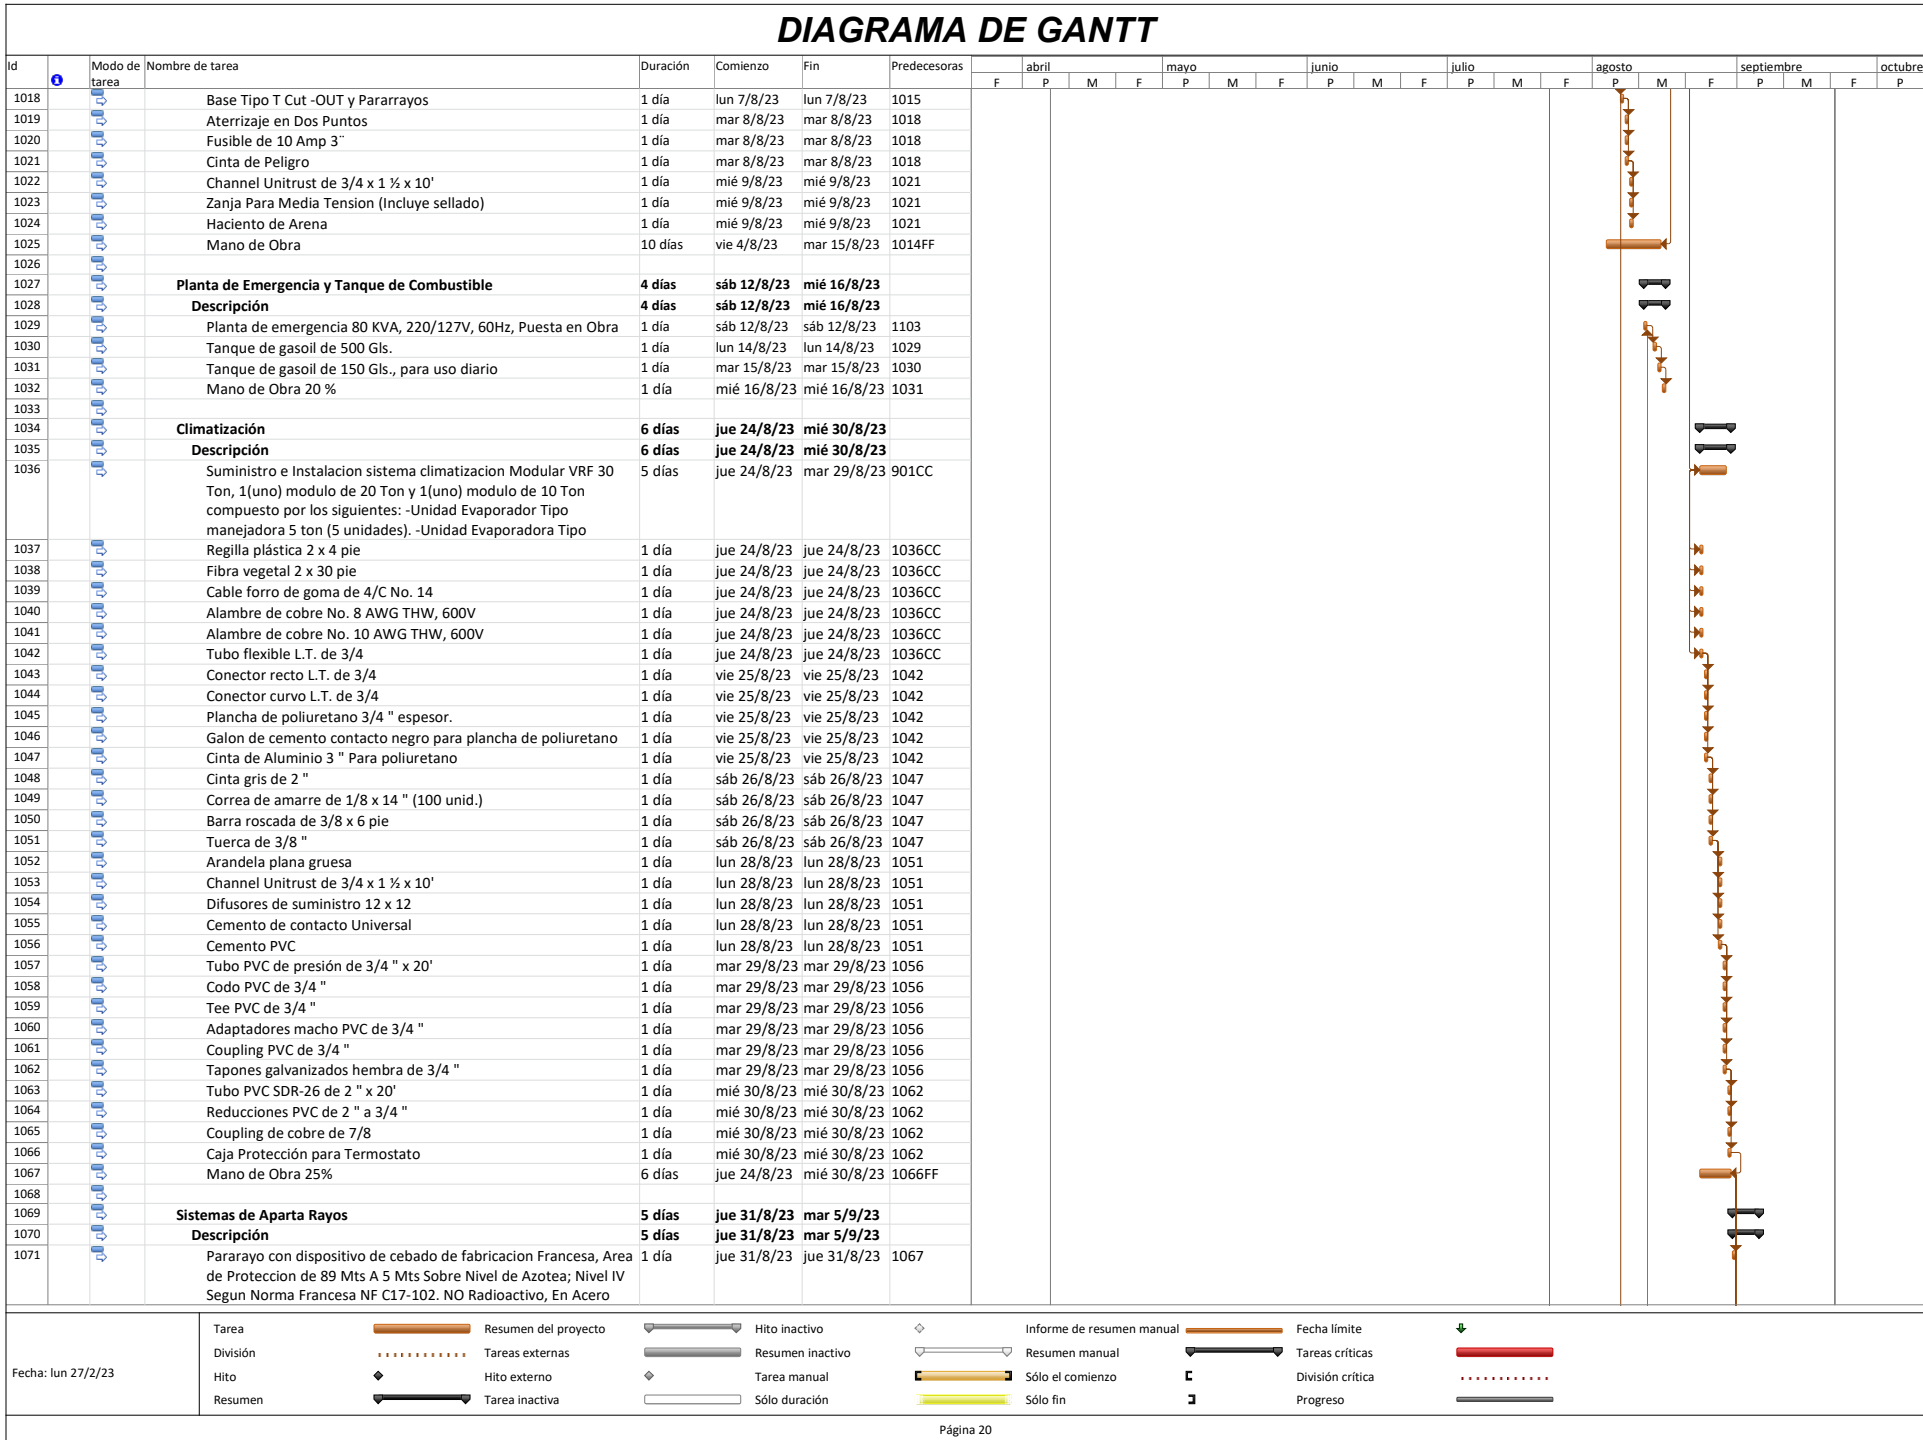

Página 20

DIAGRAMA DE GANTT

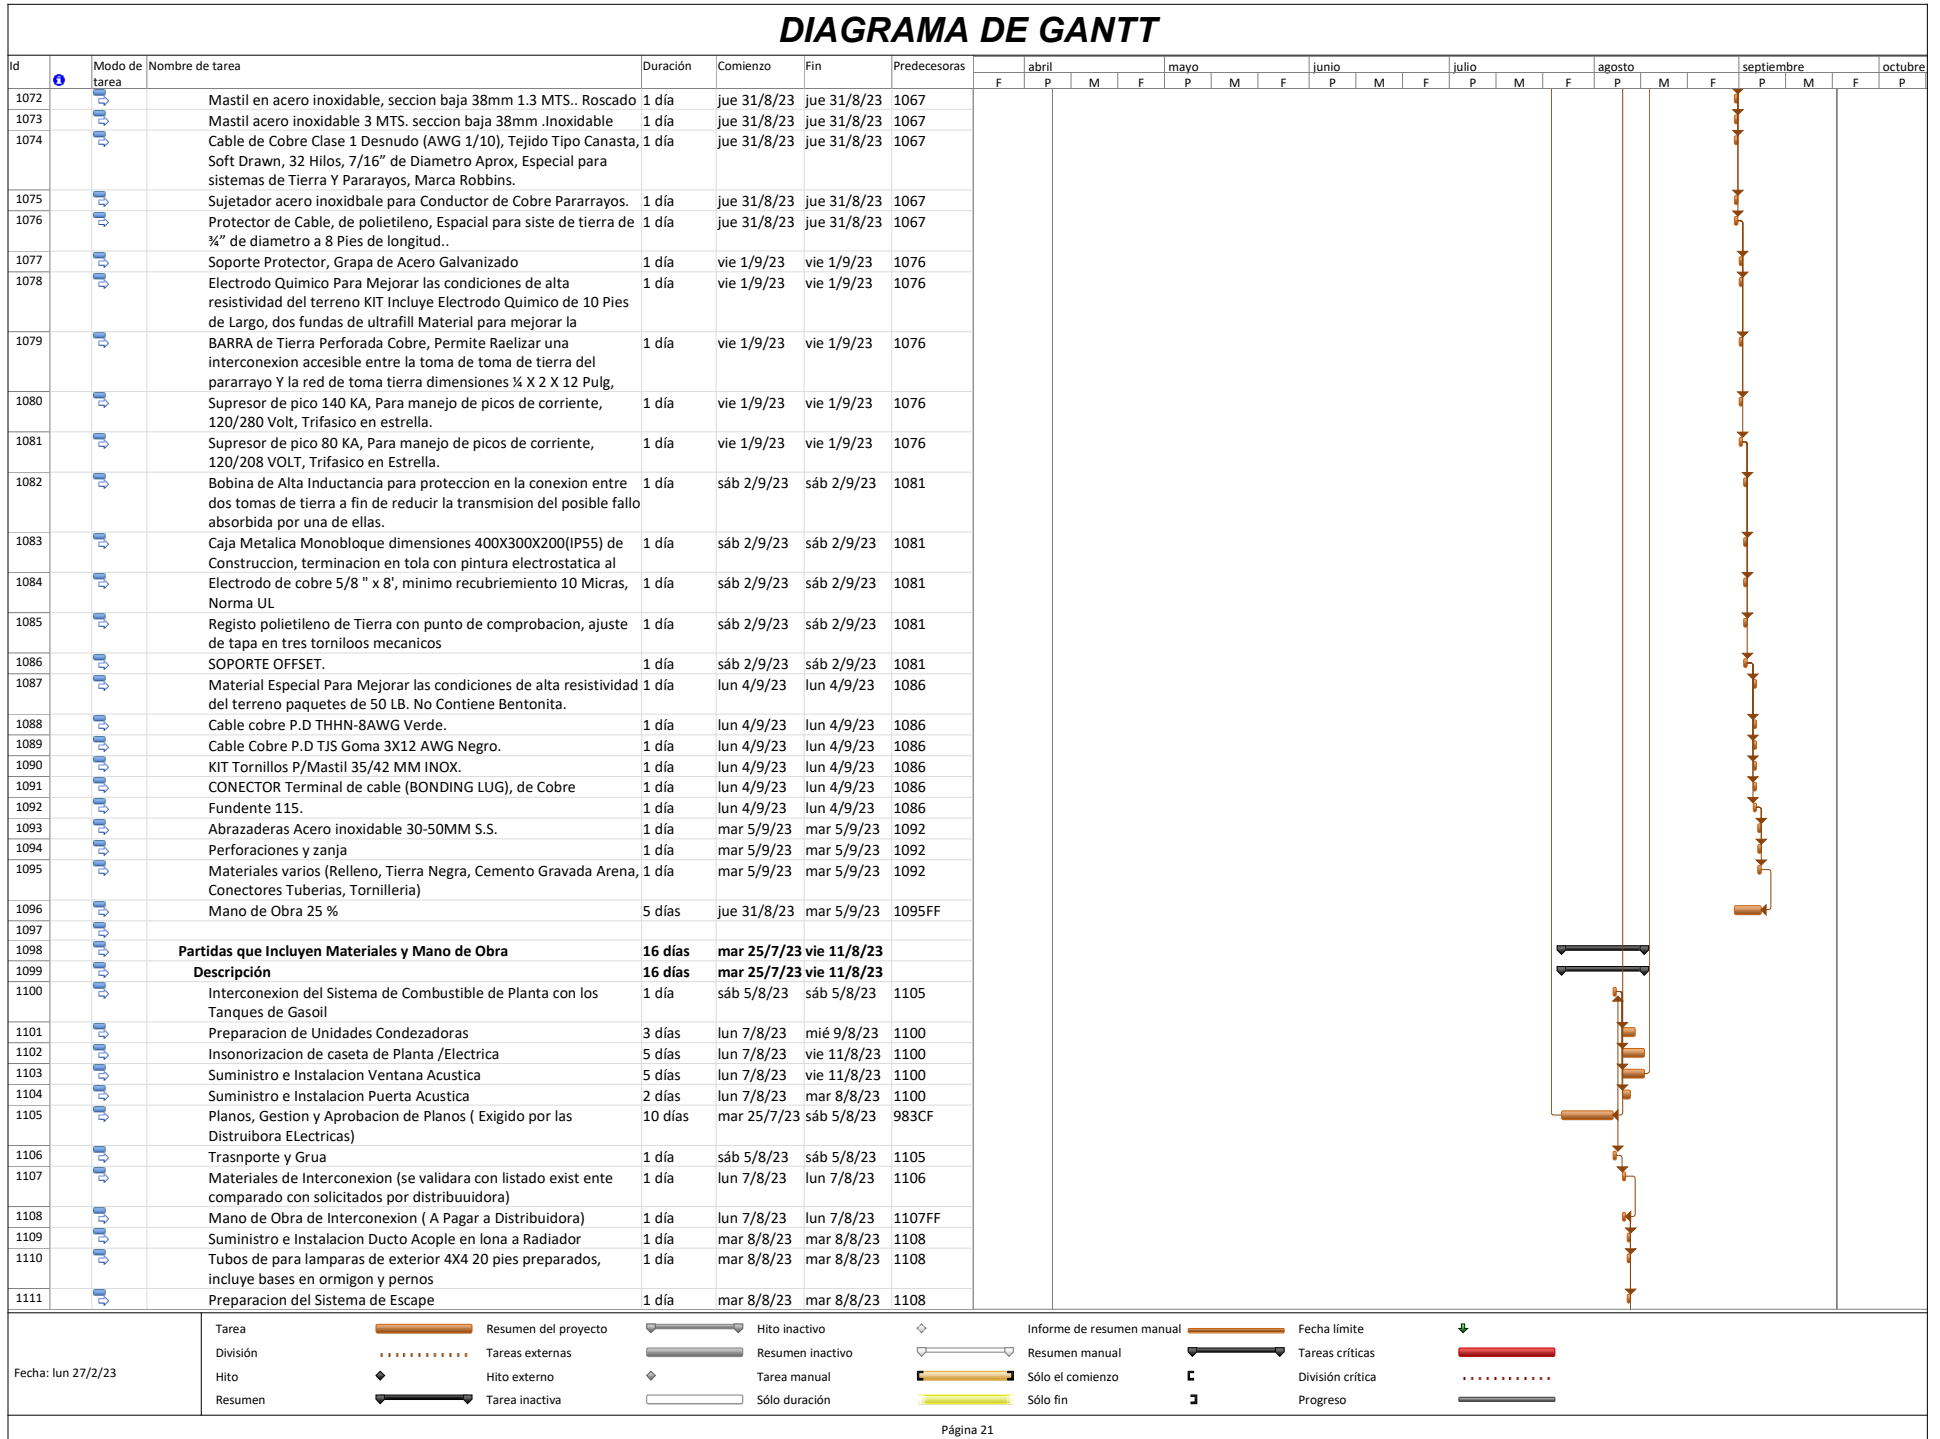


DIAGRAMA DE GANTT

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	abril				mayo			junio			julio			agosto			septiembre			octubre
							F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P
1112		Escalera tipo marinero con proteccion de espalda de Acceso a techo de caseta de Planta	1 día	mar 8/8/23	mar 8/8/23	1108																				

Fecha: lun 27/2/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Página 22
