

1	de tarea	IMPERMEABILIZACION EN AREA DE 42 dias?	Lun 26/8/24	mar 15/10/24	
2		AREA DE LOGISTICA (AREA= 2747.31 M2)	23 dias?	Lun 26/8/24 dom 22/9/24	
3		Desinstalacion de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio	2 dias	Lun 26/8/24 mié 28/8/24	
4		Desinstalacion de Caballete, Caños, Cubre Falta de aluzinc y Tubos y Piezas de PVC.	1 día?	mié 28/8/24 jue 29/8/24	
5		Suministro e Instalacion de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio de 1.00 mts, x 3.66 mts.	3 dias	jue 29/8/24 lun 2/9/24	
6		Limpieza del Area	1 día?	Lun 2/9/24 mar 3/9/24	
7		Suministro de Lona Asfaltica de 3 mms.	1 día?	mié 28/8/24 jue 29/8/24	
8		Suministro de Primer (RC-2)	1 día?	mié 28/8/24 jue 29/8/24	
9		Caballete de Aluzinc (L= 10 Pies)	2 dias	mar 3/9/24 jue 5/9/24	
10		Caños de Aluzinc de 9"x16"x10'	5 dias	vie 6/9/24 mié 11/9/24	
11		Cubre Falta 12"x12"x10'	2 dias	jue 12/9/24 sáb 14/9/24	
12		Boquillas de 6"	2 dias	sáb 14/9/24 lun 16/9/24	
13		Tubos φ6"x19' PVC SCH-40	1 día	sáb 14/9/24 dom 15/9/24	
14		Codos de 6"	1 día?	sáb 14/9/24 dom 15/9/24	
15		Mano de Obra de Impermeabilizante y de desague pluvial	15 dias	mar 3/9/24 sáb 21/9/24	
16		Bote de Escombros	1 día?	sáb 21/9/24 dom 22/9/24	
17		AREA DE COMEDOR (AREA= 1692.77 M2)	19 dias?	dom 22/9/24 mar 15/10/24	



Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Mod/Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin																						
de tarea					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L					
					26 ago '24														2 sep '24				9 sep			
18	Desinstalacion de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio (52.00 Unids.)	1 día?	dom 22/9/24	lun 23/9/24																						
19	Desinstalacion de Caballote, Caños, Cubre Falta de aluzinc y Tubos y Piezas de PVC.	2 días	mar 24/9/24	jue 26/9/24																						
20	Suministro e Instalacion de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio de 3' x 10'	2 días	jue 26/9/24	sáb 28/9/24																						
21	Limpieza del Area	1 día?	sáb 28/9/24	dom 29/9/24																						
22	Suministro de Lona Asfáltica de 3 mms.	1 día	mar 24/9/24	mié 25/9/24																						
23	Suministro de Primer (RC-2)	1 día?	mié 25/9/24	jue 26/9/24																						
24	Caballote de Aluzinc (L= 10 Pies)	2 días	lun 30/9/24	mié 2/10/24																						
25	Caños de Aluzinc de 9"x16"x10'	4 días	mié 2/10/24	lun 7/10/24																						
26	Cubre Falta 12"x12"x10'	2 días	lun 7/10/24	mié 9/10/24																						
27	Boquillas de 6"	2 días	mié 9/10/24	sáb 12/10/24																						
28	Tubos ø6"x19' PVC SCH-40	1 día	sáb 12/10/24	dom 13/10/24																						
29	Codos de 6"	1 día?	sáb 12/10/24	dom 13/10/24																						
30	Mano de Obra de Impermeabilizante y de desague pluvial	12 días	lun 30/9/24	lun 14/10/24																						
31	Bote de Escombros	1 día?	lun 14/10/24	mar 15/10/24																						
32	Limpieza Final	1 día?	lun 14/10/24	mar 15/10/24																						

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

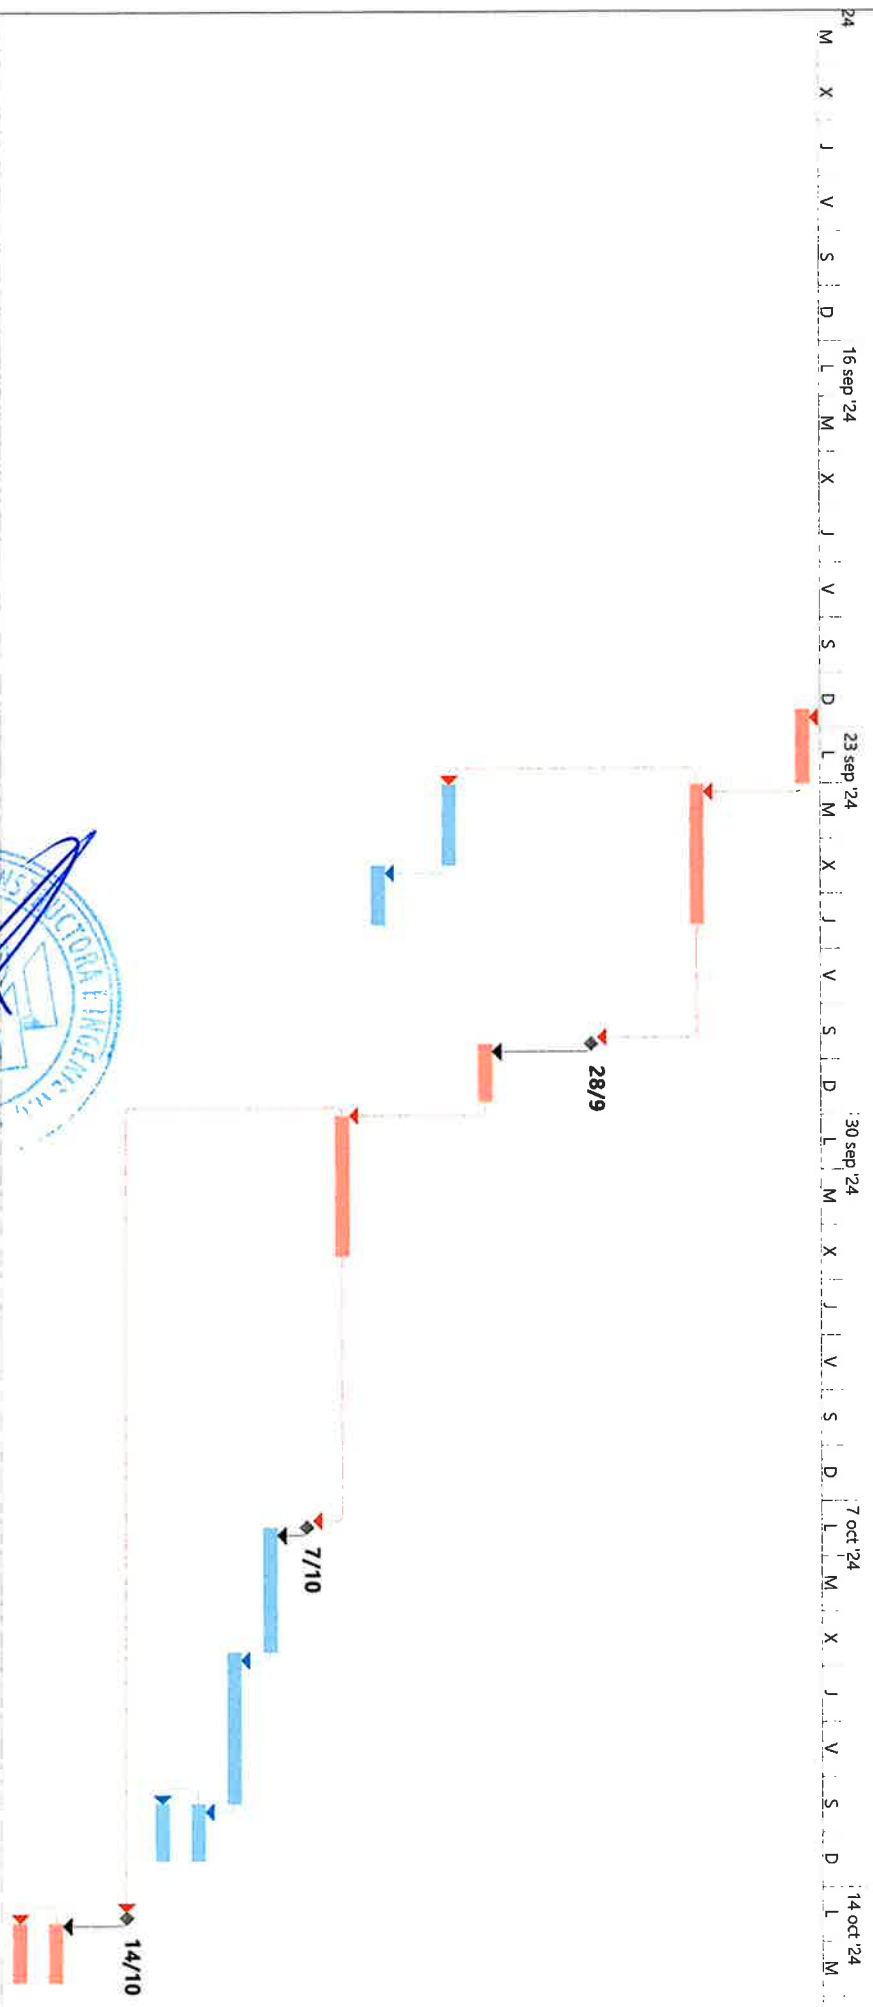

Proyecto: IMPERMEABILIZACION Fecha: mar 30/7/24	Tarea	Hito inactivo	Resumen inactivo	Resumen manual	Informe de resumen manual	Resumen manual	Resumen del proyecto	Tarea inactiva
	División	Resumen inactivo	Resumen manual	Informe de resumen manual	Resumen manual	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea inactiva
	Hito	Resumen inactivo	Resumen manual	Informe de resumen manual	Resumen manual	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea inactiva
	Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Informe de resumen manual	Resumen manual	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea inactiva
	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Resumen manual	Informe de resumen manual	Resumen manual	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea inactiva
