

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1		PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LATERAL LAS COLINAS.	28.75 days	Tue 11/5/24	Wed 12/11/24																								
2		INICIO	0 days	Tue 11/5/24	Tue 11/5/24																								
3		Preliminares:	12.5 days	Tue 11/5/24	Wed 11/20/24																								
4		Limpieza area	1 day	Tue 11/5/24	Tue 11/5/24	2																							
5		Replanteo general. (A= 147.05 M2)	0.5 days	Wed 11/20/24	Wed 11/20/24	10																							
6		Demolicion de Canaleta adyacente al Muro	1 day	Tue 11/5/24	Tue 11/5/24	455																							
7		Bote de escombros. (Aprox. 10.00 Camiones de 6 M3)	1 day	Tue 11/5/24	Tue 11/5/24	455																							
8		Movimiento de tierra	27.75 days	Tue 11/5/24	Wed 12/11/24																								
9		Demolicion de Muro de Contencion existente Con Compresor	7 days	Tue 11/5/24	Thu 11/14/24	6																							
10		Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente con Compresor	4 days	Thu 11/14/24	Tue 11/19/24	9																							
11		Excavacion de material proximo al muro (V= 5.00 mts. x 29.41 mts. x 5.00 mts. (Con Equipo)	2 days	Wed 11/20/24	Fri 11/22/24	5																							
12		Excavacion de zapata del muro (V= 1.15 mts. x 29.41 mts. x 2.60 mts. (Con compresor)	0.25 days	Fri 11/22/24	Fri 11/22/24	11																							
13		Relleno de Reposicion de Material Excavado (V= 0.60 x 2.00 x 29.41)M3	5 days	Wed 12/4/24	Wed 12/11/24	1555																							
14		Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	2.25 days	Wed 11/20/24	Fri 11/22/24	1155																							
15		Relleno compactado caliche (Con Equipo) (Factor de Comp.	5 days	Wed 12/4/24	Wed 12/11/24	20																							
16		Hormigon Simple y armado en:	9 days	Fri 11/22/24	Wed 12/4/24																								
17		Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata (V= 29.41 x 0.10 x 2.60)	1 day	Fri 11/22/24	Mon 11/25/24	12																							
18		Zapata de Muro de Contencion $\phi 3/4"$ @ 0.15 A.D. cara inferior y $\phi 1/2"$ @ 0.15 A.D en cara superior (V= 2.60 mts x 0.40 mts x 29.41 mts)	2 days	Mon 11/25/24	Wed 11/27/24	18																							
19																													




MP


ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
20		Muro de Contencion $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 6 days A.D. En cara izquierda y de $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 long. Y $\phi\frac{3}{4}$ " @ 0.15 transv. en cara derecha (V= (0.30+0.60)/2 x 5.00 x 29.41)m3	6 days	Wed 11/27/24	Wed 12/4/24	19	Maestro Varillero,AY varillero 1,AY varillero 2,AY varillero 3,AY varillero 4,AY	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
21																						
22		Suministro y colocacion de Lloraderos en muro y Construccion de Canaleta con Rejilla Metalica	10 days	Fri 11/22/24	Thu 12/5/24																	
23		Suministro y colocacion de lloraderos en muro de contencion con tubos $\phi 2$ " PVC SDR-26 (L= 0.60 Mts. c/u) (11.00 tubos $\phi 2$ "x 19' de PVC	6 days	Wed 11/27/24	Wed 12/4/24	20SS	Tubos de 2" PVC,AY															
24		Construccion de Canaleta con muros y piso de H.S. con Rejilla compuesta de angulares 2"x2" y Perfiles de 2"x1"	10 days	Fri 11/22/24	Thu 12/5/24	12	Excavadora,AY 1,AY 2,Hormigonera 1,Brigada de colocacion															
25		FIN	0 days	Wed 12/11/24	Wed 12/11/24	15																



4P

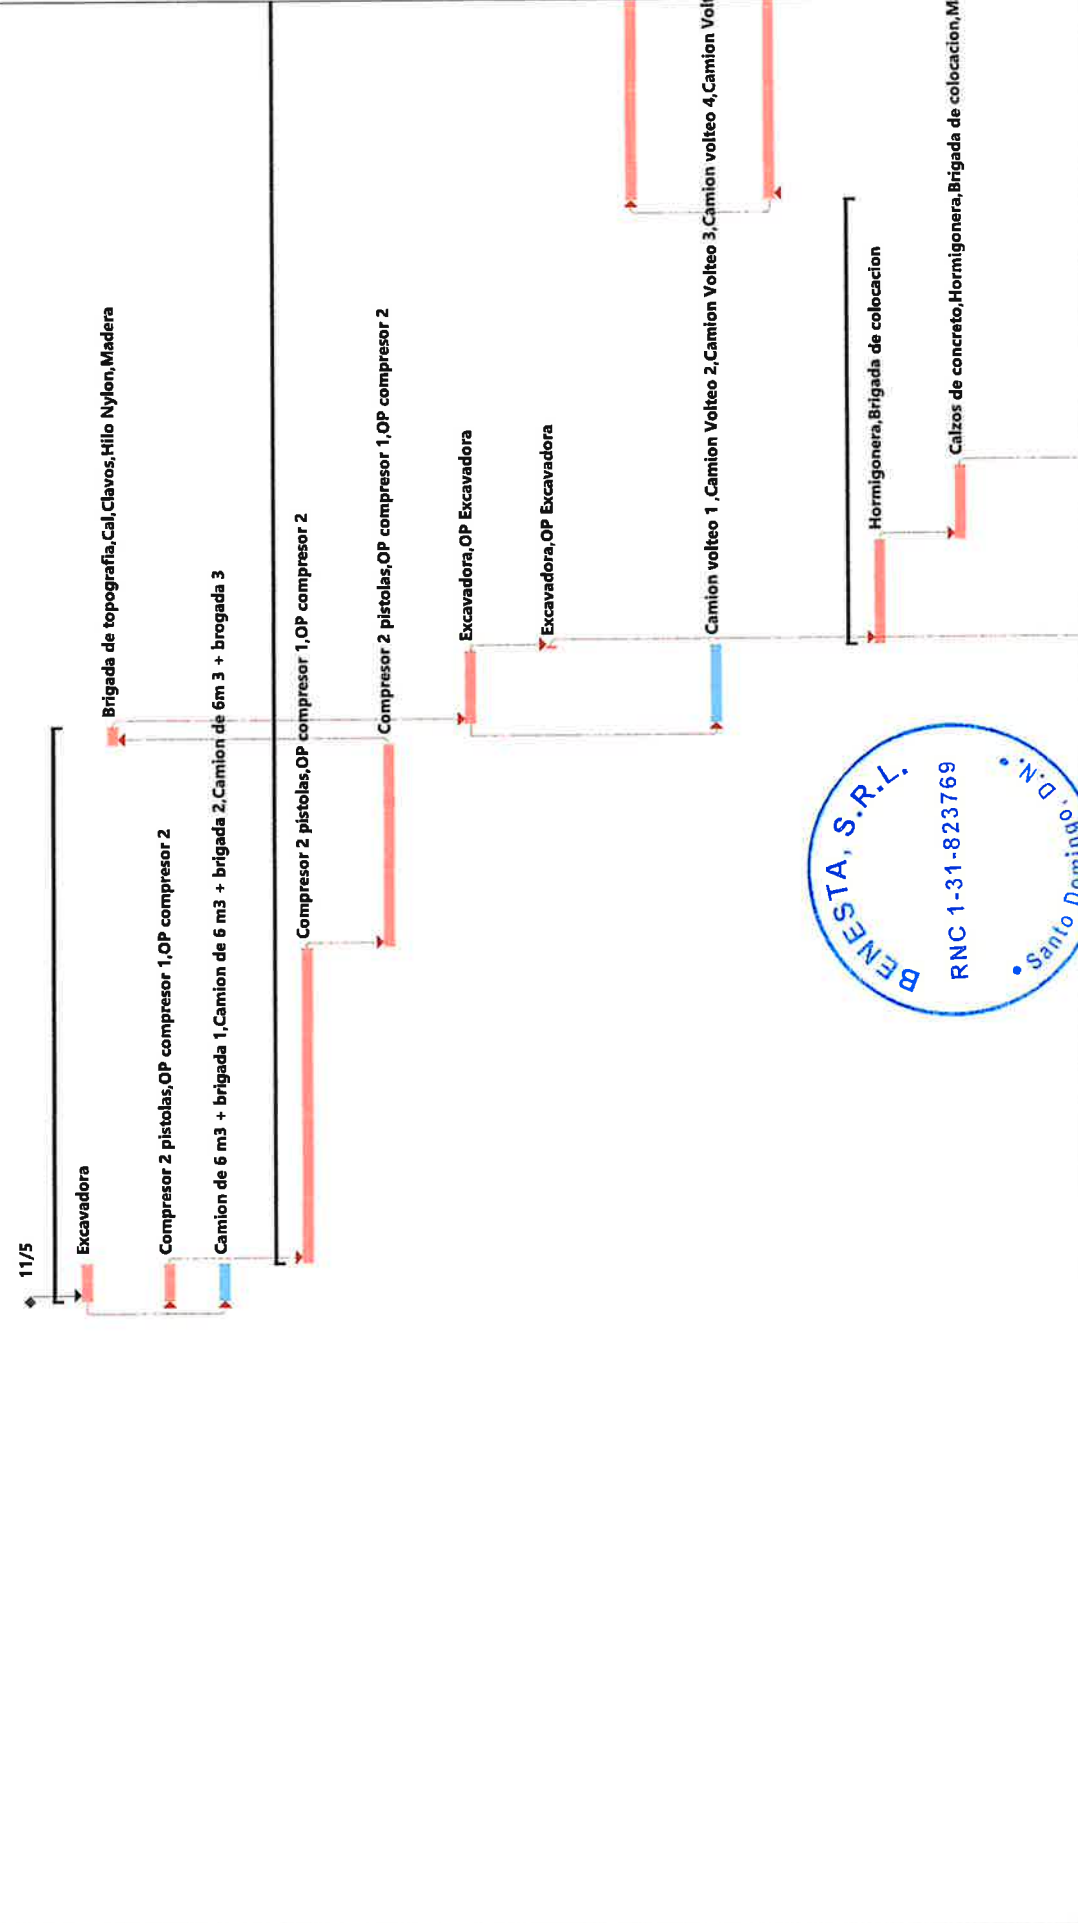

MP

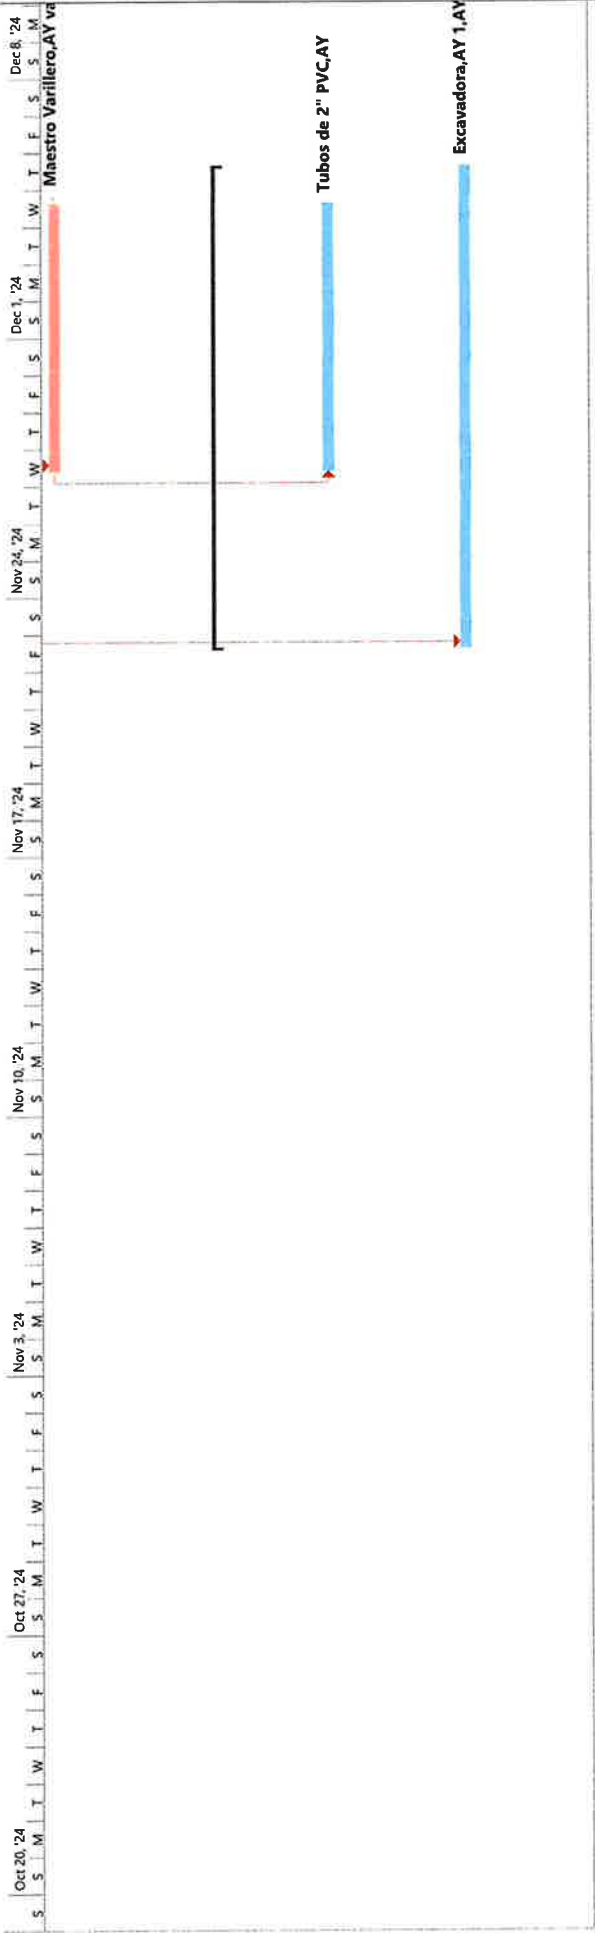

Hp

Dec 15, '24							Dec 22, '24							Dec 29, '24							Jan 5, '25							Jan 12, '25							Jan 19, '25							Jan 26, '25						
T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M							
varillero 1,AV varillero 2,AV varillero 3,AV varillero 4,AV varillero 5,Formaletas,Maestro formaletero,AY formaletas 1,AY formaletas 2,AY formaletas 3 ,AY formaletas 4,AY formaletas 5,AY formaletas 6 ,Hormigonera,Brigada de colocac...																																																

[Handwritten signature]

IV 2.Hormigonera 1,Brigada de colocacion 1,Terminador 1,Terminador 2,Herrero



HP

1 de octubre del 2024
Santo Domingo D.N

Señores:
Junta Central Electoral, (JCE)
Ciudad.

Quien suscribe **Miguel Andrés Pichardo Cabral**, cédula de identidad y electoral No. 055-0040962-7 en calidad del **Representante Legal** de la empresa **BENESTA, SRL** RNC: 131-82376-9 por este medio hacemos de su conocimiento nuestra aceptación con la condición del pliego donde se especifica que la empresa procederá al inicio de los trabajos con los fondos propios de la misma, cito párrafo del pliego:

" 8. Condiciones de Pago

Los pagos se realizarán mediante la modalidad de cubriciones, la aceptación y / o aprobación de las mismas estará a cargo del área de Supervisión de Obra de la Dirección de la Infraestructura Física de la Junta Central Electoral y la fiscalización del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), que rendiré el informe correspondiente.

La primera cubrición se presentará cuando la obra se encuentre en un veinte por ciento (20%) de ejecución del presupuesto. La institución no otorgará adelanto o anticipo de ninguna especie".

Esto es en caso de que la empresa **BENESTA SRL** sea la beneficiada en la licitación del **Proyecto de Construcción de un muro lateral en la Nave Las Colinas ubicadas en la calle J de la Zona Industrial de Herrera**, con referencia No. JCE-CCC-CP-2024-0015.

Sin otro particular por el momento,



Ing. Miguel Andrés Pichardo, M. Sc.
Gerente General

