


Impermeabilización en Área de Logística y Área de Comedor en Ciudad de Identidad y Electoral

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Impermeabilización en Área de Logística y Área de Comedor en Ciudad de Identidad y Electoral, Plan de trabajo

PERIODO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Plan Duration Actual Start % Complete Actual beyond plan % Complete beyond plan

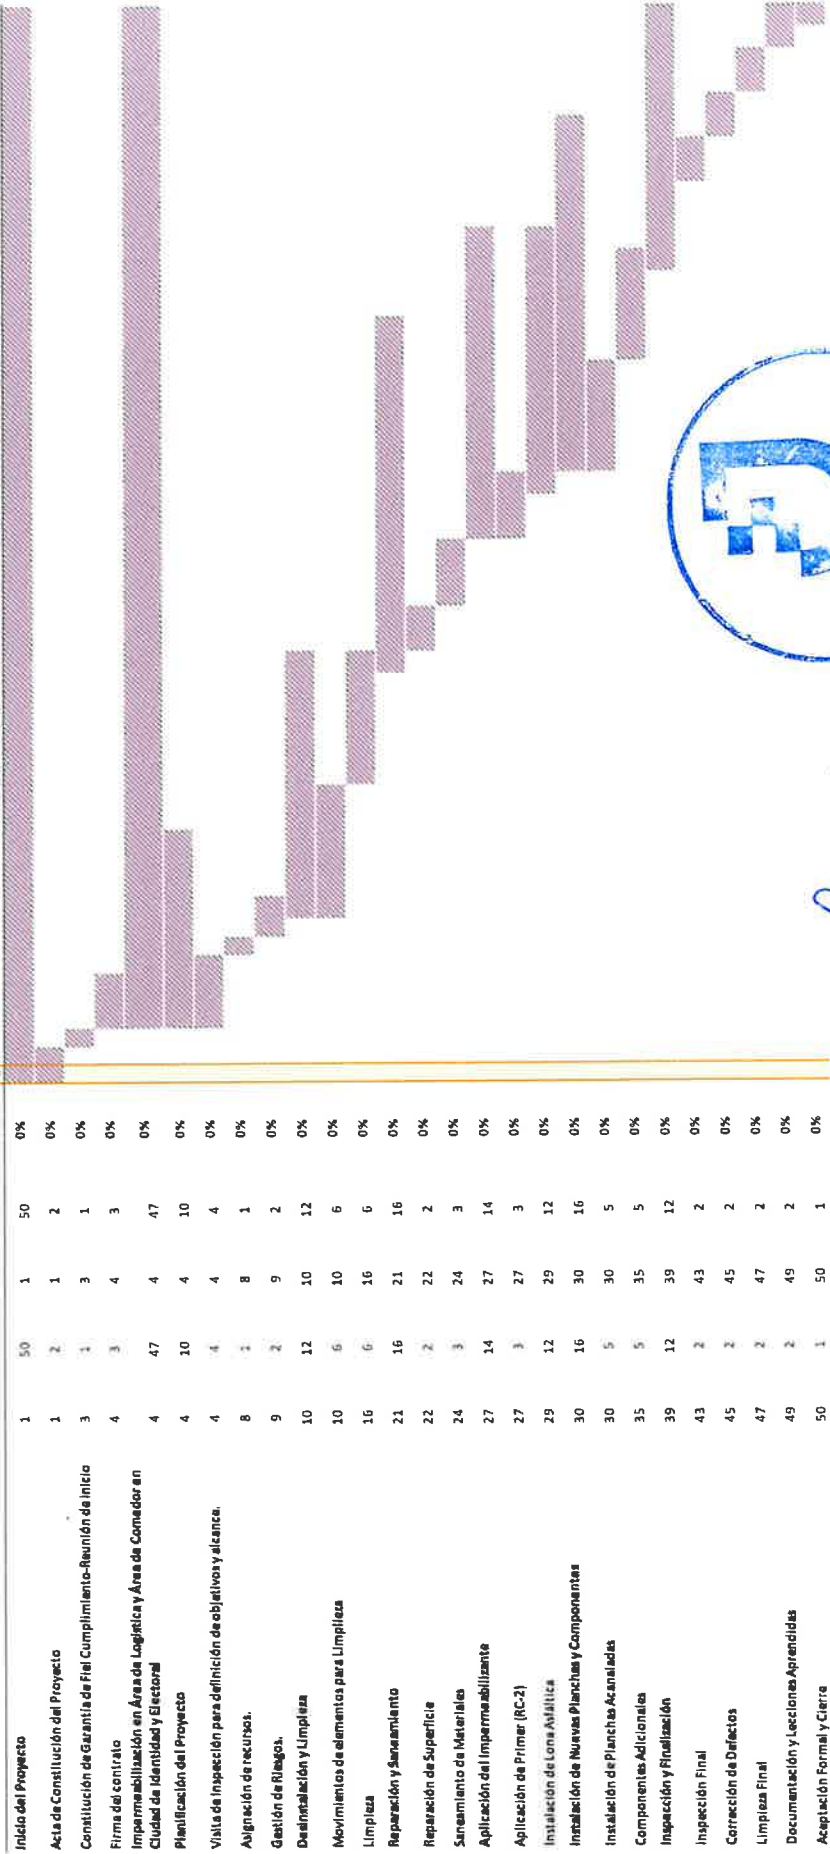

*[Handwritten signature]*



**JAREZ**  
PROYECTOS DE INGENIERIA

JAREZ, S.R.L.

RNC:131-754171

C/ M A Garrido esq, Max Henrriquez Ureña, sector Los Prados.

## **Cronograma Detallado para la Ejecución del Proyecto de Impermeabilización**

**Duración Total: 8 semanas (2 meses)**

### **Semana 1: Inicio del Proyecto**

#### **1. Acta de Constitución del Proyecto:**

○ Fecha de inicio: Día 1

○ Fecha de finalización: Día 2

#### **2. Acta de constitución de garantía y fiel cumplimiento- reunion de inicio:**

○ Fecha de inicio: Día 3

○ Fecha de finalización: Día 3

#### **3. Plan de Firma del contrato:**

○ Fecha de inicio: Día 4

○ Fecha de finalización: Día 4

### **Semana 2: Planificación Detallada**

#### **1. Visita de Inspección:**

○ Fecha de inicio: Día 4

○ Fecha de finalización: Día 8

#### **2. Asignación de recursos:**

○ Fecha de inicio: Día 8

○ Fecha de finalización: Día 9

#### **3. Gestión de Riesgos:**

○ Fecha de inicio: Día 9

○ Fecha de finalización: Día 10

### **Semana 3-4: Desinstalación y Limpieza**

#### **1. Desinstalación:**

○ Fecha de inicio: Día 10

○ Fecha de finalización: Día 16

#### **2. Limpieza:**

○ Fecha de inicio: Día 16

○ Fecha de finalización: Día 21



RNC:131-754171

C/ M A Garrido esq, Max Henrriquez Ureña, sector Los Prados.

Tel 809-993-7790



*JAREZ*



**JAREZ**  
PROYECTOS DE INGENIERIA

JAREZ, S.R.L.

RNC:131-754171

C/ M A Garrido esq, Max Henrriquez Ureña, sector Los Prados.

#### **Semana 5: Reparación y Saneamiento**

1. **Reparación de Superficie:**
  - Fecha de inicio: Día 22
  - Fecha de finalización: Día 24
2. **Saneamiento de Materiales:**
  - Fecha de inicio: Día 24
  - Fecha de finalización: Día 27

#### **Semana 6-7: Aplicación del Impermeabilizante**

1. **Aplicación de Primer (RC-2):**
  - Fecha de inicio: Día 27
  - Fecha de finalización: Día 29
2. **Instalación de Lona Asfáltica:**
  - Fecha de inicio: Día 29
  - Fecha de finalización: Día 41

#### **Semana 8: Instalación de Nuevas Planchas y Componentes**

1. **Instalación de Planchas Acanaladas:**
  - Fecha de inicio: Día 30
  - Fecha de finalización: Día 35
2. **Componentes Adicionales:**
  - Fecha de inicio: Día 35
  - Fecha de finalización: Día 39

#### **Semana 9: Inspección y Finalización**

1. **Inspección Final:**
  - Fecha de inicio: Día 43
  - Fecha de finalización: Día 45
2. **Corrección de Defectos:**
  - Fecha de inicio: Día 45



RNC:131-754171

C/ M A Garrido esq, Max Henrriquez Ureña, sector Los Prados.  
Tel 809-993-7790



*Handwritten signature in blue ink.*



**JAREZ**  
PROYECTOS DE INGENIERIA

JAREZ, S.R.L.

RNC:131-754171

C/ M A Garrido esq, Max Henríquez Ureña, sector Los Prados.

3. Limpieza Final:
  - Fecha de finalización: Día 47
4. Documentación y Lecciones Aprendidas:
  - Fecha de inicio: Día 47
  - Fecha de finalización: Día 49
5. Aceptación Formal y Cierre:
  - Fecha de inicio: Día 50
  - Fecha de finalización: Día 50

### Cronograma Resumido

| Semana | Actividad                          |
|--------|------------------------------------|
| 1      | Acta de Constitución del Proyecto  |
| 1      | Reunión de Inicio                  |
| 1      | Plan de Gestión del Proyecto       |
| 2      | Visita de Inspección               |
| 2      | Cronograma Detallado               |
| 2      | Gestión de Riesgos                 |
| 3-4    | Desinstalación                     |
| 3-4    | Limpieza                           |
| 5      | Reparación de Superficie           |
| 5      | Sanearmiento de Materiales         |
| 6-7    | Aplicación de Primer (RC-2)        |
| 6-7    | Instalación de Lona Asfáltica      |
| 8      | Instalación de Planchas Acanaladas |
| 8      | Componentes Adicionales            |
| 9      | Inspección Final                   |
| 9      | Corrección de Defectos             |



RNC:131-754171


C/ M A Garrido esq, Max Henríquez Ureña, sector Los Prados.  
Tel 809-993-7790





JAREZ, S.R.L  
RNC:131-754171  
C/ M A Garrido esq, Max Henríquez Ureña, sector Los Prados.

| Semana | Actividad                            |
|--------|--------------------------------------|
| 9      | Limpieza Final                       |
| 9      | Documentación y Lecciones Aprendidas |
| 9      | Aceptación Formal y Cierre           |



RNC:131-754171  
C/ M A Garrido esq, Max Henríquez Ureña, sector Los Prados.  
Tel 809-993-7790
