ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		***PROYECTO: PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION EN AREA DE LOGISTICA Y AREA DE COMEDOR EN CIUDAD DE IDENTIDAD Y ELECTORAL.***	*42 days*	*8/12/2024*	*10/9/2024*
2		***AREA DE LOGISTICA (AREA= 2747.31 m2)***	***25 days***	***8/12/2024***	***9/16/2024***
3		Desinstalación de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio (52.00 UND.)	1.5 days	8/13/2024	8/15/2024
4		Desinstalación de Caballete, Caños, Cubre Falta de Aluzinc y Tubos y Piezas de PVC.	1.5 days	8/12/2024	8/13/2024
5		Suministro e Instalación de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio de 1.00m x 3.66m	5 days	8/23/2024	8/30/2024
6		Limpieza del Área	1.5 days	8/15/2024	8/16/2024
7		Suministro de Lona Asfáltica de 3mm	5 days	8/16/2024	8/23/2024
8		Suministro de Primer (RC-2)	5 days	8/16/2024	8/23/2024
9		Caballete de Aluzinc (L= 10 Pies)	1.5 days	8/30/2024	9/3/2024
10		Caños de Aluzinc de 9"x16"x10'	1.5 days	9/3/2024	9/4/2024
11		Cubre Falta 12"x12"x10'	1.5 days	9/4/2024	9/6/2024
12		Boquillas de 6"	1.5 days	9/6/2024	9/9/2024
13		Tubos ϕ6"x19' PVC SCH-40	1.5 days	9/9/2024	9/11/2024
14		Codos de 6"	1.5 days	9/11/2024	9/12/2024
15		Mano de Obra de Impermeabilizante y de desagüe pluvia	25 days	8/12/2024	9/16/2024
16		Bote de Escombros	1.5 days	9/12/2024	9/16/2024
17		***AREA DE COMEDOR (AREA= 1692.77 m2)***	***17 days***	***9/16/2024***	***10/9/2024***
18		Desinstalación de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio (52.00 UND.)	1 day	9/17/2024	9/18/2024
19		Desinstalación de Caballete, Caños, Cubre Falta de Aluzinc y Tubos y Piezas de PVC.	1 day	9/16/2024	9/17/2024
20		Suministro e Instalación de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio de 3' x 10'	3 days	9/24/2024	9/27/2024
21		Limpieza del Área	1 day	9/18/2024	9/19/2024
22		Suministro de Lona Asfáltica de 3 mm	3 days	9/19/2024	9/24/2024
23		Suministro de Primer (RC-2)	3 days	9/19/2024	9/24/2024
24		Caballete de Aluzinc (L= 10 Pies)	1 day	9/27/2024	9/30/2024
25		Caños de Aluzinc de 9"x16"x10'	1 day	9/30/2024	10/1/2024
26		Cubre Falta 12"x12"x10'	1 day	10/1/2024	10/2/2024
27		Boquillas de 6"	1 day	10/2/2024	10/3/2024
28		Tubos ϕ6"x19' PVC SCH-40	1 day	10/3/2024	10/4/2024
29		Codos de 6"	1 day	10/4/2024	10/7/2024
30		Mano de Obra de Impermeabilizante y de desagüe pluvia	17 days	9/16/2024	10/9/2024
31		Bote de Escombros	1 day	10/8/2024	10/9/2024
32		Limpieza Final	1 day	10/7/2024	10/8/2024

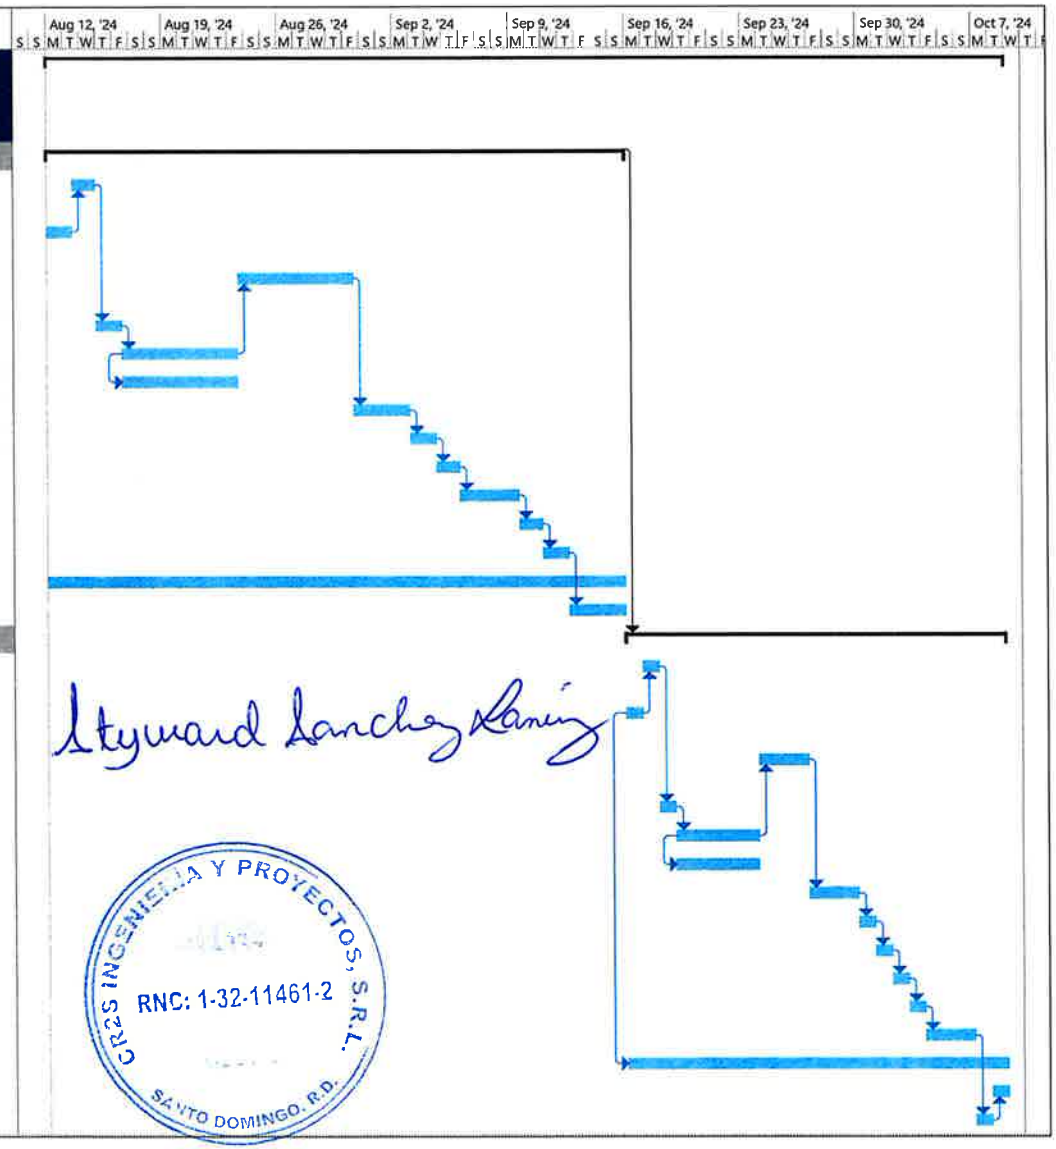

Steynard Sanchez Sanchez

CRZS INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L.
RNC: 1-32-11461-2
SANTO DOMINGO, R.D.

19
